

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione M2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

Infografiche Progetti ATERSIR

Aggiornamento 30 settembre 2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento italiano per accedere al Next Generation EU (NGEU), il Fondo, conosciuto come "Recovery Fund" o "Recovery Plan", che è stato approvato dal Consiglio Europeo a sostegno degli Stati membri colpiti dalla pandemia causata dal virus COVID-19 (Regolamento UE 2021/241).

ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, è Soggetto Beneficiario del contributo PNRR e Soggetto Attuatore di primo livello per alcuni progetti relativi alla Missione 2 del PNRR, presentati nelle seguenti infografiche.

La seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

I dati elaborati nelle seguenti infografiche sono tratti da ReGiS.

ReGiS è il sistema gestionale unico che racchiude, in un unico strumento, le funzionalità che servono a gestire e monitorare le diverse fasi in cui si articolano le Misure ed i Progetti del PNRR. Al sistema informativo ReGiS hanno accesso le Unità di Missione istituite presso le Amministrazioni centrali titolari delle Misure, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del Piano e i Soggetti Attuatori.

Impianto trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento stradale (MTE11C_00000870)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **AIMAG S.P.A.**
CUP - G92F21000060006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

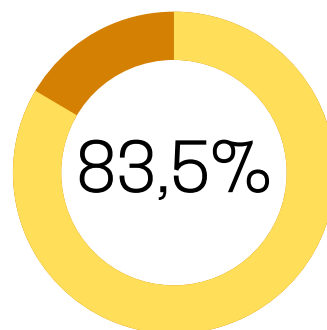

Importo complessivo del progetto

7.500.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

6.135.745 €



Totale contributo PNRR

7.500.000 €

Contributo erogato

4.491.860 €

Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno (MTE11C_00000848)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **CADF S.P.A.**
CUP - J51B22000620005
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

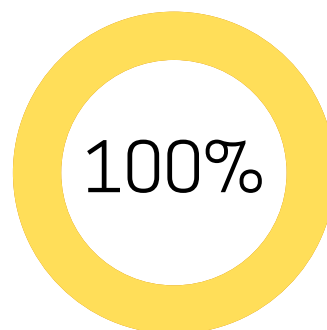

100%

Importo complessivo del progetto

8.798.600 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

7.828.745 €

Realizzate economie per 969.854 €



Totale contributo PNRR

5.290.936 €

Contributo erogato

2.970.689 €

Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas presso area Depuratore IDAR di Bologna (MTE11C_00000809)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H32E22000630004
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

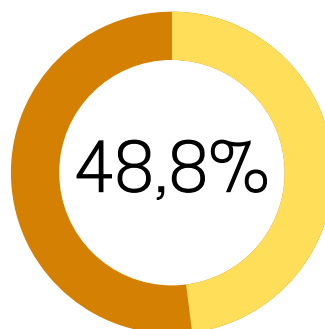

Importo complessivo del progetto

11.891.624 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

5.804.710 €



Totale contributo PNRR

8.091.270 €

Contributo erogato

2.612.683 €

Realizzazione impianto di inertizzazione fanghi con produzione di gessi di defecazione presso l'area impiantistica di Mancasale - RE (MTE11C_00000913)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **IREN ACQUA RE**
CUP - H82E22000470001
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

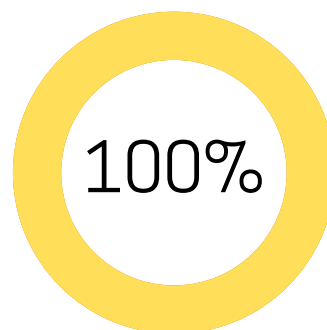

100%

Importo complessivo del progetto

9.320.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

9.082.913 €

Realizzate economie per 237.086€ sulla quota tariffa



Totale contributo PNRR

5.744.680 €

Contributo erogato

5.744.680 €

Fornitura ed installazione centrifuga fanghi depuratore Mancasale, Reggio Emilia (MTE11C_00000921)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **IREN ACQUA RE**
CUP - H87J21000360001
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

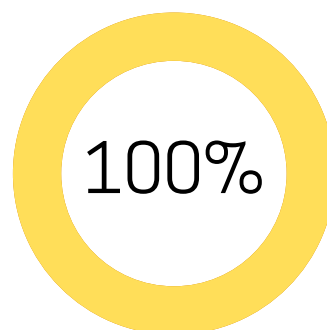

100%

Importo complessivo del progetto

461.848 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

461.172 €

Realizzate economie per 676 €
sulla quota PNRR



Totale contributo PNRR

461.848 €

Contributo erogato

461.172 €

Risanamento scarichi 7-33 in località Alfero (DEP440000136)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H82E22000130001
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

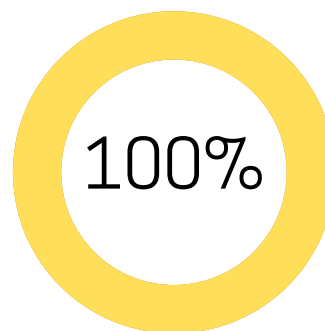

Importo complessivo del progetto

6.720.024 €

Importo a conclusione del progetto

30/09/2026

5.364.588 €

Realizzate economie per 1.355.436€ di cui 281.206€
sulla quota PNRR e 1.074.229€ sulla quota tariffa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

4.568.162 €

Contributo erogato

4.286.955 €

Lavori di efficientamento del depuratore di Fidenza (PR) (DEP440000134)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **EMILIAMBIENTE**
CUP - J59J21003970005
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

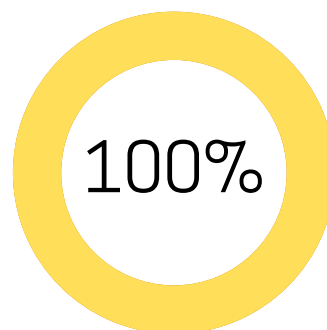

Importo complessivo del progetto

1.097.379 €

Importo a conclusione del progetto
31/03/2026

932.774 €

Realizzate economie per 164.604 €



Totale contributo PNRR

1.097.379 €

Contributo erogato

823.146 €

Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione (DEP440000139)

Soggetto beneficiario - ATERSIR

Soggetto attuatore - **SORGEAQUA S.R.L.**

CUP - I71D21000090001

Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO



Missione M2

Componente C4

Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

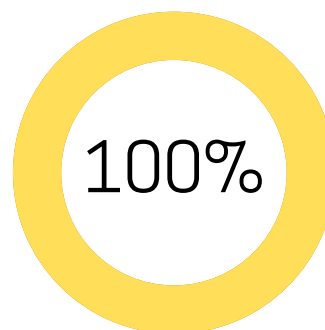

100%

Importo complessivo del progetto

1.512.056 €

Importo a conclusione del progetto

31/03/2026

1.512.056 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.500.000 €

Contributo erogato

1.329.141 €

Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio (DEP440000135)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H62E22000240001
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

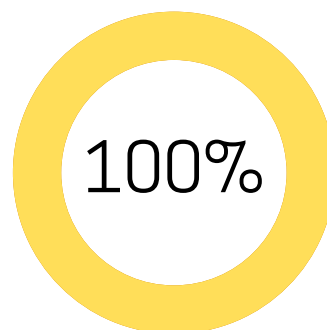

Importo complessivo del progetto

8.504.746 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

8.313.830 €

Realizzate economie per 190.915 € sulla quota tariffa.
Finanziamento PNRR utilizzato al 100%



Totale contributo PNRR

7.383.868 €

Contributo erogato

6.644.710 €

Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore Carpi (DEP440000130)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **AIMAG S.P.A.**
CUP - G91D22000030006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

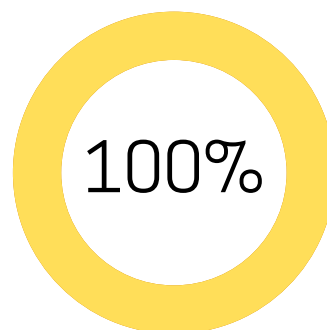

100%

Importo complessivo del progetto

3.200.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

3.027.220 €

Realizzate economie per 172.779 €



Totale contributo PNRR

3.200.000 €

Contributo erogato

2.746.918 €

Depuratore di Comacchio – Realizzazione quinta linea da 40.000 Abitanti Equivalenti (DEP440000131)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **CADF S.P.A.**
CUP - J56H19000040005
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

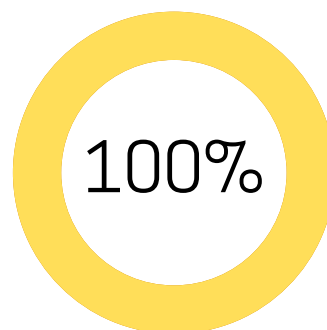

Importo complessivo del progetto

5.300.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

5.280.447 €

Realizzate economie per 19.552 €



Totale contributo PNRR

5.300.000 €

Contributo erogato

4.766.418 €

Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo (DEP440000138)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **IREN ACQUA RE**
CUP - H85H18000280005
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

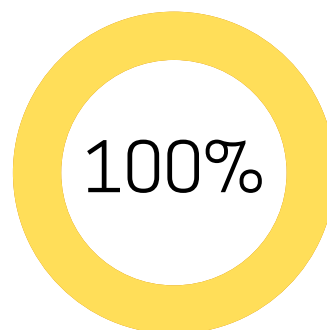

Importo complessivo del progetto

1.389.982 €

Importo a conclusione del progetto
31/03/2026

1.389.982 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.220.000 €

Contributo erogato

1.073.535 €

Adeguamento parametri azoto depuratore di Fiorenzuola d'Arda (DEP440000137)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **IREN ACQUA PC**
CUP - H15H19000080005
Subambito di riferimento - ATO 1 - PC



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

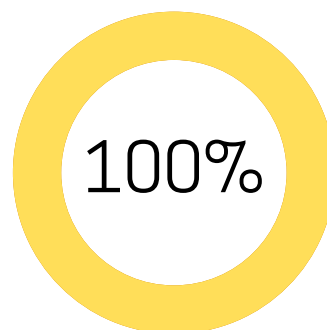

Importo complessivo del progetto

4.900.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

4.584.122 €

Realizzate economie per 315.877 €



Totale contributo PNRR

4.900.000 €

Contributo erogato

3.674.823 €

Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino (DEP440000132)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **SORGEAQUA S.R.L.**
CUP - I75H21000240001
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

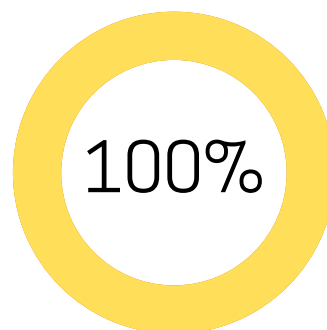

Importo complessivo del progetto

3.500.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/06/2026

3.497.621 €

Realizzate economie per 2.378 €



Totale contributo PNRR

3.500.000 €

Contributo erogato

3.032.818 €

Collettamento reflui di Varano capoluogo al dep. di Rubbiano (DEP440000133)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **MONTAGNA 2000 S.P.A.**
CUP - Jg1D22000040002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

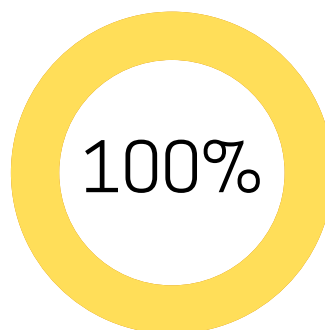

Importo complessivo del progetto

1.160.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

1.159.804 €

Realizzate economie per 196€



Totale contributo PNRR

1.160.000 €

Contributo erogato

892.088 €

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete (M2C4-I4.2_219)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **IRETI S.P.A.**
CUP - H22E22000030002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

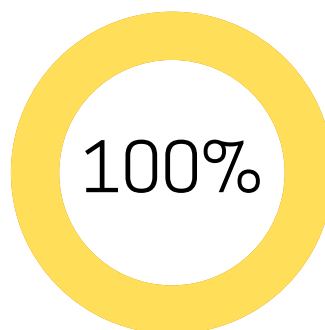

Importo complessivo del progetto

22.766.781 €

Importo a conclusione del progetto
30/06/2026

22.766.781 €



Totale contributo PNRR

10.687.000 €

Contributo erogato

9.618.184 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 (M2C4-I4.2_105)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H78B22000020006
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

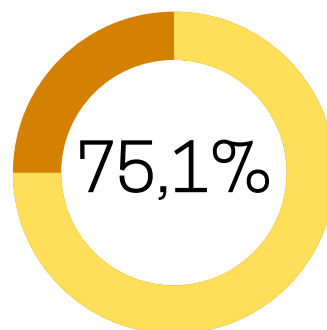

Importo complessivo del progetto

16.594.151€

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

12.560.429 €



Totale contributo PNRR

13.520.700 €

Contributo erogato

8.274.550 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 (M2C4-I4.2_071)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERAcquaModena s.r.l.**
CUP - Hg8B22000010006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

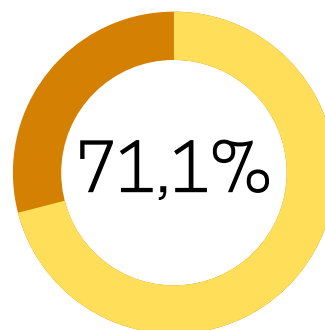

Importo complessivo del progetto

10.597.466 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

7.582.045 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

6.245.000 €

Contributo erogato

3.767.099 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 (M2C4-I4.2_106)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - Hg8B22000020006
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

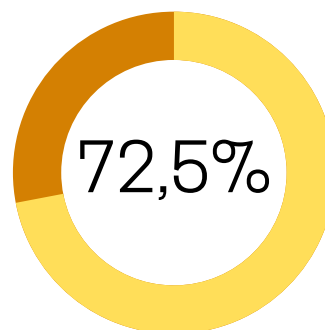

Importo complessivo del progetto

12.450.500 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

9.038.720 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

9.260.500 €

Contributo erogato

4.306.123 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 (M2C4-I4.2_100)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H18B22000050006
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

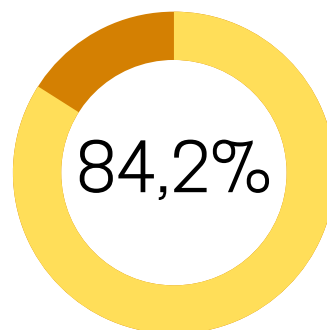

Importo complessivo del progetto

16.118.715 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

11.446.010 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

10.002.750 €

Contributo erogato

6.717.114 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATOg (M2C4-I4.2_098)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H28B22000020006
Subambito di riferimento - ATO g - RN



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

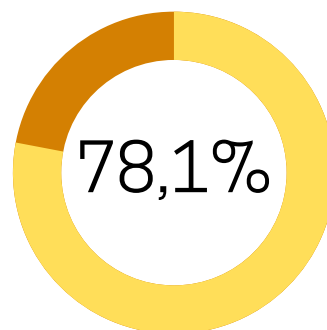

Importo complessivo del progetto

8.732.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

7.164.467 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

6.832.000 €

Contributo erogato

4.358.004 €

Interventi straordinari sulla rete idrica di distribuzione funzionali al completamento della distrettualizzazione, al monitoraggio e alla riduzione delle perdite (M2C4-I4.2_094)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **AIMAG S.p.A.**
CUP - G82E22000030002
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

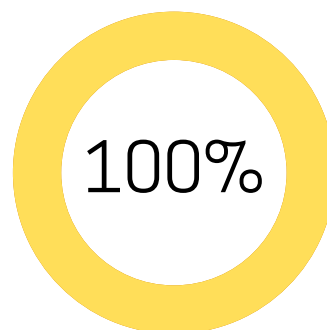

Importo complessivo del progetto

38.852.000 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

37.023.769 €

Realizzate economie per 1.828.230 €
di cui 1.046.978 € sulla quota di finanziamento PNRR
e 781.251€ sulla quota di tariffa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

22.246.000 €

Contributo erogato

18.487.239 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 (M2C4-I4.2_095)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **HERA S.P.A.**
CUP - H28B22000010006
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

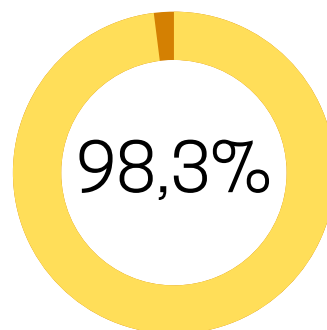

Importo complessivo del progetto

6.165.500 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

6.063.019 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

5.365.500 €

Contributo erogato

3.482.851 €

Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale gestito da SORGEAQUA S.R.L. (M2C4-I4.2_222)



Soggetto beneficiario - ATERSIR

Soggetto attuatore - **SORGEAQUA S.R.L.**

CUP - I77J22000020006

Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO

Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

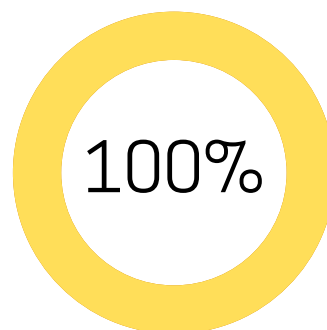

Importo complessivo del progetto

8.968.838 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

8.704.512 €

Realizzate economie per 264.325€
di cui 177.089€ sulla quota di finanziamento PNRR
e 87.235€ sulla quota tariffa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

6.008.838 €

Contributo erogato

5.343.410€

Efficientamento del sistema idrico gestito da MONTAGNA 2000 mediante l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti idriche (M2C4-I4.2_220)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **MONTAGNA 2000 S.P.A.**
CUP - J61D22000080002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

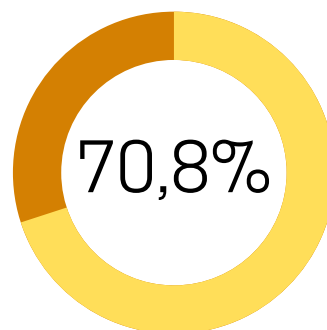

Importo complessivo del progetto

1.175.798 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2026

832.993€



Totale contributo PNRR

1.055.798 €

Contributo erogato

949.697 €

Distrettualizzazione e riduzione delle perdite delle reti di distribuzione acqua per Toano capoluogo (M2C4-I4.2_107)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - **AZIENDA SPECIALE TOANO**
CUP - E78B22000490005
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

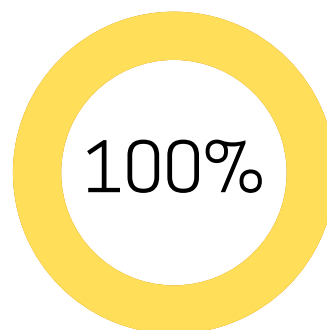

100%

Importo complessivo del progetto

796.627 €

Importo a conclusione del progetto
30/09/2026

796.055 €

Realizzate economie per 571€
di cui 496€ sulla quota di finanziamento PNRR
e 75€ sulla quota tariffa



Totale contributo PNRR

692.000 €

Contributo erogato

620.368 €
