

CLFC/2019/8 del 28 novembre 2019

CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2019/8

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno **2019** il giorno 28 del mese di novembre alle ore 14.00 presso la sala Consiglio della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì - Cesena convocato con lettera protocollo PG/AT/00002019/7483 del 22/11/2019.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena			NO	10,0000
Bagno di Romagna	Enrico Spighi	Assessore	SI'	1,5724
Bertinoro			NO	2,5384
Borghi	Silverio Zabberoni	Sindaco	SI'	0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole			NO	1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	SI'	20,1987
Cesenatico	Matteo Gozzoli	Sindaco	SI'	5,5679
Civitella di Romagna			NO	1,0861
Dovadola			NO	0,6443
Forlì	Giuseppe Petetta	Assessore	SI'	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	SI'	2,9912
Galeata			NO	0,8216
Gambettola	Angela Bagnolini	Assessore	SI'	2,4223
Gatteo			NO	2,1470
Longiano	Ermes Battistini	Assessore	SI'	1,7173
Meldola			NO	2,3730
Mercato Saraceno	Ignazio Palazzi	Assessore	SI'	1,7505
Modigliana			NO	1,2797
Montiano	Mauro Ruscelli	Assessore	SI'	0,6526
Portico San Benedetto			NO	0,4594
Predappio	Carla Ravaglia	Assessore	SI'	1,6514
Premilcuore	Gabriele Conti	Assessore	SI'	0,4665
Rocca San Casciano			NO	0,7146
Roncofreddo			NO	1,0038
San Mauro Pascoli	Luciana Garbuglia	Sindaco	SI'	2,5990
Santa Sofia	Tommaso Anagni	Assessore	SI'	1,1692
Sarsina	Enrico Cangini	Sindaco	SI'	1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	SI'	3,9321
Sogliano al Rubicone			NO	0,9739
Tredozio			NO	0,5610
Verghereto			NO	0,7092

Presenti n. 16 quote 73,04

Assenti n. 15 quote 26,96

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio, conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato l'integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - Cesena, conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 8 del 6 ottobre 2017 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le annualità 2017, 2018 e 2019, del gestore HERA S.p.A e la proposta di integrazione del Piano di Ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

dato atto che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2018 n. 25 interventi che invece erano stati programmati come da tabella 2 della relazione allegata;
- vi sono stati n. 16 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel POI;
- vi sono n. 11 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 16 (quote 73,04), voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sugli 11 interventi identificati nella TAB.2 della relazione di cui all'allegato 1, parte integrante della delibera, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione: l'approfondimento è finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: FORLI'-CESENA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 08 del CLFC/2017/8 del 04 Dicembre 2015, modificato con delibera n.ro 08 del 06 Ottobre 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 8.994.000	€ 401.465	€ 9.395.465	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 526.000	-€ 526.000	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 8.468.000	€ 927.465	€ 9.395.465	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 7.276.000	-€ 3.032.808	€ 4.243.192	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 16.270.000	-€ 2.631.342	€ 13.638.658	Totale consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 16 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha eseguito investimenti superiori per un 11 % rispetto a quanto pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

Anno 2018 - confronto pianificato/consuntivato

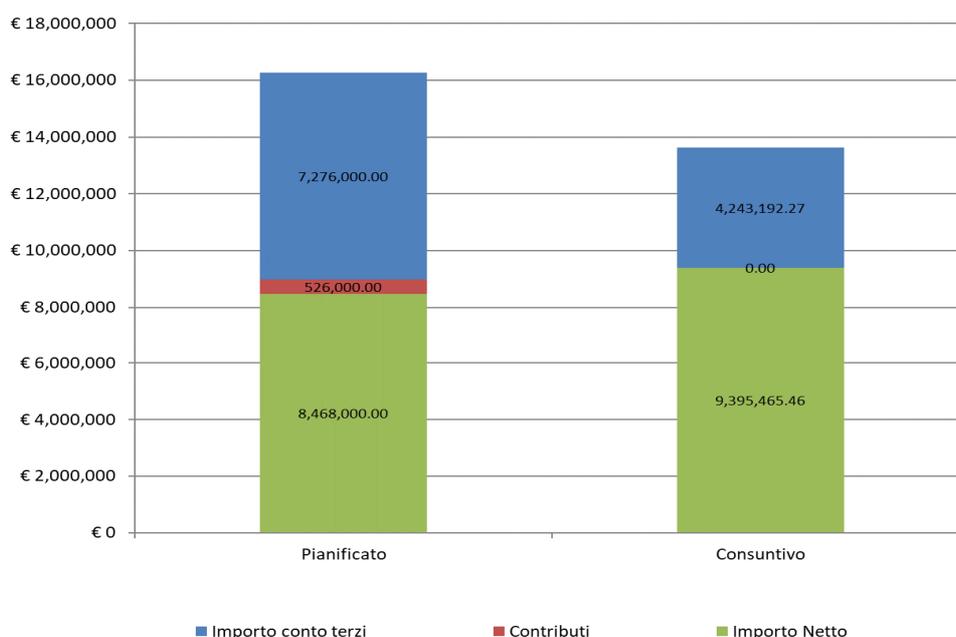


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2018*): 61

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 53

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	25	€ 0	€ 5.387.000	11	2017FCHA0004, 2017FCHA0015, 2017FCHA0016, 2017FCHA0017, 2018FCHA0001, 2018FCHA0004, 2014FCHA0117, 2017FCHA0024, 2018FCHA0002, 2014FCHA0066, 2018FCHA0003
2	Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	16	€ 484.905	€ 0		
3	Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1	€ 20.874	€ 0		
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	27	€ 7.922.568	€ 5.339.000		
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	9	€ 5.210.311	€ 5.544.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2018 n.ro 25 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 16 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; si tratta in buona parte di interventi che hanno visto recuperi di investimenti non realizzati nelle scorse annualità;
- vi sono stati n.ro 11 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per i quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere;
- Vi sono n.ro 8 interventi per i quali il gestore ha indicato come motivazione "ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO". Tale motivazione, pur essendo esaustiva del disallineamento da un punto di vista contabile, non fornisce indicazioni sul reale stato d'avanzamento dell'intervento (ID 2017FCHA0002, 2017FCHA0003, 2017FCHA0005, 2014FCHA0021, 2017FCHA0007, 2017FCHA0009, 2017FCHA0020, 2017FCHA0022).

Inoltre si può notare come rispetto ai 53 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 51 % di questi (27 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con un aumento degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 48 % rispetto al pianificato.

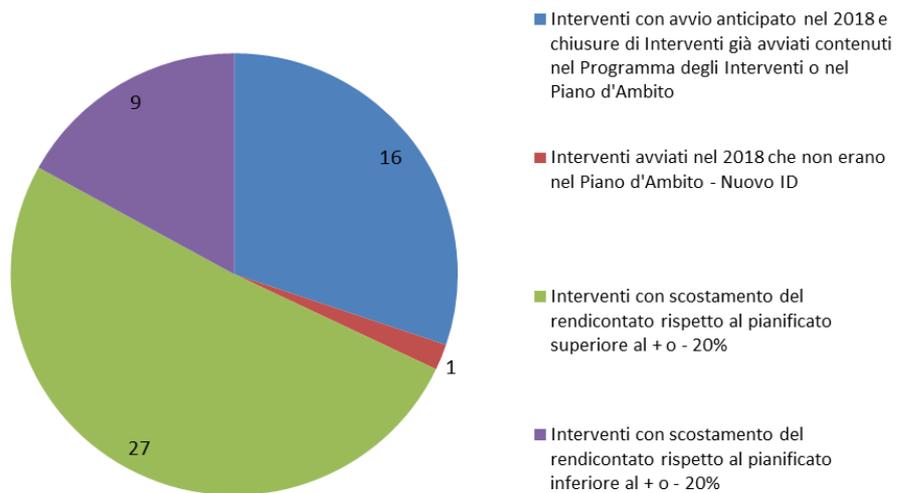


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Bagno di Romagna	50.000,00
2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Bertinoro	250.000,00
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Bertinoro	130.000,00
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	Romagna Acque	Aperto	Borghi	400.000,00
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHII-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Romagna Acque	Aperto	Borghi	1.100.000,00
2015FCHA0013	RISANAMENTO AGGLOMERATO CIVITELLA DI ROMAGNA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Terminato	Civitella di Romagna	80.000,00
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Dovadola	306.000,00
2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Forli	150.000,00
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Forli	550.000,00
2014FCHA0055	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO S. BARTOLO - VIA BOLOGNA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Terminato	Forli	341.000,00
2017FCHA0011	RELINING RETE FOGNARIA VIE LUGHESE/GORIZIA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Terminato	Forli	390.000,00
2014FCHA0066	REALIZZ.FOGLIA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Forlimpopoli	30.000,00
2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Portico e San Benedetto	20.000,00
2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Predappio	50.000,00
2017FCHA0017	DISMISSIONE DEPURATORE E COLLETTAMENTO PISCINA ROCCA SAN CASCIANO	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Rocca San Casciano	20.000,00
2015FCHA0026	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Annullato	Roncofreddo	393.000,00
2017FCHA0019	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Romagna Acque	Annullato	Roncofreddo	20.000,00
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Romagna Acque	Aperto	Roncofreddo	19.000,00
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO) (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOVANNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Romagna Acque	Aperto	Roncofreddo	300.000,00
2018FCHA0003	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Roncofreddo	15.000,00
2018FCHA0004	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (RISANAMENTO SC. 1-21-12)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Roncofreddo	14.000,00
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Santa Sofia	130.000,00
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT- COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	Unica Reti	Aperto	Savignano sul Rubicone	529.000,00
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Sogliano al Rubicone	80.000,00
2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	Gestore	Aperto	Verghereto	20.000,00
							5.387.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2018 Bacino tariffario di Forlì Cesena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
					PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO	FOGNATURA	Gestore	Bagno di Romagna	150.000,00	0	150.000,00	70.834,12	0	70.834,12	-79.165,88	-52	GLI INTERVENTI ASSOCIATI A QUESTO ID SONO LEGATI ALLA RISOLUZIONE DI ALCUNE INTERFERENZE TRA I SERVIZI DI HERA E IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO. COME PER IL 2016 E 2017, LO SCOSTAMENTO 2018 E' LEGATO ALLA COMPLESSITA' DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE CHE NECESSITANO DI UNA CONDIVISIONE CON L'ENTE AL FINE DI PROCEDERE CON LE SCELTE PROGETTUALI/REALIZZATIVE. VENGONO REGOLARMENTE SVOLTI INCONTRI CON I TECNICI DELL'ENTE CHE GARANTISCONO CONDIVISIONE E COSTANTE ALLINEAMENTO SULLE TEMPISTICHE DI AVANZAMENTO DELLE OPERE.
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Unica Reti	Bagno di Romagna	50.000,00	0		0	0		-50.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0012	POTEN. RETEACQ.S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Bertinoro	0	0		155	0		155,00	100	PROLUNGAMENTO TEMPI PER ITER DI ESPROPRIO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL COMUNE DI BERTINORO IL 06/10/2016 PROT. 109174, LA PROCEDURA E' ATTUALMENTE IN CORSO
2014FCHA0013	POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA NUOVA LOTTO3	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Bertinoro	440.000,00	0		426.056,01	0		-13.943,99	-3	
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Bertinoro	0	0		6.392,83	0		6.392,83	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE FATTURAZIONE).
2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	Unica Reti	Bertinoro	250.000,00	0		0	0		-250.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0017	RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA	FOGNATURA	Romagna Acque	Bertinoro	0	0		170.791,70	0		170.791,70	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA REALIZZAZIONE DI QUANTO PREVISTO NELLE ANNUALITA' 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'.
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Gestore	Bertinoro	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	-130.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELL'INTERVENTO LEGATA ALLA VERIFICA PUNTUALE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Borghi	400.000,00	0		0	0		-400.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Romagna Acque	Borghi	1.100.000,00	0		0	0		-1.100.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO	FOGNATURA	Gestore	Castrocaro Terra Sole	25.000,00	0	25.000,00	1.653,31	0	1.653,31	-23.346,69	-93	SONO STATI ESEGUITI UNA SERIE DI SOPRALLUOGHI CONDIVISI ANCHE CON IL COMUNE DI CASTROCARO TERRA SOLE. SI E' CONVENUTO CHE IN QUESTA FASE GLI INTERVENTI IPOTIZZATI A PIANO NON SIANO NECESSARI E COMUNQUE NON ESAUSTIVI. PERTANTO AL MOMENTO LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SONO STATE SOSPESSE
2014FCHA0025	RINN RETE H2O LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	Gestore	Cesena	160.000,00	0	160.000,00	48.245,67	0	48.245,67	-111.754,33	-69	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE: AVANZAMENTO LEGATO ALLA CONCOMITANZA DEGLI INTERVENTI ACQUA E FOGNATURA CON ID 2014FCHA0028 E 2014FCHA0039 SU PIEVESISTINA. REALIZZAZIONE TAPPETI PREVISTA NEL 2019
2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	Gestore	Cesena	130.000,00	0	130.000,00	209.667,59	0	209.667,59	79.667,59	61	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE OPERE PREVISTE NEL 2017, IL CUI SCOSTAMENTO E' GIA STATO MOTIVATO NEL 2017
2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Cesena	322.000,00	0		97.537,02	0		-224.462,98	-69	LO SCOSTAMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO DI PIANO E' CONSEGUENZIALE ALL' ANTICIPO DELL' ANNO PRECEDENTE, GIA' MOTIVATO
2014FCHA0029	ADEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRALCIO	DEPURAZIONE	Gestore	Cesena	300.000,00	0	300.000,00	682.712,28	0	682.712,28	382.712,28	127	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO TRA IMPORTO PIANIFICATO E CONSUNTIVATO LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PIANIFICATE NEGLI ANNI PRECEDENTI. TERMINE COMMESSA COERENTE CON LA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Romagna Acque	Cesena	1.000.000,00	526.000,00		801.666,74	0		-198.333,26	-19	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, CON REGOLARE AVANZAMENTO. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLO SCOSTAMENTO DEL 2017 GIA' MOTIVATO. NON SI EVIDENZIANO CRITICITA'.
2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	Gestore	Cesena	20.000,00	0	20.000,00	34.661,33	0	34.661,33	14.661,33	73	
2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	Romagna Acque	Cesena	1.674.000,00	0		1.410.158,98	0		-263.841,02	-15	
2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	FOGNATURA	Gestore	Cesena	80.000,00	0	80.000,00	43.657,96	0	43.657,96	-36.342,04	-45	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO DI CANTIERE. NON SI EVIDENZIANO AL MOMENTO DELLE CRITICITA'
2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	FOGNATURA	Gestore	Cesena	0	0	0	28.090,86	0	28.090,86	28.090,86	100	ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALI LEGATO ALLA DGR 201/2016
2015FCHA0013	RISANAMENTO AGGLOMERATO CIVITELLA DI ROMAGNA	FOGNATURA	Gestore	Civitella di Romagna	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	-80.000,00	-100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. ANTICIPATO NEL 2017 IL LAVORO PREVISTO NEL 2018 IN QUANTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016. INOLTRE SI SONO EVIDENZIATE ECONOMIE RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO, CHE ERA DI LARGA MASSIMA.
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2*ST	FOGNATURA	Unica Reti	Dovadola	306.000,00	0		0	0		-306.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
					PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2014FCHA0057	ADEGUAMENTO DEPURATORE PIEVEQUINTA	DEPURAZIONE	Gestore	Forlì	0	0	0	599,88	0	599,88	599,88	100	INTERVENTO TERMINATO TECNICAMENTE NEL 2017. COMPLETATA CONTABILIZZAZIONE NEL 2018. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENZA DEI RITARDI 2016 GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DEL 2016. NEL CORSO DEL 2014 VIENE EFFETTUATO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED UN PROGETTO PRELIMINARE INTERNO; NEL CORSO DEL 2014/2015 VIENE ELABORATO IL PROGETTO DEFINITIVO E VENGONO INVIATE LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE (518 PER SISMICA, SOPRINTENDENZA E COMUNE); IN DATA 23/06/2015 VIENE OTTENUTA AUTORIZZAZIONE SISMICA; IN DATA 11/05/2016 VIENE OTTENUTO PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI DA SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI; IN DATA 15/12/2015 VIENE RILASCIATA VALUTAZIONE PREVENTIVA POSITIVA DAL COMUNE DI FORLÌ; SI CERCA DI OTTENERE UN PARERE PREVENTIVO SUL PROGETTO DALL'ALLORA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, PER SUCCESSIVO INVIO AD ATERSIR, MA CON ESITO NEGATIVO; IN DATA 22/02/2016 VIENE TRASMESSO IL PROGETTO AD ATERSIR, SPECIFICANDO CHE IL PARERE DA PARTE DELLA PROVINCIA NON ERA STATO OTTENUTO; IN DATA 29/04/2016 VIENE TRASMESSA AD ATERSIR UNA COPIA CARTACEA (INIZIALMENTE NON RICHIESTA) DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ PRESENTATA; IN DATA 11/05/2016 VIENE COMUNICATO IL NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI APPROVAZIONE TA VALIDA DALL'ENTE LA VALIDAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEL COMUNE DI FORLÌ; VIENE MODIFICATO IL PROGETTO; EMERGE UNA DIFFERENZA NELL'IMPIANTO ESISTENTE RISPETTO A QUANTO IN POSSESSO PRESSO IL COMUNE PER CUI SI PROCEDE IN DATA 05/05/2016 ALLA TRASMISSIONE DI SCIA IN SANATORIA; IN DATA 11/07/2016 VIENE RILASCIATO DAL COMUNE L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ; SI RIPRENDE CONTATTO CON IL COMUNE DI FORLÌ PER FARSI RILASCIARE UN NULLA OSTA ALTERNATIVO, VALIDO AL FINE DI APPROVAZIONE ATERSIR, MA NON VIENE DATA DISPONIBILITÀ; IN DATA 14/12/2016 VIENE RIPRESENTATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD ATERSIR; IN DATA 04/04/2017 VIENE APPROVATO IL PROGETTO CON DETERMINA N.57; IN DATA 29/08/2017 VIENE FATTA COMUNICAZIONE AL COMUNE DI FORLÌ DELL'INIZIO DEI LAVORI; IN DATA 11/09/2017 INIZIANO I LAVORI.
2017FCHA0001	SOSTITUZIONE TUBAZIONE RICIRCOLO FANGHI DEPURATORE FORLÌ	DEPURAZIONE	Gestore	Forlì	0	0	0	20.873,98	0	20.873,98	20.873,98	100	NUOVO ID COME DA RICHIESTA PEC DEL 24/03/2017: "INTERVENTO INDIFFERIBILE/URGENTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FORLÌ. INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. SCOSTAMENTO 2018 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTABILIZZAZIONE
2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLÌ	DEPURAZIONE	Gestore	Forlì	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	-150.000,00	-100	INTERVENTO POSTICIPATO PER LA NECESSITÀ DI VALUTARE L'EFFETTIVA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA REALIZZARSI ANCHE A SEGUITO DI UN'ANALOGA INSTALLAZIONE NEL DEPURATORE DI CESENA
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - I° STRALCIO	DEPURAZIONE	Unica Reti	Forlì	550.000,00	0	0	0	0	0	-550.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0055	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO S. BARTOLO - VIA BOLOGNA	FOGNATURA	Gestore	Forlì	341.000,00	0	341.000,00	0	0	0	-341.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO IN QUANTO NE E' STATA RIVALUTATA LA NECESSITÀ: SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE SI È CONVENUTO SOLO DI REGOLARE LA PRESA DI MAGRA CON UNA SARACINESCA MOTORIZZATA PER FAR IN MODO CHE QUANDO PIOVE, L'APPORTO DI ACQUA METEORICA SIA MINORE A MONTE DEL PUNTO CRITICO; SI È RIVALUTATO LO STUDIO IDRAULICO REALIZZATO, DOVE SI RITENEVA NECESSARIO SPOSTARE LA LINEA IN PRESSIONE DEL SOLLEVAMENTO SAN BARTOLO CHE RECAPITA SU VIALE BOLOGNA IN UNA RETE NERA DN 200 NEI PRESSI DELL'INCROCIO VIA CAVA; DA UNA ANALISI APPROFONDATA IL PROBLEMA DI APERTURA DEI CHIUSINI DI VIA BOLOGNA A MONTE DEL SOLLEVAMENTO STESSO NON SEMBRA GENERATO DA QUELLO SCARICO, CONSIDERANDO CHE È DOPO IL PUNTO CRITICO; MODIFICANDO LA LINEA IN PRESSIONE DEL SOLLEVAMENTO STESSO SI SAREBBE ANCHE MODIFICATA LA CURVA DELLE PORTATE, CHIARAMENTE A DISCAPITO DELLA PORTATA DELLE POMPE.
2017FCHA0011	RELINING RETE FOGNARIA VIE LUGHESE/GORIZIA	FOGNATURA	Gestore	Forlì	390.000,00	0	390.000,00	0	0	0	-390.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO ANNULLATO. INTERVENTO ISTITUITO A SEGUITO DI UN CROLLO DELLA FOGNATURA IN VIA GORIZIA AVVENUTO AD INIZIO 2016. LA VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA PRIMA DI ISTITUIRE LA GARA D'APPALTO HA PERO' DATO ESITO NEGATIVO: LA CONDOTTA ESAMINATA E' RISULTATA IN BUONO STATO, PERTANTO SI E' DECISO DI NON PROCEDERE CON L'INTERVENTO DI RELINING.
2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	Gestore	Forlì	0	0	0	4.905,69	0	4.905,69	4.905,69	100	RIPROGRAMMATA RIPRESA DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ INTERVENTO LEGATA ALLA RIPERIMETRAZIONE AGGLOMERATI DGR 201/2016.
2014FCHA0066	REALIZZ. FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	Gestore	Forlimpopoli	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	-30.000,00	-100	SLITTAMENTO LAVORI IN QUANTO NON SONO PRESENTI CRITICITÀ COGENITI E VINCOLI NORMATIVI/AMBIENTALI, NE' PRESCRIZIONI. TRATTASI DI INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA RETE
2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	Gestore	Gambettola	0	0	0	72.153,81	0	72.153,81	72.153,81	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE CORRISPONDENTI ANNUALITÀ
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gestore	Gambettola	113.000,00	0	113.000,00	159.805,20	0	159.805,20	46.805,20	41	ANTICIPATO STRALCIO DI OPERE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERFERENZA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE.
2014FCHA0077	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO RIO PARA	FOGNATURA	Gestore	Meldola	0	0	0	23.076,22	0	23.076,22	23.076,22	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2017. COMPLETATA CONTABILIZZAZIONE NEL 2018. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO 2016.
2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGIO STECCHI	DEPURAZIONE	Gestore	Mercato Saraceno	0	0	0	70.490,96	0	70.490,96	70.490,96	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE CORRISPONDENTI ANNUALITÀ
2014FCHA0083	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	900.000,00	0	900.000,00	1.805.404,65	0	1.805.404,65	905.404,65	100	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO
2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	1.375.000,00	0	1.375.000,00	1.469.022,19	0	1.469.022,19	94.022,19	6	
2014FCHA0085	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	325.000,00	0	325.000,00	415.161,09	0	415.161,09	90.161,09	27	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO
2014FCHA0086	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	190.000,00	0	190.000,00	397.066,87	0	397.066,87	207.066,87	108	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI A SEGUITO DEI MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI
2014FCHA0087	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0	100.000,00	56.711,75	0	56.711,75	-43.288,25	-43	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGIO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	101.000,00	0	0	168.430,01	0	0	67.430,01	66	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA REALIZZAZIONE DI QUANTO PREVISTO NELLE ANNUALITÀ 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITÀ.
2014FCHA0123	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	97.000,00	0	97.000,00	206.293,63	0	206.293,63	109.293,63	112	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
					PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2014FCHA0126	Verifiche ed adeguamenti sismici impianti	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0	0	-34.905,79	0	-34.905,79	-34.905,79	-100	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2018 SI EVIDENZIA UN CONSUNTIVO DI SEGNO NEGATIVO LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2014FCHA0131	Automazione e telecontrollo impianti	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0	30.000,00	53.335,15	0	53.335,15	23.335,15	77	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	86,63	0	86,63	-9.913,37	-99	
2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	120.000,00	0	120.000,00	43.057,49	0	43.057,49	-76.942,51	-64	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2018 SONO STATE AVVIATE LE PROGETTAZIONI DELL'AREA PENSILE SAN MARTINO A FORLI' E AREA PENSILE TORRE VECCHIA A GAMBETTOLA
2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	880.000,00	0	880.000,00	1.478.557,51	0	1.478.557,51	598.557,51	68	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI
2014FCHA0090	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0	150.000,00	28.295,70	0	28.295,70	-121.704,30	-81	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014FCHA0089
2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	15.000,00	93.808,32	0	93.808,32	78.808,32	525	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI
2014FCHA0092	RINNOVO RETI FOGNARIE PROGRAMMATO	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	675.000,00	0	675.000,00	791.378,97	0	791.378,97	116.378,97	17	
2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	85.000,00	0	85.000,00	134.240,03	0	134.240,03	49.240,03	57	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI CONSEQUENTE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI
2014FCHA0094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	310.000,00	0	310.000,00	263.827,74	0	263.827,74	-46.172,26	-14	
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	2.091,48	0	2.091,48	-7.908,52	-79	
2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRALCIO	FOGNATURA	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0	0	0	1.853,43	0	0	1.853,43	100	SCOSTAMENTO 2018 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET CHE HA FINANZIATO L'INTERVENTO. L'INTERVENTO E' STATO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2015
2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	FOGNATURA	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	611.000,00	0	0	1.086.858,21	0	0	475.858,21	77	INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE DI PIANO. SCOSTAMENTO 2018 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NEL 2017.
2014FCHA0132	Rinnovo reti e allacci da Pronto Intervento	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	350.000,00	0	350.000,00	585.275,91	0	585.275,91	235.275,91	67	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEQUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	15.000,00	984,37	0	984,37	-14.015,63	-93	
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Portico e San Benedetto	0	0	0	20.849,18	0	20.849,18	20.849,18	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLO SLITTAMENTO 2017 GIA' MOTIVATO
2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	FOGNATURA	Gestore	Portico e San Benedetto	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
2014FCHA0100	POTENZIAMENTO RETE ACQUA LOC. FIUMANA	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Predappio	0	0	0	73.292,34	0	0	73.292,34	100	SCOSTAMENTO 2018 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET CHE HA FINANZIATO L'INTERVENTO. L'INTERVENTO E' STATO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2016
2015FCHA0023	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10	FOGNATURA	Gestore	Predappio	0	0	0	9.020,02	0	9.020,02	9.020,02	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENTE ALLO SLITTAMENTO DEL 2016 (GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELL'ANNO 2016) LEGATO ALLA DIFFICOLTA' DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARSI.
2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO	FOGNATURA	Gestore	Predappio	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-50.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE SONO ANCORA IN CORSO VERIFICHE SULLO STATO DELLE RETI E IMPIANTI ESISTENTI PER DEFINIZIONE SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE
2017FCHA0017	DISMISSIONE DEPURATORE E COLLETTAMENTO PISCINA ROCCA SAN CASCIANO	DEPURAZIONE	Gestore	Rocca San Casciano	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
2015FCHA0026	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	393.000,00	0	393.000,00	0	0	0	-393.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897
2017FCHA0019	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	-100	
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	19.000,00	0	0	0	0	0	-19.000,00	-100	
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO) (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOVANNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	300.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2018 DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2018 IN QUANTO L'INTERVENTO 2015FCHA0025 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897.
2018FCHA0003	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	-15.000,00	-100	
2018FCHA0004	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (RISANAMENTO SC. 1-21-12)	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0	-14.000,00	-100	
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	Unica Reti	Santa Sofia	130.000,00	0	0	0	0	0	-130.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	50.000,00	0	50.000,00	18.134,57	0	18.134,57	-31.865,43	-63	NON SI E' STATI IN GRADO DI REGOLARIZZARE LA SITUAZIONE IN ESSERE, CHE VEDE IL SERBATOIO NON ESSERE ACCATASTATO. SI E' TENTATO RIPETUTAMENTE DI ACCORDARSI COL PRIVATO, MA INVANO. SI E' RICHIESTO AL COMUNE DI POTER PROCEDERE ALTROVE, MA NON SI HA AVUTO RISPOSTA UFFICIALE. AD OGGI SI STA CERCANDO DI SANARE L'ESISTENTE ATTRAVERSO UN ACCORDO BONARIO UNICA RETI-PROPRIETARIO.
2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTE	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	10.000,00	0	10.000,00	12.258,03	0	12.258,03	2.258,03	22	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
					PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	0	0	0	329,64	0	329,64	329,64	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DELLE PRIMISSIME VALUTAZIONI PRELIMINARI E APERTURA COMMESSA
2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2	FOGNATURA	Gestore	Sarsina	0	0	0	1.147,42	0	1.147,42	1.147,42	100	SLITTAMENTO DELLE TEMPISTICHE A CAUSA DEL VERIFICARSI DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COMPORTATO LA NECESSITA' DI VALUTARE NUOVE IPOTESI PROGETTUALI. LAVORI PREVISTI NEL 2019.
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Unica Reti	Savignano sul Rubicone	529.000,00	0	0	0	0	0	-529.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015FCHA0032	NUOVO BUSTER PER SERBATOIO MELETO	ACQUEDOTTO	Gestore	Sogliano al Rubicone	0	0	0	1.756,10	0	1.756,10	1.756,10	100	INTERVENTO TERMINATO TECNICAMENTE NEL 2017. SCOSTAMENTO 2018 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE.
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	Gestore	Sogliano al Rubicone	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	-80.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELL'INTERVENTO LEGATA ALLA VERIFICA PUNTUALE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI
2014FCHA0121	RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO	FOGNATURA	Gestore	Verghereto	60.000,00	0	60.000,00	70.847,95	0	70.847,95	10.847,95	18	
2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZE	FOGNATURA	Gestore	Verghereto	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
Totale					16.270.000	526.000	8.468.000	13.638.658	0	9.395.465	-2.631.342		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 8 del 28 novembre 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 28 novembre 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante
F.to Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 31 marzo 2020
