# AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

# CLMO/2018/6 del 18 marzo 2019

# CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2017 per il gestore AIMAG S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Caterina Bagni



## CLMO/2019/6

## CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2019** il giorno 18 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0001882 del 14/03/2019.

Assume la presidenza la Coordinatrice del Consiglio Locale che chiama Elisa Di Francesca, funzionaria di ATERSIR, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante.

# Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	8		NO	0,6622
BOMPORTO			NO	1,3444
CAMPOGALLIANO			NO	1,1971
CAMPOSANTO			NO	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	SI'	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Reggianini Stefano	Sindaco	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO			NO	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Dario Caprara	Assessore	SI'	1,2507
FANANO	•		NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE			NO	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO			NO	0,5274
MARANELLO	Mariaelena Mililli	Assessore	SI'	2,1548
MARANO SUL PANARO	Elio Dani	Assessore	SI'	0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Maino Benatti	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Alessandra Filippi	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Stefania Grenzi	Assessore	SI'	1,9843
NOVI DI MODENA	Enrico Diacci	Sindaco	SI'	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO			NO	2,2228
PIEVEPELAGO	Corrado Ferroni	Sindaco	SI'	0,4562
POLINAGO			NO	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO			NO	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Gianfranco Gozzoli	Sindaco	SI'	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Giovanni Giovannelli	Vice-Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO			NO	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Caroli Germano	Sindaco	SI'	1,2871



Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Assessore	SI'	1,9704
SPILAMBERTO	Fabrizio Nardini	Assessore	SI'	1,6242
VIGNOLA	Angelo Pasini	Vice-Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA			NO	0,7682
PROVINCIA DI MODENA			NO	10,0000

Presenti n. 17 pari a quote 55,8253 Assenti n. 31 pari a quote 44,1747

Riconosciuta la validità della seduta, la Coordinatrice invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2017 per il gestore AIMAG S.p.A.

#### Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- 1'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

## premesso che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

## considerato che:

- con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG s.p.a. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n.7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;



- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore AIMAG S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

#### rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano essere inferiori rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili:
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 17 (quote 55,8253), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore AIMAG S.p.A. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



# AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Servizio Idrico Integrato Consuntivo investimenti annualità 2017 Gestore: AIMAG s.p.a.

#### RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore AIMAG ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICA	ATO 2017	DIFFERENZA	CONSUNT	ΓΙVO 2017		
Importo Lordo				Importo Lordo a		
Pianificato esclusi				Consuntivo esclusi		
gli Investimenti di				gli Investimenti di		
Struttura [A] e gli				Struttura [A] e gli		
Investimenti post				Investimenti post		
terremoto 2012	€14.663.700	-€6.288.117	€8.375.583	terremoto 2012		
Importo				Importo		
Contributo				Contributo a		
Pianificato [B]	€2.445.000	-€1.927.372	€517.628	Consuntivo [B]		
Importo Lordo				Importo Lordo a		
Pianificato per				Consuntivo per		
TERREMOTO 2012				TERREMOTO 2012		
[C]	€0	€3.386.929	€3.386.929	[C]		
Importo				Importo		
Contributo				Contributo a		
Pianificato per				Consuntivo per		
TERREMOTO 2012				TERREMOTO 2012		
[D]	€0	€5.707.901	€5.707.901	[D]		
Importo Netto				Importo Netto a		
Pianificato [A]-				Consuntivo [A]-		
[B]+[C]-[D]	€12.218.700	-€6.681.717	€5.536.983	[B]+[C]-[D]		

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017 ai fini contabili

Ai fini della valutazione degli investimenti effettivamente realizzati si riporta la seguente tabella:

		2017	
	Pianificato	Consuntivo	Differenza
Importo Lordo Pianificato (esclusi Inv. di Struttura e Inv. post terremoto 2012)	14.663.700,00	8.375.583,00	- 6.288.117,00
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO			
2012		3.386.929,00	3.386.929,00
Importo lordo totale	14.663.700,00	11.762.512,00	- 2.901.188,00

TAB.2 – Investimenti 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG nel corso del 2017 abbia, a livello complessivo, effettuato meno investimenti lordi per un importo totale di 2,9 milioni di euro, avendo recuperato circa 3,4 milioni di euro di interventi in ritardo connessi al terremoto.

Si ricorda che, con riferimento agli interventi previsti post sisma 2012, nel 2016, a causa del mancato trasferimento di circa 10 milioni di euro di contributi, il Gestore, pur ritardando nel complesso la realizzazione di alcuni interventi, aveva registrato uno scostamento positivo di investimenti pari a circa 3,7 milioni di euro

sopperendo ai mancati contributi; nel 2017, avendo incassato 5,7 milioni di euro di contributi a fronte di 3,4 milioni di euro di opere realizzate, si registra una copertura di circa 2,3 milioni di euro di contributi sulle annualità precedenti. Nelle annualità successive è prevedibile la liquidazione di circa 3 milioni di euro di contributi rimanenti ancora da incassare.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

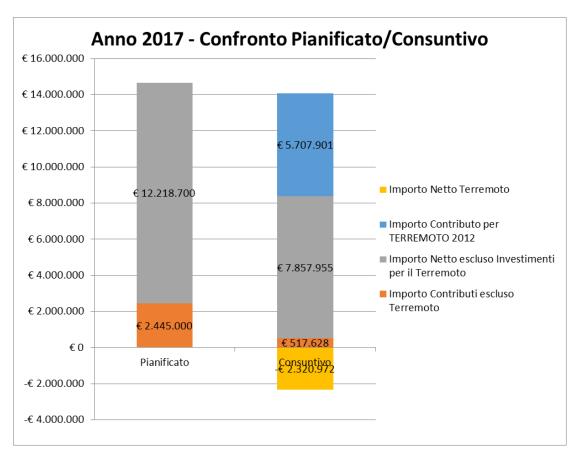


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

#### RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2017: 58

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 71

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIM ENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%)	19	€0	€ 3.505.000			
di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente	3	€0	€ 256.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	32	€ 4.318.590	€0			
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€0	€0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	22	€ 4.863.009	€ 8.609.900			
di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017	2	€ 41.845	€ 75.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + 0 - 20%	17	€ 2.580.913	€ 2.548.800	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che, nel 2017, 19 interventi già programmati risultano non avviati per un importo complessivo pari a 3.505.000 euro e per il cui dettaglio si veda la Tabella 4; dalla tabella si può notare come due interventi non avviati incidano per € 1.350.000 sul totale ma la loro non realizzazione è dipesa da motivi esterni al gestore (mancato finanziamento delle due opere). Si può notare inoltre che 22 interventi su 71 totali hanno avuto uno scostamento tra quanto consuntivato e quanto pianificato superiore al + o − 20%; 17 interventi su 71 totali hanno avuto uno scostamento comunque all'interno della forbice + o − 20% tra quanto rendicontato e quanto pianificato.

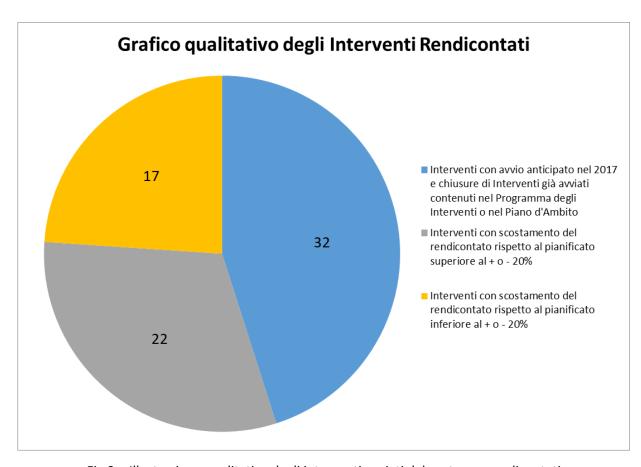


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato
2014MOAG0010	4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Carpi	60.000
20141010A00010	2942-Potenziamento sistema di	DEFORAZIONE	Carpi	00.000
2014MOAG0021	adduzione alla vasca Sacchella	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	50.000
	2202-Adeguamento del Depuratore di			
	San Felice (Sollevamento, laminazione,			
	seconda linea acque, viabilità,		San Felice sul	
2014MOAG0023	disinfezione)	DEPURAZIONE	Panaro	900.000
	2214-Chiusura del Depuratore di Rivara			
	e collettamento al depuratore		San Felice sul	
2014MOAG0024	capoluogo	FOGNATURA	Panaro	450.000
	4033-Collettamento di Camposanto al		San Felice sul	
2014MOAG0026	depuratore di San Felice	FOGNATURA	Panaro	700.000
	2945-Potenziamento del sistema di			
204 41 40 4 60027	adduzione di Staggia e San martino	ACOLIEDOTTO	Cara Danasana	F0.000
2014MOAG0027	secchia	ACQUEDOTTO	San Prospero	50.000
	4042-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse		Tutto il	
	sezioni impiantistiche ed integrazione		sottoambito	
2014MOAG0061	sistema di supervisione impianto	DEPURAZIONE	AIMAG	50.000
20141010/400001	3isterna di supervisione impianto	DEFORAZIONE	Tutto il	30.000
	4043-Efficientamento energetico		sottoambito	
2014MOAG0062	impianti di depurazione	DEPURAZIONE	AIMAG	50.000
	Potenziamento rete di adduzione alla			
	rete di distribuzione alla frazione di			
2014MOAG0083	Rovereto	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	50.000
			Tutto il	
			sottoambito	
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	AIMAG	150.000
	Realizzazione della nuova Piazza			
	Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC		Concordia sulla	
2015MOAG0004	scheda 2	ACQUEDOTTO	Secchia	39.000
	Rifacimento acquedotto centro storico			
2015MOAG0005	Novi - FSC scheda 3	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	30.000
2015MOAG0014	Rifacimento fognatura via Ponte Catena	FOCNIATURA	Navi di Madana	100,000
2015WOAG0014	a Novi  Nuova fognatura nera di via Gambisa a	FOGNATURA	Novi di Modena	100.000
2015MOAG0022	Soliera	FOGNATURA	Soliera	150.000
20131110/400022	Rifacimento fognatura via San	TOGNATONA	Jonera	150.000
2015MOAG0025	Bernardino da Siena a Carpi	FOGNATURA	Carpi	175.000
201311107100023	Rifacimento fognature del centro	1001010101	Carpi	173.000
2015MOAG0030	storico di Novi	FOGNATURA	Novi di Modena	245.000
2015MOAG0040	Adeguamento QE Cavezzo	DEPURAZIONE	Cavezzo	100.000
	Realizzazione di stazioni di			
	monitoraggio dei parametri chimico-			
	fisici dell'acqua potabile prodotta nei		Tutto il	
	campi pozzi di Cognento, Fontana di		sottoambito	
2015MOAG0044	Rubiera e Campogalliano	ACQUEDOTTO	AIMAG	81.000
			Tutto il	
20451404000	Adeguamento impianti di produzione e	4001155.0==0	sottoambito	
2015MOAG0045	dosaggio biossido di cloro	ACQUEDOTTO	AIMAG	75.000
			TOTALE	3.505.000

TAB.4 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

AIMAG s.p.a. Consuntivo Investimenti anualità 2017						PIANO IN	ESTIMENTI 201	L7 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
	4047-Interventi per il ripristino della funzionalità delle componenti	05010471045	5 I		00 207 00									
	• • • •	DEPURAZIONE DEPURAZIONE		Gestore Gestore	80.307,00	0	0	(	0	0	0			
2074 L	DEF. SOLANA - ADECOAMIENTO DELLA DISINI EZIONE	DEFORAZIONE	Вотпротто	Gestore		U	U		,		0			
2653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINAMENTO SORBARA-CRISTO	FOGNATURA	Bomporto	Gestore		0	0		0	C	0			
ſ	Realizzazione del collettore per acque meteoriche a servizio dell'agglomerato													
	abitativo a Sud di Solara	FOGNATURA	Bomporto	Gestore		0	0	(	0	C	0			
	Estendimento fognature aree da servire località Sorbara	FOGNATURA	Bomporto	Gestore		0	0	(	0	C	0			
	<u> </u>	DEPURAZIONE	Bomporto	Gestore		0	0		0	0	0			
2923 \	Vasca di omogeneizzazione nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Bomporto	Gestore		U	U	L L	0	U	0			
2014MOAG0002	2924-Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel depuratore	DEPURAZIONE	Bomporto	Gestore		0	0	(	0		0			
		FOGNATURA	Bomporto	Gestore	120.000,00	0	0		0		0			
										-				
2014MOAG0004	4046-Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario	FOGNATURA	Bomporto	Gestore	101.297,00	0	0	C	0	C	0			
2014MOAG0075 (	,	ACQUEDOTTO	Bomporto	Gestore	445.428,00	0	0	C	56.574,61	C	56.574,61	100%	La data contrattuale di fine lavori è slittata dal 09.08.2016 al 16.9.2016. La motivazione è dovuta a cause interne allo svolgimento dei lavori. In particolare sono avvenute sospensioni per complessivi 20 gg e proroghe di 18 gg,	
	Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio)	ACQUEDOTTO	Bomporto	Gestore		0	0							
2015MOAG0011 N 2015MOAG0016 F	Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio) Rifacimento fognatura via Galilei a Sorbara di Bomporto Adeguamento comparto ossidativo depuratore Bomporto	FOGNATURA FOGNATURA DEPURAZIONE	Bomporto Bomporto Bomporto	Gestore Gestore Gestore	250.000,00	0	0 0	C C	3.101,77 0 0	0	3.101,77 0 0	100%	SPESE TECNICHE SOSTENUTE PER IL PROGETTO RELATIVO AL RIFACIMENTO DEL CENTRO STORICO DI SOLARA, DI CUI QUESTO INTERVENTO È UN'APPENDICE	
2685	RIFACIMENTO FOGNATURE VIALE MARTIRI LIBERTA'	FOGNATURA	Campogalliano	Gestore		0	0	0	0	C	0			
	Installazione nuovo gruppo elettrogeno su sollevamento fognario	FOGNATURA	Campogalliano	Gestore		0	0	(	0	C	0			
2014MOAG0005 2	2926-Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano	FOGNATURA	Campogalliano	Gestore		0	0	C	0	C	0			
246	Collettamento al depuratore del Capoluogo di Carrobbio e Bottegone	FOGNATURA	Camposanto	Gestore		0	0							
	Chiusura del depuratore di Camposanto e collettamento dei reflui al	FOGNATORA	Camposanto	Gestore		U	U		0		, 0			
	depuratore di S. Felice	FOGNATURA	Camposanto	Gestore		0	0		0	l c	0			
-	Collettamento fognario delle frazioni di Tre Case di Sopra al depuratore di		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			-					_			
	Camposanto	FOGNATURA	Camposanto	Gestore		0	0	(	0	C	0			
		FOGNATURA	Camposanto	Gestore		0	0	C	0	C	0			
	1 1	DEPURAZIONE	Camposanto	Gestore		0	0	(	0	C	0			
2014MOAG0078 "	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua	ACQUEDOTTO	Camposanto	Gestore	350.000,00		^	,	36.135,21	,	36.135,21	1000/	TRASCRIZIONI SERVITÙ	
	DEP. CARPI - POTENZIAMENTO DI ALCUNE SEZIONI PER IL TRATTAMENTO	ACQUEDUTTO	Camposanto	Gestore	330.000,00		U	(	, 30.133,21		30.133,21	100%	THE CONTROL SERVITO	
		DEPURAZIONE	Carpi	Gestore		0	0		0	C	0			
2082 /	ACQUE BIANCHE VIA MORO E SOTTOBOTTE DIVERSIVO CAVATA	FOGNATURA	Carpi	Gestore		0	0	(	0	C	0			
	Collettamento al depuratore di Carpi della località Ponte Nuovo (Carpi) e													
	delle case sparse Dallari (Campogalliano) e zona limitrofa al depuratore di													
2904 (	•	FOGNATURA	Carpi	Gestore		0	0	(	0	0	0			
		FOGNATURA FOGNATURA	Carpi Carpi	Gestore Gestore		0	0	(	0	0	0			
	<u> </u>	DEPURAZIONE		Gestore		0	0		0		0			
	Installazione strumentazione di monitoraggio on line in testa all'impianto di	DEFORAZIONE	Carpi	Gestore		O O	0		,		,			
2930	depurazione del capoluogo	DEPURAZIONE	Carpi	Gestore		0	0	C	0	С	0			
	Sostituzione dei campionatori automatici sui comparti di trattamento nel					Ī			]				· ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPURAZIONE FOGNATURA	· ·	Gestore Gestore		0	0	(	0	0	0			
	Fognatura via Aido Moro esterna Interventi sul reticolo fognario di Carpi	FOGNATURA	Carpi Carpi	Gestore	H	0	0	(	0	0	0 0			
2533	interventa sur reticoro rognario di Carpi	LOGNATORA	Curpi	GCGLOTE		0	0		, ,		, 0			
4004 /	Adeguamento palazzina uffici presso depuratore di Carpi (e opere accessorie)	ACQUEDOTTO	Carpi	Gestore		0	0	C	0	C	0			

AIMAG s.p.a.	imenti anualità 2017		STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INV	ESTIMENTI 20:	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOAG0006	2207-Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale	FOGNATURA Carpi	Gestore	1.800.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	24.572,63		) 24.572,63	0.20/	RITARDO DA PARTE DEL COMUNE DI CARPI E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI CARPI NEL COMPLETARE L'ITER PROGETTUALE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE CHE RICEVERÀ LE ACQUE DI SCOLMO DA VIA LAMA DI QUARTIROLO (RICORSO AL TAR DA PARTE DEL SIG. ALBERTO MALAGOLI)
20141000000		TOGNATORA CAIPI	Gestore	1.800.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	24.372,03		24.372,03	-5370	DEL SIG. ALBERTO MALAGOLI)
2014MOAG0007	2700-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO	DEPURAZIONE Carpi	Gestore		0	0	(	0	(	0		
2014MOAG0008	2931-Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di ossidazione nel depuratore del capoluogo 2932-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse	DEPURAZIONE Carpi	Gestore		0	0	C	0	(	0		
	sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel											
2014MOAG0010	depuratore del capoluogo  4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE Carpi  DEPURAZIONE Carpi	Gestore Gestore	80.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	(	0 0		Sono in corso valutazioni tecnico economiche sull'opportunità di modificare il sistema di insufflazione da rotori superficiali a piattelli
2014MOAG0011	4028-Collettamento fognario Via Remesina	FOGNATURA Carpi	Gestore		0	0	(	0	(	0		NECESSITÀ STRAORDINARIE SU LOGISTICHE
	4029-Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione	DEPURAZIONE Carpi	Gestore	440.000.00	0	0	(	23.042,40	(	23.042,40	100%	IMPIANTO
	Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi	FOGNATURA Carpi FOGNATURA Carpi	Gestore Gestore	110.000,00 135.000,00	0	0		0	(	0 0		
	Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	375.000,00	0	0		21,76	(	21,76	100%	APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2016
	4003 - Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi	TUTTI Carpi	Gestore	90.000,00	0	0	(	0	(	0		
	Rifacimento fognatura via Bulgarelli a Carpi Nuova fognatura e scolmatore in via Del Bramante a Carpi	FOGNATURA Carpi FOGNATURA Carpi	Gestore Gestore	<u> </u>	0	0		0	(	0		
	Rifacimento fognatura via Bortolomasi a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	96.838,55	(	96.838,55	-3%	
	Rifacimento fognatura mista via Volta a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	105.000,00	105.000,00	0	105.000,00	148.119,65	(	148.119,65	41%	INSTABILITÀ DELLE PARETI DI SCAVO SU DI UN TRATTO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO INTERVENTO ANNULLATO E SOSTITUITO
2015MOAG0025	Rifacimento fognatura via San Bernardino da Siena a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	175.000,00	175.000,00	0	175.000,00	0	(		-100%	CON RIFACIMENTO FOGNATURA VIA TORRICELLI E VIA MEUCCI A CARPI
	Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	173.000,00	0	0	(	0	(	0 0	10070	
	Consolidamento fogna centro storico Carpi (piazza Martiri)	FOGNATURA Carpi	Gestore	145.000,00		0	145.000,00		(	146.687,87		
2015MOAG0038	Adeguamento sistema fognario interno al depuratore di Carpi	DEPURAZIONE Carpi	Gestore		400.000,00	0	400.000,00	357.178,44	(	357.178,44	-11%	
2018MOAG0003	Rifacimento fognatura in Torricelli a Carpi	FOGNATURA Carpi	Gestore	87.500,00	0	0	o C	34.493,21	(	34.493,21	100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO NEL 2017-2018 COME DA VOSTRO PROTOCOLLO 2567 DEL 12/04/2018
2906	Estendimento fognature eree da servire località Villa Motta e Ponte Motta	FOGNATURA Cavezzo	Gestore		0	0		0	(	0		
	2936-Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di insuflazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE Cavezzo	Gestore	279.000,00	0	0	C	0	(	0		
	Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturno, piazza Martiri della Libertà)	ACQUEDOTTO Cavezzo	Gestore	55.800,00	30.800,00	0	30.800,00	26.225,96	(	26.225,96	-15%	
	Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturno, piazza Martiri della Libertà)	FOGNATURA Cavezzo	Gestore	115.000,00	65.000,00	0	65.000,00	64.541,00	(	64.541,00	-1%	
		DESUBATIONS 6		200 000 00	100 000 00		400,000					Al 31/12/2017 erano ancora in corso valutazioni tecniche/operative per evitare interferenze fra la viabilità interna dell'impianto e il posizionamento del nuovo
	Adeguamento QE Cavezzo	DEPURAZIONE Cavezzo  Concordia sulla	Gestore	300.000,00	100.000,00	0	100.000,00	, ,		0	-100%	quadro elettrico
201	Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche del depuratore di Concordia	DEPURAZIONE Secchia Concordia sulla	Gestore		0	0	(	0	(	0		
2088	POTENZIAMENTO RICETTORE FINALE RETICOLO FOGNARIO CAPOLUOGO	FOGNATURA Secchia Concordia sulla	Gestore		0	0	С	0	(	0		
2431	Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Cò de Belli	FOGNATURA Secchia  Concordia sulla	Gestore		0	0	C	0	(	0		
2907	Estendimento fognature eree da servire località Fossa (zona a est)	FOGNATURA Secchia	Gestore		0	0	o c	0	(	0		

AIMAG s.p.a. Consuntivo Invest	IMAG s.p.a. onsuntivo Investimenti anualità 2017						/ESTIMENTI 20	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
	Inserimento di una linea di omogeneizzazione e trattamento aria e vasca di		Concordia sulla			_	_		_		_		
2938	accumulo fanghi nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Secchia	Gestore		0	0	) (	0	0	0		
2014MOAG0014	2654-COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia Concordia sulla	Gestore	800.000,00	0	C	)	48.715,80	40.823,34	7.892,46	100%	CODA CONTABILE DOVUTA AI ROGITI NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI SU CUI IL COMUNE REALIZZERÀ LA CICLABILE
2014MOAG0015	2743-Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	FOGNATURA	Secchia	Gestore	120.000,00	0	C		0	0	0		
	2937-Collettore fognario via Grande a Concordia	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	Gestore	287.000,00	0	O	)	0	0	0		
2014MOAG0017	4030-Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti	DEPURAZIONE	Concordia sulla Secchia	Gestore	380.000,00	0	C		0	0	0		
2014MOAG0018	4031-Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	Gestore	360.000,00	0	C	)	0	0	0		
2014140400002	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via	ACQUEDOTTO	Concordia sulla	Costoro	250.000,00	0				0			
2014MOAG0082 2015MOAG0004		ACQUEDOTTO  ACQUEDOTTO	Secchia Concordia sulla Secchia	Gestore Gestore	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0 0	0	0 0		Il comune sta esperendo la gara d'appalto e, con ogni probabilità i lavori partiranno nella prima parte del 2019
			Concordia sulla										I COMUNE DEVE ESPLETARE LA GARA
2015MOAG0029	Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - fogna	FOGNATURA	Secchia	Gestore	205.000,00	205.000,00	C	205.000,00	1.368,56	0	1.368,56	-99%	D'APPALTO
401	Collegamento fognario dell'agglomerato di Villafranca al depuratore di Medolla	FOGNATURA	Medolla	Gestore		0	C	0	0	0	0		
2090	DEP. MEDOLLA ADEGUAMENTO DEL COMPARTO DI DISNFEZIONE FINALE	DEPURAZIONE	Medolla	Gestore		0	C		0	0	0		
2655	POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DELLA PREDENITRIFICAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VOLUMETRIA DI TRATTAMENTO ADEGUATA Collettamento fognario dell'agglomerato Castello Sant'Antonio al depuratore	DEPURAZIONE	Medolla	Gestore		0	C		0	0	0		
2722	di Medolla	FOGNATURA	Medolla	Gestore		0	C	)	0	0	0		
2723	Collettamento fognario dell'agglomerato Corte Wegman al depuratore di Medolla	FOGNATURA	Medolla	Gestore		0	C	) (	0	0	0		
2908	Estendimento fognatura capoluogo diverse realtà Malcantone e altro	FOGNATURA	Medolla	Gestore		0	0		0	0	0		
	Installazione paraspruzzi turbina nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Medolla	Gestore		0	0		0	0	0		
4032	· ·	FOGNATURA	Medolla	Gestore		0	C	)	0	0	0		
	2721-Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di					_	_		_		_		
2014MOAG0019	Medolla	FOGNATURA	Medolla	Gestore	170.000,00	0	C	)	0	0	0		
2014MOAG0073	4023-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto	ACQUEDOTTO	Medolla	Gestore	600.358,00	0	C		) 76.525,38	0	76.525,38	100%	La data contrattuale di fine lavori è slittata dal 10.6.2016 al 12.10.2016. La motivazione è dovuta a cause interne allo svolgimento dei lavori. In particolare sono avvenute sospensioni per complessivi 56 gg e proroghe di 35 gg, a cui si aggiunge un ritardo da parte dell'impresa di 35 gg che ha generato una penale di 14.070 euro
							_						MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI
	Collettamento fognario area ex Covalpa al depuratore di Medolla Rifacimento fognatura di via Don Minzoni a Medolla	FOGNATURA FOGNATURA	Medolla Medolla	Gestore Gestore	-	0	0	)	240,62	0	240,62		(COMUNE, AIMAG, LOTTIZZANTE). APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2015
	POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI SCOLMATORI DI PIENA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA	FOGNATURA	Mirandola	Gestore		0	C		0 0	0	0	100%	THE PROCESS OF THE PR
2610	SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VALLI E IN VIA PEDOCA POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DA 23.000 AE A 30.000 AE	FOGNATURA	Mirandola	Gestore		0	C	)	0	0	0		
2701	CON OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RIMOZIONE DEI NUTRIENTI E DELLA	DEPURAZIONE	Mirandola	Gestore		0	O		0	0	0		
2725	Collettamento al depuratore di Mirandola dell'agglomerato di Bastiglia Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete di Concordia	FOGNATURA	Mirandola	Gestore		0	С	)	0	0	0		
2909		DEPURAZIONE	Mirandola	Gestore		0	С		0	0	0		
2910	Ponte Pietra	FOGNATURA	Mirandola	Gestore	<u> </u>	0	C		0	0	0		

AIMAG s.p.a.	imenti anualità 2017		STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INV	ESTIMENTI 20:	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2911	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato o collettamento alla rete di Mirandola capoluogo dell'agglomerato Stazione Ferroviaria	FOGNATURA Mirandola	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0067	4017-Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, allaltezza del by-pass posto a nord di Camurana	ACQUEDOTTO Mirandola	Gestore	2.120.622,00	0	0	O	205.587,84	97.883,94	107.703,90		La data contrattuale di fine lavori è slittata dal 26.9.2016 al 17.3.2017. La motivazione è dovuta a cause interne allo svolgimento dei lavori. In particolare sono avvenute due sospensioni per complessivi 65 gg ed una proroga di 41 gg, a cui si aggiunge un ritardo da parte dell'impresa di 66 gg che ha generato una penale di 98.383,94 euro
	2940 - Potenziamento della capacità idraulica e dei pretrattamenti	DEPURAZIONE Mirandola	Gestore	,,,,	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0092	4006 - Adeguamento strutturale Torre Mirandola	ACQUEDOTTO Mirandola	Gestore	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola - FSC scheda 1	ACQUEDOTTO Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola	Gestore Gestore	33.600,00	48.400,00	0	48.400,00	21.684,07	0	21.684,07	-55%	RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
	Rifacimento fognatura di via Mazzone a Mortizzuolo di Mirandola	FOGNATURA Mirandola	Gestore	33.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Rifacimento fognature via Pico a Mirandola	FOGNATURA Mirandola	Gestore	220.000,00	140.000,00	0	140.000,00	45.681,96	0	45.681,96	-67%	REALIZZAZIONE OPERE IN CORSO CON DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE. CANTIERE IN RITARDO RISPETTO AL PIANIFICATO.
2015MOAG0028	Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola	FOGNATURA Mirandola	Gestore	125.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione nel depuratore del capoluogo e adeguamento dei comparti disinfezione e trattamento fanghi DEPURATORE ROVERETO - REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI	DEPURAZIONE Novi di Modena	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	PREDENITRIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DISINFEZIONE  Adeguamento della centrale acquedottistica di Novi di Modena	DEPURAZIONE Novi di Modena ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Installazione gruppo elettrogeno nella centrale di rilancio "Torre Sacchella"	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Adeguamento Tubazioni interne della centrale di rilancio "Torre Sacchella"	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0020	2447-Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via	FOGNATURA Novi di Modena	Gestore	400.000,00		0			0			
	2942-Potenziamento sistema di adduzione alla vasca Sacchella	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore	3.631.678,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	Intervento previo finanziamento SFINGE poi non ottenuto.Le esigenze di potenziamento sono state sopperite con interventi di rimodulazione delle portate sul sistema acquedottistico di pertinenza
2014MOAG0071	4021-Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore			^	_	_	^	_		
2014MOAG0083	Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	0		0		In corso studi tecnici dettagliato con appoggio di professionisti esterni per le fasi studio di fattibilità
	Rifacimento acquedotto centro storico Novi - FSC scheda 3	ACQUEDOTTO Novi di Modena	Gestore	30.000,00	,	0	30.000,00	0	0	0		RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2015MOAG0014	Rifacimento fognatura via Ponte Catena a Novi	FOGNATURA Novi di Modena	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO COMPLETATO AL 31.12.2016
2015MOAG0015	Rifacimento fognatura via Romana a Novi	FOGNATURA Novi di Modena	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	68.221,96	0	68.221,96	-32%	NON NECESSARIO WELL POINT E PALANCOLE PER ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
2015MOAG0030	Rifacimento fognature del centro storico di Novi	FOGNATURA Novi di Modena	Gestore	245.000,00	245.000,00	0	245.000,00	0	0	0	-100%	IL COMUNE DEVE COMPLETARE IL PROGETTO ESECUTIVO PER LE PROPRIE OPERE
450	RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMPARTO OVEST	FOGNATURA San Felice sul Panaro	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2915	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Marzanella	FOGNATURA San Felice sul Panaro	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2916	Collettamento fognario dell'agglomerato di Casa Bardella al depuratore di Rivara	FOGNATURA San Felice sul Panaro	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2944	Collettamento località Ramadini al reticolo fognario di San Felice sul Panaro	FOGNATURA San Felice sul Panaro	Gestore		0	0	0	0	0	0		

AIMAG s.p.a.	imenti anualità 2017		STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INV	ESTIMENTI 201	L7 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017						
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOAG0022	449-Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo	FOGNATURA Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	1.629.744,00	0	0	0	1.460,51	0	1.460,51	100%	APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2016
	2202-Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)		n Felice sul Panaro		1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTI FACENTI RIFERIMENTO AD UN PROGETTO PIÙ AMPIO SU CUI SI RIMANE IN ATTESA DI SPECIFICO CONTRIBUTO DERIVANTE DA RISORSE PROGRAMMA ATTUATIVO FAS
2014MOAG0024	2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	FOGNATURA Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	500.000,00	450.000,00	400.000,00	50.000,00	0	0	0		ASSENZA DELLA QUOTA PARTE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
2014MOAG0025	2216-Collettamento fognario di Via Villa Gardè	FOGNATURA Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	880.000,00	0	0	0	0	0	0		ASSENZA DELLA QUOTA PARTE DI
2014MOAG0026	4033-Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice	FOGNATURA Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	900.000,00	700.000,00	575.000,00	125.000,00	0	0	0		FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
2014MOAG0084	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Villanova Rifacimento acquedotto centro storico San Felice (via Fossetta, via Don	ACQUEDOTTO Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	345.000,00	0	0	0	-3.543,82	0	-3.543,82		STORNO MATERIALE MAGAZZINO RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
	Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	ACQUEDOTTO Sai	n Felice sul Panaro	Gestore		32.000,00	0	32.000,00	8.277,02	0	8.277,02		COMUNALE
	Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	FOGNATURA Sai	n Felice sul Panaro	Gestore		70.000,00	0	70.000,00	70.549,96	0	70.549,96	1%	DIFFEDIMENTO ESECUTIVO DED
2015MOAG0037	Adeguamento comparto ossidativo depuratore SanFelice - intervento tampone	DEPURAZIONE Sai	n Felice sul Panaro	Gestore	100.000,00	0	0	0	153.373,55	0	153.373,55		DIFFERIMENTO ESECUTIVO PER ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER L'ITER AUTORIZZATIVO
	COLLETTAMENTO DI VIA CASTELLO A PONTE ROVERE		n Possidonio	Gestore	,	0	0	0	0	0	0		
2717	Potenziamento del sistema idrico di adduzione intercomunale Concordia-San	ACQUEDOTTO So	n Possidonio	Castana			0		0	0			
	possidonio Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli)		n Possidonio	Gestore Gestore	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	44.489,65	0	44.489,65	11%	
	Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Fregni al depuratore di		_		Í			,					
	Solara Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Gherardi al depuratore di Solara		n Prospero n Prospero	Gestore Gestore		0	0	0	0	0	0 0		
2917	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Case Miolato		n Prospero	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0027	2945-Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino secchia	ACQUEDOTTO Sai	n Prospero	Gestore	348.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	Intervento previo finanziamento SFINGE poi non ottenuto. Intervento rinviato alle annualità successive  DIFFERIMENTO ESECUTIVO PER
	San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero	DEPURAZIONE Sai	•	Gestore Gestore	345.000,00 150.000,00	0	0	0	296.287,98	30.000,00	266.287,98		ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER L'ITER AUTORIZZATIVO
2013NIOAG0039	Realizzazione di pubblica fognatura per il drenaggio della acque reflue	DEFORAZIONE Sai	п гтоѕрего	destore	130.000,00	- U	0	0	0		, 0		
469	provenienti dal comparto artigianale a sud dell'agglomerato urbano e relativo scolmatore sul cavo S.Michele		liera	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2102	POTENZIAMENTO COLLETTORE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO DI VIA ARGINETTO	FOGNATURA Sol	liera	Gestore		n	n	0	n	n	)		
2124	COLLETTAMENTO DI SOLIERA AL DEPURATORE DI CARPI	FOGNATURA Sol	liera	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	POTENZIAMENTO DEL RICETTORE FINALE SCOLO GAMBISA		liera	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Collettore fognario di via Bastiglia e via Risorgimento a Limidi di Soliera 2905-Collettamento località Grande Rosa a Soliera		liera liera	Gestore Gestore	110.000,00	0	0	0	0	0	0 0		
2014MOAG0029	2948-Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi	FOGNATURA Sol	liera	Gestore	1 111,30	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0030	4034-Estendimento fognature aree da servire in via Martiri Partigiani a Limidi di Soliera Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera	FOGNATURA Sol	liera liera	Gestore Gestore	110.000,00 50.000,00	0	0	0	0	0	0		
ZUIHIVIOAGUUSB	Rifacimento di rognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre,	I OGIVATURA   50	IICI d	GESTOLE	50.000,00	U	U	0	0	0	, 0		RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
	piazza Sassi) - FSC scheda 4 Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) -		liera	Gestore	63.500,00	63.500,00	0	63.500,00	103,94	0	103,94		COMUNALE
2015MOAG0009	FSC scheda 5  Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera	ACQUEDOTTO Sol	liera liera	Gestore Gestore	36.800,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	0	0	0		MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI (COMUNE, AIMAG, LOTTIZZANTE).
	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV				255 000 00		123.000,00		640.3	0	(10.3		IL COMUNE DEVE COMPLETARE IL PROGETTO ESECUTIVO PER LE PROPRIE
	Novembre, piazza Sassi) Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)		liera liera	Gestore Gestore	255.000,00 120.000,00	255.000,00	<u> </u>	255.000,00	618,3	<u> </u>	618,3	-99,76%	UPENE
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del>-</del>	,	J		·	<u> </u>		<u> </u>	l .	

AIMAG s.p.a. Consuntivo Invest	MAG s.p.a. nsuntivo Investimenti anualità 2017						ESTIMENTI 201	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
	Inserimento contatore di misura ellettromagnetico su tutti i pozzi del campo acquifero di Cognento (con adeguamento della testa pozzi)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Manutenzione straordinaria mediante sostituzione di 3 pozzi del campo acquifero di Fontana	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Completamento del sistema di telecontrollo su sollevamenti fognari e depuratori	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
471	Adeguamento e rinnovo opere elettromeccaniche	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Perforazione nuovo pozzo in sostituzione del P7 di Cognento soggetto a problemi di nitrati	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2212	INSERIMENTO SOFT STARTER DELLE POMPE ELETTROMECCANICHE NELLE CENTRALI ACQUEDOTTISTICHE	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	PERFORAZIONE NUOVO POZZO 13 IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI COGNENTO SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA E PSEUDOMONAS AEROGINOSA	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2656	PERFORAZIONE NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI BOSCO FONTANA SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2657	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DI CAMMINAMENTO IN QUOTA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2702	Installazione "Casette dell'acqua"	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2703	Completamento rete raccolta dati pluviometrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2706	Potenziamento rete di adduzione tra vasca e torre Sacchella	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Realizzazione interconnessione tra adduttici DN350 e DN600 presso Limidi di Soliera		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Gruppo elettrogeno Campogalliano. Impianti elettrici a servizio impianto acquedottistica	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2710	Adeguamento centrale idrica di Novi di Modena	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2711	Rifacimento collettore aspirazione centrale acquedottistica Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2713	Potenziamento rete di adduzione via provinciale per Mantova	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Sostituzione interruttore generale cabina di trasformazione della centrale di Fontana di Rubiera		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2920	Modellizzazione fognature	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2921	Installazione di strumentazioni di caratterizzazione quali-quantitativa on line sul sollevamenti fognari e nodi		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
	Costruzione di un grigliato di appoggio locale pompe di rilancio centrale di Campogalliano		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2952	Efficienza energetica centrali acquedottistiche	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0		

AIMAG s.p.a. Consuntivo Investimenti anualità 2017						PIANO INV	/ESTIMENTI 20:	.7 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2954	Sostituzione pozzo P1 campo pozzi Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
2956	Allestimento unità mobile di monitoraggio ambientale	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4000	Aggiornamento modello matematico sistema acquedottistico a seguito del sisma	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4002	Ripristino Fognatura in seguito al sisma	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
	Installazione regolatori e gruppi di misura in sostituzione della Torri Piezometriche (S.Felice,Cavezzo,Concordia, San Possidonio e Staggia - S.Prospero)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4008	Demolizione Torri (1° Stralcio - S. Felice, Concordia, Cavezzo e S. Possidonio)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4009	Demolizioni Torri (2° Stralcio -Staggia,Fontana di Rubiera)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4010	Installazione nuovo gruppo elettrogeno presso centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4014	Opere di adeguamento impianto di pompaggio Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4017	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
4037	Realizzazione di un punto di rilevamento e comando valvole sul punto di interconnessione acquedottistica tra le centrali di Rubiera, Campogalliano e Novi di Modena.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	C	0	0	0			
2014MOAG0031	13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		600.000,00	350.000,00	250.000,00	717.078,81	354.726,39	362.352,42	20%	DIFFERENTI RICHIESTE DA PARTE DI UTENTI	
2014MOAG0032	2106-Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		320.000,00	0	320.000,00	273.005,31	0	273.005,31	-15%	I la considir annu tanni annu atan and ina cin annu	
2014040450022	2109 Manutagriana etraprdinaria callauamenti fagnari	FOGNATURA	Tutto il sottoambito	Costovo		350,000,00	0	350,000,00	149.940.40		148 840 40		I lavori di manutenzione straordinaria sono stati posticipati al fine di completare le fasi progettazione degli interventi di risanamento strutturale	
	2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari 2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito	Gestore Gestore		250.000,00 140.000,00		250.000,00 140.000,00			148.849,49	16%	Strutturale	
2014100A00034	2114-INVESTIMENT/ACQUESTTO COUNTRITO	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito	destore		140.000,00		140.000,00	102.303,80		102.303,60	10/0	IMPORTO SUPERIORE AL PREVISTO PER ACCORPAMENTO ALL'INTERNO DEL PROGETTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE	
2014MOAG0035	2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	ACQUEDOTTO	AIMAG Tutto il sottoambito	Gestore		68.000,00	0	68.000,00	157.031,48	0	157.031,48	131%	STRAORDINARIA TORRI PIEZOMETRICHE	
2014MOAG0036	2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	ACQUEDOTTO	AIMAG  Tutto il sottoambito	Gestore		66.000,00	0	66.000,00	63.372,34	0	63.372,34	-4%	COSTI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	
2014MOAG0038	2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	ACQUEDOTTO	AIMAG	Gestore	196.693,00	25.000,00	0	25.000,00	5.482,00	0	5.482,00		INFERIORI RISPETTO A PIANIFICATO  MAGGIORI COSTI DOVUTI A NUOVA	
2014M0AG0039	2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito	Gestore	222.565,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	98.772,19	7.122,37	91.649,82		ATTIVITÀ DI RILIEVO PDC ACQUA, AGGIORNAMENTO RETI, COMPLETAMENTO ATTIVITÀ INSERIMENTO ANNO POSA RETE ACQUA	
	2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito	Gestore	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00			85.611,83		INCREMENTO PROGETTAZIONI PER AUMENTO INVESTIMENTI	

AIMAG s.p.a. Consuntivo Investimenti anualità 2017						PIANO INV	ESTIMENTI 201	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
201404040041	2704 Manutanziana etraprdinaria adduttrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Contava		100 000 00	0	100,000,00	100 000 00		100 000 00	20/		
2014WOAG0041	2704-Manutenzione straordinaria adduttrici	ACQUEDOTTO	Aliviad	Gestore		190.000,00	0	190.000,00	186.950,55	0	186.950,55	-2%		
2014MOAG0042	2705-Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	570.000,00	80.000,00	0	80.000,00	80.136,57	0	80.136,57	0,2%		
2014MOAG0043	2707-Protezione catodica adduttrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		30.000,00	0	30.000,00	1.155,19	0	1.155,19		Effettuate le necessarie verifiche sullo stato della protezione catodica degli impianti esistenti, si è ritenuto di rinviare gli interventi alle annualità successive in attesa di perfezionare modalità tecniche di intervento	
	2919-Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	20.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOAG0045	2949-Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	145.000,00	0	0	0	0	0	0			
2014MOAG0046	2953-Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			
	2957-Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOAG0048	2958-Potenziamento della dotazione del laboratorio	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	15.994,53	0	15.994,53	-20%	POSTICIPATI PROGETTI DI MS ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA	
2014MOAG0049	2959-Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati)	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	91.066,97	0	91.066,97	100%	ADEGUAMENTI DERIVANTI DA ESIGENZE DI RISPETTO DELLA NORMA DELLA SICUREZZA IN ORDINE A PARAPETTI, SCALE E BALLATOI	
2014MOAG0050	2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		52.000,00	0	52.000,00	48.784,68	0	48.784,68	-6%		
2014MOAG0051	2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STROARDINARIA RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		1.703.000,00	0	1.703.000,00	2.288.771,61	52.742,85	2.236.028,76	34%	INCREMENTO INTERVENTI DI INVESTIMENTO RETE CAUSA AUMENTO FUGHE IDRICHE	
			Tutto il sottoambito										RISPARMIO DERIVANTE DA ECONOMIE DI	
2014MOAG0052	2962-Ripristino di asfalti	ACQUEDOTTO	AIMAG  Tutto il sottoambito	Gestore		305.000,00	0	305.000,00	170.948,85	1.000,00	169.948,85	-44%	APPALTO MAGGIORI INTERVENTI PER SOPRAGGIUNTE ESIGENZE DI SICUREZZA SUI RETICOLI	
2014MOAG0053	2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria	FOGNATURA	AIMAG	Gestore		375.000,00	0	375.000,00	1.215.459,81	11.104,32	1.204.355,49	224%	FOGNARI	
	2965-INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	11.274,11	0	11.274,11	100%	INTERVENTO IN EMERGENZA	
	4035-Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		30.000,00	0	30.000,00	26.325,11	0	26.325,11	-12%		
	4036-Installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			
	4038-Acquisto terreno adiacente centrale acquedottisitica di Cognento e realizzzione della viabilità.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOAG0058	4039-Progetto Smart metering	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			
2014MOAG0059	4040Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	350.000,00	0	0	0	22.677,53	0	22.677,53	100%	RITARDO NELLO SVILUPPO DEL FIRMWARE DEGLI STRUMENTI "SENTINELLA" PREVISTI NEL 2016	
	4041-Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale acquedottisitca di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0			

AIMAG s.p.a. Consuntivo Investimenti anualità 2017						PIANO INV	ESTIMENTI 201	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017						
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti		
2014MOAG0061	4042-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	86.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	In relazione alla specificità dell'intervento si sono riscontrate difficoltà nell'individuazione dell'impresa più qualificata a cui affidare le attività nei tempi previsti		
2014MOAG0062	4043-Efficientamento energetico impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	215.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0		In relazione alla specificità dell'intervento si sono riscontrate difficoltà nell'individuazione dell'impresa più qualificata a cui affidare le attività nei tempi previsti		
2014MOAG0063	4044-Controllo Impianti	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	36.363,18	0	36.363,18	-27%	POSTICIPATO PARTE DEL PROGETTO		
2014MOAG0064	4001-Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	580.000,00	0	0	0	118.054,61	0	118.054,61	100%	RITARDO ORDINANZA SFINGE		
2014MOAG0065	4012-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e installazione sistema di automazione	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	279.230,00	0	0	0	3.996,42	0	3.996,42	100%	COSTI RESIDUI PER COLLAUDO STRUTTURALE E SVINCOLO GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE		
2014MOAG0066	4013-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	270.679,00	0	0	0	2.794,63	0	2.794,63	100%	ATTIVITA' LEGATE AL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA ATTIVITA' LEGATE ALLA CHIUSURA DEL		
2014MOAG0068	4018-Adeguamento centrale di Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	815.754,00	0	0	0	9.881,74	0	9.881,74	100%	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA		
2014MOAG0069	4019-Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	212.500,69	0	212.500,69	100%	INTERVENTO POSTICIPATO DAL 2016 INTERVENTO NON CONCLUSO A CAUSA DI		
2014MOAG0070	4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	1.500.580,00	0	0	0	1.113.684,10	12.000,00	1.101.684,10	100%	RITARDI DI ESECUZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA		
	4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André -		Tutto il sottoambito										La data contrattuale di fine lavori è slittata dal 17.10.2016 al 23.5.2017. La motivazione è dovuta a cause interne allo svolgimento dei lavori. In particolare sono avvenute sospensioni per complessivi 156 gg e proroghe di 53 gg, a cui si aggiunge un ritardo da parte dell'impresa di 9 gg che ha generato una penale di 1.731 euro		
	Canale dei Montanari 4024-Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare linterconnessione tra il DN	ACQUEDOTTO	AIMAG	Gestore	246.922,00	0	0	0	15.351,21	1.743,61	13.607,60	100%	RITARDO ESECUZIONE CAUSA RITARDO		
2014MOAG0074	700 in C.A. allaltezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	3.776.450,00	0	0	0	1.568.218,29	0	1.568.218,29	100%	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER NUOVO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA SNAM DN1200		
2014MOAG0076	4016-Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente adeguamento di rete e impianti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	926.000,00	0	0	0	3.759,46	-4.050,88	7.810,34	100%	COSTI CHIUSURA PROGETTO		
2014MOAG0077	4045-Rifacimento fognature	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	371.374,00	0	0	0	0	0	0				
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	340.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0		A seguito di attività manutentive mirate sull'autobotte già in dotazione è stato ripristinato il regolare funzionamento, per cui si rimanda l'acquisto ad annualità successive		
	Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto Industriale		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	, , ,	50.000,00	0	50.000,00	118.570,25	0	118.570,25		INTERVENTO STRAORDINARIO ADEGUAMENTO PER CONTINUITÀ DI ESERCIZIO		
2014MOAG0089	Costi residui servitù per interventi ultimanti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	0	0				
2014MOAG0093	4011 - Ripristino palazzina uffici via Bertuzza	титті	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	332.460,00	0	0	0	0	0	0				

AIMAG s.p.a. Consuntivo Investimenti anualità 2017						PIANO IN	VESTIMENTI 201	17 APPROVATO DA ATERSIR	Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017					
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014MOAG0094	4015 - Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in sostituzione	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	600.000,00	0	0	0	0	C	0			
2015MOAG0001	Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi idriche	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	102.350,76	C	102.350,76	100%	NON PREVEDIBILI CAUSA EMERGENZE IN CORSO D'ESERCIZIO PROGETTO SUDDIVISO IN 3 INTERVENTI	
2015MOAG0012	Rifacimento adduttrici sistema idrico	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	13.185.000,00	0	0	0	0	С	0		COME DA COMUNICAZIONE AD ATESIR PROT 1655 DEL 24/02/2017	
2015MOAG0020	Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	76.482,69	20.108,61	56.374,08	53%	NECESSITÀ DI INTERVENIRE SU PIÙ CONDOTTE AMMALORATE RISPETTO A QUANTO PREVISTO, PER RISCHI DI CROLLO	
2015MOAG0042	Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie prementi	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	40.000,00	0	0	0	0	C	0			
2015MOAG0043	Adeguamento normativo emissioni	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	C	0			
2015MOAG0044	Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell'acqua potabile prodotta nei campi pozzi di Cognento, Fontana di Rubiera e Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		81.000,00	0	81.000,00	0	C	0	-100%	INTERVENTO ANTICIPATO ALL'ANNO 2016	
2015MOAG0045	Adeguamento impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		75.000,00	0	75.000,00	0	C	0	-100%	INTERVENTO ANTICIPATO ALL'ANNO 2016	
2015MOAG0046	Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo	ТИТТІ	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	400.000,00	200.000,00	0	200.000,00	199.848,18	C	199.848,18	-0,1%		
2015MOAG0047	Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e realizzazione impianti sostitutivi	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	0	5.600.324,55	-5.600.324,55	100%		
	Sostituzione adduttrice dall'attraversamento stradale A1 (escl.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Castana	6 000 000 00	420000		4 300 000 00	140,052,47		140,062,17	0700	RITARDO NELL'ESECUZIONE GARA DI APPALTO FORNITURA TUBI GHISA DOVUTA ANCHE AL RICORSO AL TAR DEL SECONDO	
	attraversamento) alla via Cicerone nei Comuni di Rubiera e Campogalliano  Sostituzione dell adduttrice dal Campo Pozzi Fontana all'attraversamento stradale A1 (incl. attraversamento) nel Comuni di Rubiera	ACQUEDOTTO  ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito	Gestore Gestore	1.700.000,00	4300000	0	4.300.000,00	140.862,17 14.754,33		140.862,17 14.754,33		CLASSIFICATO  ATTIVITÀ ANTICIPATE RISPETTO AL PIANIFICATO	
	Sostituzione dell adduttrice da via Cicerone a Campogalliano sino a Carpi e parte dell'anello di distribuzione principale		Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	5.485.000,00	0	0	0	4.784,62	C	4.784,62		Ritardi nell'ottenimento delle approvazioni tecniche da parte della Giunta Comunale di Rubiera, della Giunta Comunale di Campogalliano e del parere della Sovrintendenza.	
2017MOAG0004	2117 - Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		n	0		n	r	0			
2017MOAG0004	Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore		0	0	0	91.140,25	0	91.140,25	100%	COME DA VS PROT AT/2017/1877 DEL 23/03/2017	

 14.663.700
 2.445.000

 12.218.700
 11.762.512

 6.225.529
 5.536.983



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 6 del 18.03.2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente Area Servizio Idrico Integrato F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 18 marzo 2019



# Approvato e sottoscritto

# Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante F.to Elisa Di Francesca

# RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sue	estesa deliberazione:
	ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio pe quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2019
