

**CLRE/2023/7 del 21 novembre 2023**

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

**IL COORDINATORE**

F.to Nico Giberti

CLRE/2023/7

### CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2023** il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore **10.00** si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG.AT/2023/0011776 del 16/11/2023, in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI	1,5684
BAGNOLO IN PIANO				1,6866
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI	0,7102
BIBBIANO	Bellelli Loretta	Assessore	SI	1,7833
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	SI	1,0190
BRESCELLO				1,0832
CADELBOSCO DI SOPRA	Bellaria Luigi	Sindaco	SI	1,8570
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Vice sindaco	SI	1,0609
CAMPEGINE	Spanò Alessandro	Sindaco	SI	1,0351
CANOSSA	Bezzi Cristian	Consigliere	SI	0,7856
CARPINETI				0,8115
CASALGRANDE				3,1255
CASINA				0,9092
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI	2,5794
CASTELNOVO DI SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI	1,5117
CASTELNOVO NE' MONTI				1,8060
CAVRIAGO	Bedogni Francesca	Sindaco	SI	1,7312
CORREGGIO	Testi Fabio	Sindaco	SI	4,0834
FABBRICO	Ferrari Roberto	Sindaco	SI	1,2326

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GATTATICO	Ronzoni Luca	Sindaco	SI	1,0938
GUALTIERI				1,1828
GUASTALLA				2,4785
LUZZARA				1,5103
MONTECCHIO EMILIA	Ferri Stefano	Assessore	SI	1,8182
NOVELLARA				2,2758
POVIGLIO				1,3055
QUATTRO CASTELLA	Olmi Alberto	Sindaco	SI	2,2353
REGGIO EMILIA	De Franco Lanfranco	Assessore	SI	26,3332
REGGIOLO				1,6200
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI	1,1377
ROLO				0,8373
RUBIERA				2,4975
SAN MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI	1,4789
SAN POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Vice Sindaco	SI	1,1646
SANT'ILARIO D'ENZA	Perucchetti Carlo	Sindaco	SI	1,9422
SCANDIANO	Pedroni Claudio	Assessore	SI	4,1863
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI	0,8488
VENTASSO	Ferretti Enrico	Sindaco	SI	0,8251
VETTO				0,4889
VEZZANO SUL CROSTOLO	Vescovi Stefano	Sindaco	SI	0,8777
VIANO				0,7301
VILLAMINOZZO				0,7517
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI	10,0000

**Presenti n. 26, quote 74,90**

**Assenti n. 17, quote 25,10**



Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con Deliberazione n° 5 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Ireti S.p.a.;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con Deliberazione n° 9 del 22 ottobre 2021 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stata approvata l'annualità 2023 del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del Gestore Ireti S.p.a.;
- con deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma

operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.A.M.B. 75/2017”;

- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla C.A.M.B. 84/2022, inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto** che:

- il gestore Ireti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Reggio Emilia, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all’annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della C.A.M.B. 75/2017 modificata ed integrata dalla C.A.M.B. 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l’annualità 2022;

- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con **voti favorevoli** 25 (quote 74,07), **astenuti** 1 (quote 0,83) resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Irete S.p.a. per il bacino tariffario ad esso afferente, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 21 novembre 2023

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 21 novembre 2023



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n° 7 del 21 novembre 2023

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

Servizio Idrico Integrato  
Gestore IRETI S.p.A.  
Sotto Ambito Reggio Emilia  
**CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022**

Reggio Emilia, 21 novembre 2023

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 30/11/2018, integrato con Delibera n. 9 del 22/10/2021, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 84/2022.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>GESTORE</b>	22.007.283	29.288.425	7.281.142	133%
<b>SOCIETÀTERZE</b>	//	//	//	//
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	800.060	1.899.896	1.099.836	237%
<b>TOTALE</b>	<b>22.807.343</b>	<b>31.188.322</b>	<b>8.380.979</b>	<b>137%</b>

Tabella 1 - Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura pianificati per l'anno 2022 ammontano ad €. 1.960.403, mentre a consuntivo ne sono stati contabilizzati €. 3.818.578, compresa una quota pari ad €. 1.046, relativa ad ecoincentivi per l'acquisto di mezzi. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 133% del pianificato, con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è superiore all'importo pianificato e si attesta al 237%. Complessivamente la percentuale dell'importo degli investimenti realizzati rispetto all'importo pianificato è pari al 137%.

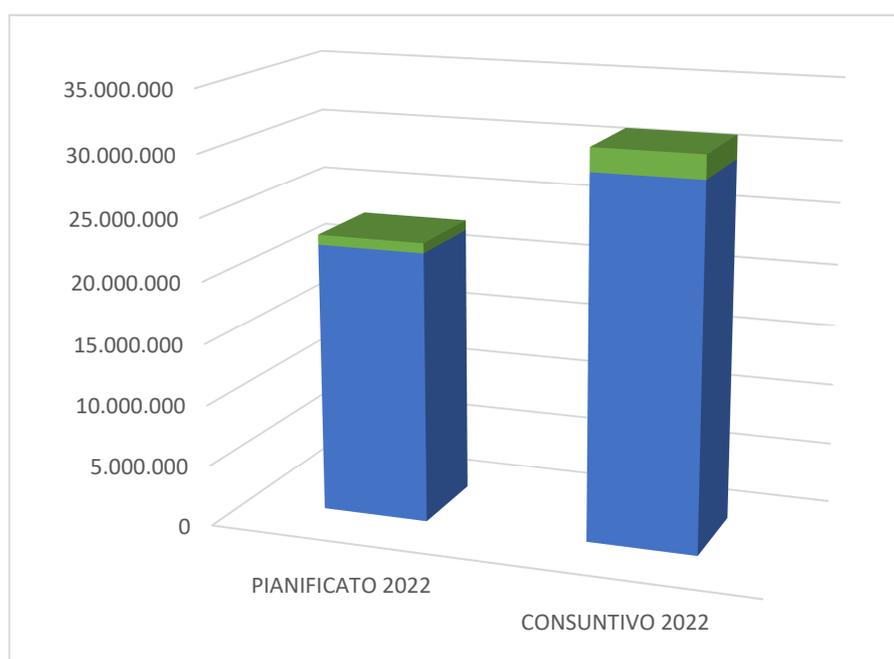


Figura 1 - Confronto tra pianificato e consuntivo 2022

I maggiori contributi incassati sono riferiti ai lavori di seguito elencati:

Codice	Titolo	Comuni	Importo progettuale
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	Opere pluricomunali	1.083.257
2018REIA0169	Alluvione Lentigione - Brescello 11/12/2017 - Ripristino danni depuratore	Brescello	33.254
2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	Opere pluricomunali	16.250

Tabella 2- Interventi con maggiori contributi incassati rispetto al pianificato

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.


## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	Pianificato 2022	Consuntivo 2022	Differenza	DIFF. %
ACQUEDOTTO	12.112.125	18.008.566	5.896.441	149%
DEPURAZIONE	5.950.000	6.005.229	55.229	101%
FOGNATURA	4.415.218	6.155.985	1.740.767	139%
STRUTTURA	1.960.403	3.818.578	1.858.175	195%
TUTTI	330.000	1.018.542	688.542	309%
<b>Totale complessivo</b>	<b>24.767.746</b>	<b>35.006.900</b>	<b>10.239.154</b>	<b>141%</b>

Tabella 3 - Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

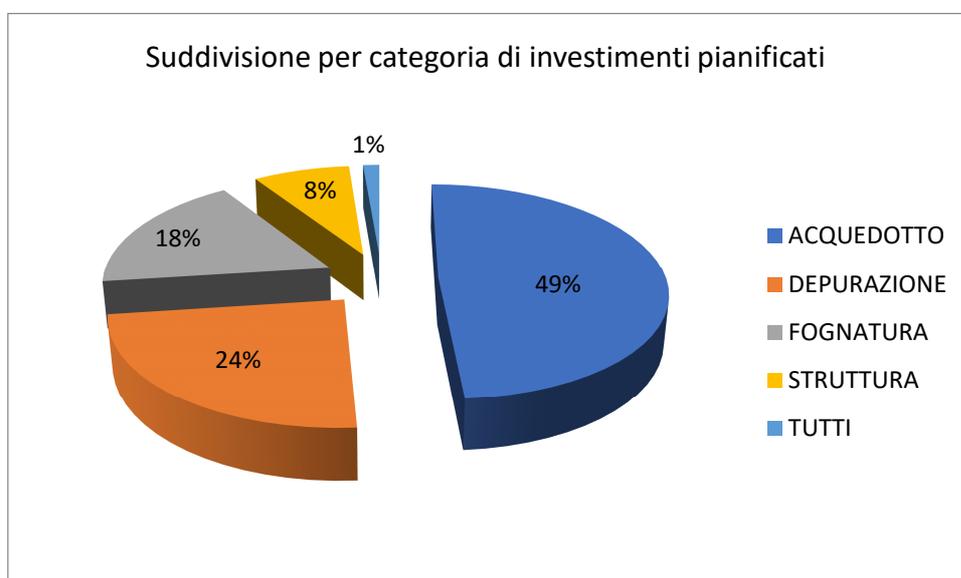

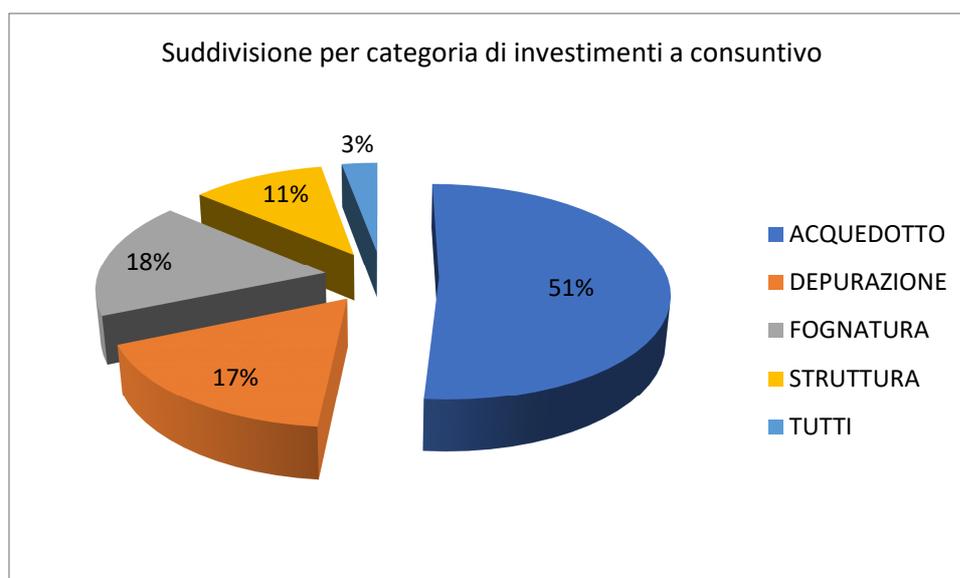


Figura 2-Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	Pianificato 2022	Consuntivo 2022	Differenza	Diff %
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.300.000	10.300.717	7.000.717	312%
<b>FOGNATURA</b>	1.400.000	4.000.844	2.600.844	286%
<b>DEPURAZIONE</b>	2.000.000	3.623.126	1.623.126	181%
<b>ACQUE METEORICHE</b>	600.000	355.750	-244.250	59%
<b>TOTALE</b>	<b>7.300.000</b>	<b>18.280.437</b>	<b>10.980.437</b>	<b>250%</b>

Tabella 4- Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per queste ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che sono emerse minori criticità rispetto a quanto pianificato.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

€	N.	Pianificato 2022	Consuntivo 2022	Differenza	Diff. %
<i>Fino a 500.000</i>	163	4.740.218	4.619.639	-120.579,00	97%
<i>500.001-1.000.000</i>	26	1.630.000	647.577	-982.423,00	40%
<i>1.000.001-2.000.000</i>	12	3.250.000	1.080.386	-2.169.614,00	33%
<i>2.000.001-5.000.000</i>	7	1.290.000	805.117	-484.883,00	62%

<i>Oltre 5.000.000</i>	0	0	0	0,00	100%
<i>Manutenzioni e titoli cumulativi</i>	11	11.897.125	24.035.603	12.138.478,00	202%
<b>TOTALE</b>	<b>219</b>	<b>22.807.343</b>	<b>31.188.322</b>	<b>8.380.979,00</b>	<b>137%</b>
<i>Investimenti di struttura</i>	1	1.960.403	3.818.578	1.858.174,99	195%
<b>TOTALE</b>	<b>220</b>	<b>24.767.746</b>	<b>35.006.900</b>	<b>10.239.153,99</b>	<b>141%</b>

Tabella 5– Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;
- Interventi che non ricadono tra quelli in infrazione, ritenuti prioritari a causa dell'adeguamento degli scarichi previsto dalla normativa;
- Interventi per i quali sono in corso valutazioni sulla definizione dell'effettiva necessità;
- Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha avviato numerose Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006 per l'approvazione, consentendo il prosieguo dell'iter di realizzazione dei lavori.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 42

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2022: 120.

	Numero Interventi	Importo Lordo Pianificato 2022	Importo Lordo Consuntivo 2022
<i>Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)</i>	18	4.120.218	0
<i>Interventi con avvio anticipato nel 2022 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)</i>	96	0	6.730.152
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%</i>	22	19.353.903	26.992.607
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%</i>	2	1.293.625	1.284.141

Tabella 6–Scostamenti tra il rendicontato e il pianificato

Si può notare come molti degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 % mentre la maggior parte sono code di interventi già avviati nelle annualità precedenti. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

### 3. INTERVENTI NON AVVIATI

Di seguito l'elenco degli interventi non avviati nell'annualità 2022:

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Comuni</b>	<b>Importo pianificato 2022</b>
2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	Reggio Emilia	330.000
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	Opere pluricomunali	100.000
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	Bagnolo in Piano	500.000
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	Scandiano	350.000
2018REIA0179	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario area industriale Via Panizzi-Via Galvani	Bagnolo in Piano	180.514
2018REIA0186	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario misto in area industriale Madonnina	Cadelbosco di Sopra	133.673
2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	Carpinetti, Casina	325.000
2018REIA0191	Depuratore di Cigarello: potenziamento accumulo pretrattamento rifiuti liquidi (comma 3)	Carpinetti	200.000
2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchia	Casalgrande	200.000
2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale I Agosto	Correggio	300.000
2018REIA0216	Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata - Centrale idrica Via Sturlona	Novellara	300.000
2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	Poviglio	300.000
2018REIA0221	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Don Milani	Quattro Castella	127.609

2018REIA0222	Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso-Mancasale	Reggio Emilia	400.000
2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	Reggio Emilia	100.000
2018REIA0239	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario Area Sud centro urbano per problemi di insufficienza idraulica	Rio Saliceto	53.422
2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	Scandiano	70.000
2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo	Villaminozzo	150.000

Tabella 7-Interventi non avviati

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Reggio Emilia

					Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA n. 5 del 30/11/2018, integrato con Delibera n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0001	5.8.Uspf.90 - Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	FOGNATURA	Albinea	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	FOGNATURA	Baiso	150.000	0	0	0	1.226	0	1.226	1.226	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0006	5.10.D15.1 5.10.D15.21 5.8.Uspf.111 - Agglomerato Boretto: potenziamento depuratore a 7500 AE	DEPURAZIONE	Boretto	1.317.024	0	0	0	58.264	0	58.264	58.264	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0007	5.10.D15.12 5.10.D15.26 - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	2.151.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0008	5.10.D15.41 - Potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campegine	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0012	5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Casello di Canossa	FOGNATURA	Canossa	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	FOGNATURA	Casalgrande	278.527	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000	0	0	0	73.177	0	73.177	73.177	100%	Cantiere ultimato: completamento impianto elettrico e realizzazione telecontrollo per la messa in esercizio del pozzo realizzato nelle precedenti annualità
2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	ACQUEDOTTO	Casina	1.020.000	0	0	0	66.025	0	66.025	66.025	100%	Cantiere in corso: si prevede il completamento nella primavera 2023

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano	150.000	0	0	0	27.431	0	27.431	27.431	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	700.000	0	0	0	14.534	0	14.534	14.534	100%	Per effetto degli aumenti eccezionali delle materie prime, si è resa necessaria una revisione dei prezzi delle apparecchiature elettromeccaniche. Ciò ha comportato una revisione del progetto definitivo nel suo complesso.
2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	250.000	0	0	0	233.023	0	233.023	233.023	100%	Concluse le verifiche geologiche: cantiere in corso
2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitri+filtr.+sist.esistente	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	300.000	0	0	0	31.582	0	31.582	31.582	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	3.810.000	0	0	0	17.661	0	17.661	17.661	100%	L'intervento prevedeva la realizzazione di un nuovo depuratore con 2 linee da 7.000 AE che è stato realizzato ed è in esercizio. Si è valutato di recuperare il vecchio impianto per una ulteriore nuova linea di cui è stata completata la progettazione. Intervento pianificato nel nuovo POI 2024-2027
2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	154.710	0	0	0	600	0	600	600	100%	Progettazione in corso: individuata soluzione progettuale che non prevede la concomitanza con opere di competenza del consorzio di Bonifica
2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasì, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago	250.357	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biodischi	DEPURAZIONE	Collagna	535.000	0	0	0	56.747	0	56.747	56.747	100%	Progettazione definitiva in corso: si è dovuta rivedere la soluzione progettuale individuando una nuova area per la realizzazione dell'impianto visto il parere negativo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	200.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitrigenitri	DEPURAZIONE	Guastalla	300.000	0	0	0	7.818	0	7.818	7.818	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla	485.566	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0043	5.8.Uspf.99 -Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla	165.000	0	0	0	150	0	150	150	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio	137.820	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara	1.800.000	0	0	0	1.693	0	1.693	1.693	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE	DEPURAZIONE	Novellara	660.000	0	0	0	1.396	0	1.396	1.396	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	FOGNATURA	Novellara	155.000	0	0	0	18.514	0	18.514	18.514	100%	Costi per la realizzazione di ripristini definitivi su intervento realizzato in precedenti annualità
2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	FOGNATURA	Novellara	150.000	0	0	0	43.031	0	43.031	43.031	100%	Intervento concluso: realizzati ripristini definitivi
2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	FOGNATURA	Quattro Castella	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	FOGNATURA	Ramiseto	103.644	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncoesi: attraversamento Crostolo	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0058	5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale - Opere di completamento	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0061	Depuratore di Roncoesi - sistemazione e adeguamento digestori	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	550.000	330.000	0	330.000	0	0	0	-330.000	-100%	Intervento non più prioritario. Da ripianificare nel prossimo Piano 2024-2027. Sul depuratore di Roncoesi sono previsti altri interventi ritenuti prioritari rispetto a quello sui digestori che sono stati comunque oggetto di manutenzione straordinaria per garantirne l'efficienza. L'intervento non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2014REIA0063	U.s.p.f. - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	FOGNATURA	Reggio Emilia	400.000	0	0	0	13.714	0	13.714	13.714	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Spese per sistemazione area
2014REIA0064	5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 - Agglomerato Rame - Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	1.470.000	0	0	0	237.999	0	237.999	237.999	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Maggiori costi sostenuti in corso d'opera per ulteriori tratte di collettore che si è ritenuto opportuno realizzare con tecnologia microtunnelling anziché con scavi profondi a cielo aperto in prossimità di ferrovia e strada provinciale.
2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Rio Saliceto	150.000	0	0	0	72.002	0	72.002	72.002	100%	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Sistemazione definitiva dei piazzali e delle aree di manovra dei mezzi
2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	FOGNATURA	Rio Saliceto	258.000	0	0	0	71.594	0	71.594	71.594	100%	Cantiere in corso: verificata l'impossibilità di ampliamento del canale scolmatore si è proceduto con il potenziamento del collettore di monte in Via Don Minzoni
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	170.000	0	0	0	1.996	0	1.996	1.996	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	DEPURAZIONE	Viano	900.000	0	0	0	22.036	0	22.036	22.036	100%	Progetto di fattibilità concluso con importo – 1.430.000. Da ripianificare nel prossimo Piano 2024-2027. Lo studio di fattibilità ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi rispetto a quelli inizialmente previsti. Ciò ha comportato l'aumento dell'importo che non è risultato compatibile rispetto agli aumenti di diversi altri titoli a Piano. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 nelle annualità 2026-2027
2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000	0	0	0	100.619	0	100.619	100.619	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Costi per il completamento dell'impianto elettrico
2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano	181.829	0	0	0	14.386	0	14.386	14.386	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Spese per ripristini definitivi e liquidazione servitù di passaggio
2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminozzo	370.000	0	0	0	69.787	0	69.787	69.787	100%	Impianto di depurazione completato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Eseguiti lavori di sistemazione dell'area
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminozzo	700.000	0	0	0	19.081	0	19.081	19.081	100%	Realizzato inclinometro per la verifica del movimento dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto vista la prossimità di versanti in frana. Iniziato monitoraggio
2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	1.200.000	300.000	0	300.000	109.492	0	109.492	-190.508	-63%	Rendicontati qui alcuni interventi richiesti dai Comuni che non avevano un ID dedicato (Cà Cavalli Albinea, Via Bassa Canossa, Santa Maria Novellara..). Nel corso del 2022 si è proceduto secondo le richieste pervenute dai Comuni. E' stato realizzato il collettore fognario a servizio del borgo Cà Cavalli in Comune di Albinea e si è proceduto alla progettazione del collettore di Via Bassa in Comune di Canossa e di Santa Maria in Comune di Novellara.
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnuovo Sotto	ACQUEDOTTO	Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto	200.000	50.000	0	50.000	5.668	0	5.668	-44.332	-88%	Spese di progettazione per l'intervento di estensione della rete di acquedotto in Via Tolara richiesto dal Comune di Castelnuovo Sotto che verrà realizzato nella primavera 2023. Si è completata la progettazione per € 5.668 e si sono inoltrate le richieste di autorizzazione agli Enti.

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	369.044	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Non sono pervenute richieste di intervento da parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che prevede il cofinanziamento al 50% da parte dei privati
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	13.200.000	3.300.000	0	3.300.000	10.300.717	0	10.300.717	7.000.717	212%	Nel corso del 2022, sono principalmente aumentate le attività di rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare completamente la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione. Solo questa voce satura il 40% dell'intero importo delle manutenzioni straordinarie. Si segnala che il trend delle complessive riparazioni su presa, comprendenti il completo rifacimento e la mera riparazione, è in diminuzione, passando da 2366 rotture nel 2020, a 2270 nel 2021, a 2176 nel 2022. Ricompresi in questo capitolo anche sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite (per ~ 207.407,80) o per concomitanza ad interventi di riqualificazione da parte dei Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate di piazze, marciapiedi, piste ciclabili.). Si evidenzia che all'interno di questo capitolo vengono rendicontati anche gli interventi di manutenzione straordinaria su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi, ma anche su tutta l'infrastruttura degli oltre 480 distretti di rete al fine di mantenerli sempre in corretto funzionamento
2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	1.588.814	330.000	0	330.000	224.637	0	224.637	-105.363	-31%	Nel corso del 2022 sono state inferiori le esigenze di sviluppo/aggiornamento cartografico
2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	FOGNATURA	Collagna		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0057	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncoesi: realizzazione condotta DN 800	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	2.850.000	0	0	0	424.980	0	424.980	424.980	100%	Cantiere in fase di ultimazione. Realizzate le opere propedeutiche agli impatti sulle reti esistenti
2016REIA0058	Riuso reflui Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	2.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti )	FOGNATURA	Rubiera	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0105	Estensione rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	130.166	0	0	0	49.310	0	49.310	49.310	100%	Cantiere in fase di ultimazione: realizzato impianto elettrico e installato PLC

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	-500.000	-100%	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche legate alla definizione del tracciato in un contesto fortemente urbanizzato. Si tratta di intervento di rifacimento del ramo di scarico di uno degli scolmatori principali della rete fognaria di Bagnolo capoluogo. Con il supporto del Comune sono stati verificati gli scarichi delle abitazioni che recapitano in questa condotta che risulta in più punti collassata. In corso di definizione un percorso alternativo. Intervento ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 nelle annualità 2024-2025
2016REIA0107	Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	FOGNATURA	Bibbiano	141.360	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	FOGNATURA	Boretto	120.144	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	325.000	0	0	0	1.203	0	1.203	1.203	100%	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche legate all'ottenimento di autorizzazione da parte di proprietà private limitrofe all'impianto esistente. Coinvolto il Comune per raggiungere accordo bonario con i proprietari.
2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	ACQUEDOTTO	Campegine	1.500.000	950.000	0	950.000	152	0	152	-949.848	-99%	Intervento non più prioritario. Da ripianificare nel prossimo Piano 2020-2027. Alla luce delle interconnessioni tra acquedotti offerte in gara, l'intervento non risulta più prioritario ai fini di garantire sicurezza e continuità del servizio nell'acquedotto di Caprara. L'intervento non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole I°lotto	FOGNATURA	Campegine	1.000.000	300.000	0	300.000	196.793	0	196.793	-103.207	-34%	Intervento concluso: maggiori spese rendicontate nelle precedenti annualità rispetto al 2022
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2^ linea	DEPURAZIONE	Carpineti	1.100.000	0	0	0	238.466	0	238.466	238.466	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	500.000	0	0	0	31.579	0	31.579	31.579	100%	Realizzati interventi di manutenzione straordinaria in attesa di individuare una soluzione progettuale definitiva

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	ACQUEDOTTO	Casalgrande	180.000	0	0	0	293	0	293	293	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	Casalgrande	150.000	0	0	0	49.835	0	49.835	49.835	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità. Realizzata asfaltatura dell'area, completamento dell'impianto elettrico e liquidate le compensazioni relative all'aumento dei prezzi delle materie prime
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	500.000	0	0	0	11.939	0	11.939	11.939	100%	conclusa la progettazione, il cantiere è partito nel 2023 e poi sospeso. L'aumento degli importi di diversi interventi a causa del caro materiali non ha consentito di avviare il cantiere. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	FOGNATURA	Castelnovo Monti	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000	0	0	0	78.254	0	78.254	78.254	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Spese per ripristini definitivi e liquidazione servitù di passaggio
2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia	750.000	0	0	0	92.461	0	92.461	92.461	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Realizzati ripristini definitivi e compensazioni caro materiali su lavorazioni 2021
2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.200.000	0	0	0	124.492	0	124.492	124.492	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000	0	0	0	656.182	0	656.182	656.182	100%	Cantiere in corso: Intervento da considerare unitamente al codice 2018REIA0231 - Adeguamento linea digestione anaerobica. E' stato realizzato un unico progetto da - 2.200.000
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	640.000	0	0	0	4.082	0	4.082	4.082	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000	0	0	0	143	0	143	143	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	2.890.000	690.000	0	690.000	6.726	0	6.726	-683.274	-99%	Progettazione conclusa, rilasciato Permesso di costruire. In corso la revisione dei prezzi alla luce dell'aumento del costo delle materie prime. L'aumento degli importi di diversi interventi a causa del caro materiali non ha consentito di dare avvio al cantiere. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 e candidato al bando PNISSI
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	180.000	0	0	0	1.508	0	1.508	1.508	100%	Progetto di fattibilità tecnico economica ultimato: l'importo necessario per l'adeguamento dell'impianto risulta pari a - 1.330.000. Da ripianificare. Lo studio di fattibilità ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi rispetto a quelli inizialmente previsti. Ciò ha comportato l'aumento dell'importo che è non è risultato compatibile rispetto agli aumenti di diversi altri titoli a Piano. L'intervento non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	635.000	0	0	0	4.042	0	4.042	4.042	100%	In corso la revisione dei prezzi alla luce dell'aumento del costo delle materie prime. L'aumento degli importi di diversi interventi a causa del caro materiali non ha consentito di dare avvio al cantiere. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 nelle annualità 2024-2025
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	-350.000	-100%	In corso valutazioni per definire l'effettiva necessità dell'intervento a suo tempo richiesto dal gestore. In luce delle verifiche effettuate sulla rete di monte, seguite da interventi di manutenzione straordinaria su alcuni pozzetti e manufatti, l'intervento non risulta più prioritario. L'intervento non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	180.000	0	0	0	366.315	0	366.315	366.315	100%	Cantiere in corso: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0245. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato<200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	250.000	0	0	0	412	0	412	412	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminazzo	250.000	0	0	0	22.783	0	22.783	22.783	100%	Progettazione conclusa: manca l'ottenimento della servitù di passaggio con una delle proprietà interessate dai lavori nonché la bonifica bellica
2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali		0	0	0	-289.351	1.083.257	793.906	793.906	100%	Consuntivo dei lavori realizzati su richiesta di Privati nel corso del 2022. Importo più elevato rispetto allo storico per effetto della risoluzione delle interferenze con la nuova tangenziale nord di Reggio Emilia in corso di realizzazione da parte di ANAS
2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0150	Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	500.000	0	0	0	4.646	0	4.646	4.646	100%	Coda di costi su progetto completato in precednti annualità. Rimane da definire Con il Comune di Brescello il finanziamento dell'opera
2017REIA0153	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	145.179	0	0	0	13.726	0	13.726	13.726	100%	Si è resa necessaria una revisione del progetto perché l'attraversamento ferroviario andrà realizzato con tecnologia microtunnelling. Ciò a portato ad un ulteriore aumento dell'importo di progetto. Da ripianificare nelle prossime annualità

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000	0	0	0	18.104	0	18.104	18.104	100%	Progettazione conclusa. Si potrà passare alla fase esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà completato il collegamento del serbatoio pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione esistente.
2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	30.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
2017REIA0156	Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0157	Acquedotto di Caprara:nuova adduttrice DN 300 da Autostrada A1 a Via Marconi	ACQUEDOTTO	Campegine	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	FOGNATURA	Fabbrico	340.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
2017REIA0159	Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi-Viale Umberto I°	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000	0	0	0	42.346	0	42.346	42.346	100%	Intervento concluso: realizzati ripristini definitivi
2017REIA0160	Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000	0	0	0	69.570	0	69.570	69.570	100%	Cantiere in corso: si prevede il completamento nella primavera 2023
2017REIA0161	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0162	Sostituzione rete idrica in Via Venturi	ACQUEDOTTO	Bibbiano	250.000	0	0	0	346.650	0	346.650	346.650	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	FOGNATURA	Ventasso	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggio	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000	0	0	0	1.361	0	1.361	1.361	100%	In accordo con il Comune di Ventasso stiamo attendendo per capire se, come da informazioni pervenute, la proprietaria sia intenzionata a vendere il terreno interessato dal passaggio della condotta fognaria. Nell'impossibilità di raggiungere l'accordo bonario occorrerà pianificare CdS e procedura espropriativa.
2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	600.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Conclusa l'analisi costi/benefici per confrontare l'intervento di potenziamento dell'impianto con la possibilità di collettare i reflui al depuratore di Reggiolo. Si è valutato più efficace il potenziamento dell'impianto per un importo stimato di ~ 1.500.000. Da ripianificare nel nuovo POI 2024-2027

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017REIA0167	Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000	0	0	0	35.432	0	35.432	35.432	100%	Realizzato spostamento linea MT Enel. Il cantiere verrà ultimato nella primavera 2023
2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.800.000	2.200.000	0	2.200.000	2.900.248	0	2.900.248	700.248	31%	Maggiori costi dovuti al maggior numero di km di rete sostituiti ed all'aumento dei prezzi dei materiali
2018REIA0169	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI DEPURATORE	DEPURAZIONE	Brescello	85.000	0	0	0	-33.254	33.254	0	0	0%	
2018REIA0170	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Brescello	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0171	"Contributi Progetto sperimentale Smart meter - comune Reggio di Emilia (rif. 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Scandiano		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	FOGNATURA	Quattro Castella		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	14.641.200	1.783.500	0	1.783.500	1.217.038	0	1.217.038	-566.462	-31%	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato per difficoltà di approvvigionamento materiali
2018REIA0175	Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	370.000	0	0	0	6.808	0	6.808	6.808	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0176	Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000	0	0	0	20.581	0	20.581	20.581	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva Via XXV Aprile	FOGNATURA	Albinea	65.846	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0178	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario tra via Malaguti - Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo-Via Gandhi	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0179	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario area industriale Via Panizzi-Via Galvani	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	180.514	180.514	0	180.514	0	0	0	-180.514	-100%	In corso valutazioni per definire l'effettiva necessità dell'intervento a suo tempo richiesto dal Comune. Le risorse disponibili potrebbero essere utilizzate per l'intervento di Via Grandi segnalato come critico dall'Amministrazione Comunale di Bagnolo
2018REIA0180	Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano-Malamassata	ACQUEDOTTO	Bibbiano	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0181	Estendimento rete acqua in Via Marchesi	ACQUEDOTTO	Boretto	100.000	0	0	0	95	0	95	95	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	FOGNATURA	Boretto	120.000	0	0	0	7.340	0	7.340	7.340	100%	Pogettazione in corso: completati rilievi e videoispezioni
2018REIA0183	Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto-Poviglio	ACQUEDOTTO	Boretto	600.000	0	0	0	115.903	0	115.903	115.903	100%	In corso il secondo stralcio dell'intervento complessivo da ~ 600.000
2018REIA0184	Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, Viazza, Imperiale inferiore, Via Bernieri	ACQUEDOTTO	Brescello	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0185	Depuratore di Villa Seta: riordino e revamping del comparto biologico	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	400.000	400.000	0	400.000	7.490	0	7.490	-392.510	-98%	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione delle priorità di intervento su un impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare
2018REIA0186	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario misto in area industriale Madonnina	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	133.673	133.673	0	133.673	0	0	0	-133.673	-100%	In corso valutazioni per definire l'effettiva necessità dell'intervento a suo tempo richiesto dal Comune.
2018REIA0188	Rifacimento impianto di sollevamento in loc. Ponte Testa	FOGNATURA	Campagnola	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	ACQUEDOTTO	Carpineti, Casina	325.000	325.000	0	325.000	0	0	0	-325.000	-100%	Verifiche di fattibilità in corso: difficoltà di individuazione di un percorso stabile in contesto franoso. il titolo è stato inserito nel 2018 ma pianificato per il 2022. Visto il contesto franoso sono in corso verifiche geologiche per l'individuazione di un percorso stabile. Nel mentre, per garantire la sicurezza e continuità del servizio è stato realizzato un collegamento provvisorio "volante". L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2047 nelle annualità 2024-2025
2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	FOGNATURA	Carpineti	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0191	Depuratore di Cigarello: potenziamento accumulo pretrattamento rifiuti liquidi (comma 3)	DEPURAZIONE	Carpineti	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	-100%	A seguito delle valutazioni effettuate, l'intervento non è più ritenuto prioritario. Non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2018REIA0192	Piano Fognario - Intervento di messa in sicurezza fognatura in Via san Prospero	FOGNATURA	Carpineti	76.745	0	0	0	52.829	0	52.829	52.829	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0193	Sostituzione rete idrica in Via Statutaria	ACQUEDOTTO	Casalgrande	250.000	0	0	0	11.771	0	11.771	11.771	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchia	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	-100%	Verifiche di fattibilità in corso: la tubazione esistente passa all'interno di proprietà in prossimità di fabbricati. Occorre individuare un percorso alternativo. A seguito delle verifiche effettuate è necessario un tracciato più lungo per evitare i fabbricati esistenti. L'importo previsto non è sufficiente. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 nell'annualità 2024
2018REIA0195	Potenziamento impianto di San Valentino "Le Ville" e dismissione impianto san Valentino "Castello"	DEPURAZIONE	Casalgrande	400.000	300.000	0	300.000	18.687	0	18.687	-281.313	-93%	Progettazione in corso: in corso di individuazione l'area per la realizzazione dell'impianto di sollevamento necessario a collettare i reflui dall'impianto "Castello" all'impianto "Le Ville"
2018REIA0196	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno - La Stella	ACQUEDOTTO	Casina	270.000	0	0	0	1.391	0	1.391	1.391	100%	Progettazione in corso: da programmare prove geologiche per attraversamento di aree in frana
2018REIA0197	Piano Fognario - Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	FOGNATURA	Casina	37.820	0	0	0	27.822	0	27.822	27.822	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0198	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	100.000	0	0	0	3.914	0	3.914	3.914	100%	Progettazione conclusa: intervento candidato al bando PNRR fognatura e depurazione
2018REIA0199	Sostituzione rete idrica DN 500 in loc. Costarella, Croce	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	480.000	0	0	0	1.772	0	1.772	1.772	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2018REIA0200	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matilde di Canossa	FOGNATURA	Castelnovo Monti	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0201	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rivasi Ovest	FOGNATURA	Cavriago	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0202	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini - Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	FOGNATURA	Cavriago	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0203	Sostituzione rete idrica in Via Marzabotto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000	0	0	0	57.926	0	57.926	57.926	100%	Cantiere ultimato: realizzati ripristini definitivi
2018REIA0204	Sostituzione rete idrica in Via Gilberto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000	0	0	0	943	0	943	943	100%	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale I Agosto	FOGNATURA	Correggio	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	-100%	In corso valutazioni per definire l'effettiva necessità dell'intervento a suo tempo richiesto dal Comune. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 all'annualità 2027
2018REIA0206	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario nella zona tra XXV Aprile e Via A. Moro	FOGNATURA	Fabbrico	80.529	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0207	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	ACQUEDOTTO	Gattatico	250.000	0	0	0	21.396	0	21.396	21.396	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000	200.000	0	200.000	19.706	0	19.706	-180.294	-90%	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione delle priorità di intervento su un impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare
2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000	200.000	0	200.000	11.733	0	11.733	-188.267	-94%	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione delle priorità di intervento su un impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare
2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	FOGNATURA	Guastalla	226.985	0	0	0	389	0	389	389	100%	Problematica risolta con alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle soglie degli scolmatori. Intervento non più necessario. Le risorse potranno essere destinate all'intervento ID 2017REIA0153 - Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna la cui progettazione esecutiva ha portato ad un incremento dell'importo previsto
2018REIA0212	Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	ACQUEDOTTO	Montecchio	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri	FOGNATURA	Montecchio	150.000	0	0	0	144.547	0	144.547	144.547	100%	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa	FOGNATURA	Montecchio	118.298	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0215	Sostituzione adduttrice in Via Levata	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000	0	0	0	130.632	0	130.632	130.632	100%	Cantiere in corso: si prevede il completamento nella primavera 2023

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0216	Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata - Centrale idrica Via Sturlona	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	-100%	Verifiche di fattibilità in corso per individuare un percorso in un'area industriale densamente urbanizzata. A seguito delle verifiche effettuate è emersa la necessità di un percorso più lungo di quello inizialmente ipotizzato. L'importo previsto non è sufficiente. L'intervento non è rientrato nel nuovo POI 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000	0	0	0	360.002	0	360.002	360.002	100%	Da rendicontare qui solo ~ 1.039,66 per spese di progettazione. Per errore di codice ARSI ~ 144.325,24 da attribuire all'ID 2018REIA0218 - Sostituzione rete adduttrice Via Fermi. Per l'intervento di San Bernardino si sta valutando la modalità re-lining
2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	ACQUEDOTTO	Poviglio	650.000	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	-100%	Cantiere in corso: da rendicontare qui ~ 144.325,24 erroneamente attribuite all'ID 2018REIA0217 - Sostituzione rete in loc. san Bernardino
2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	FOGNATURA	Quattro Castella	100.000	0	0	0	11.215	0	11.215	11.215	100%	Progettazione definitiva conclusa: in corso di ottenimento le autorizzazioni
2018REIA0221	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Don Milani	FOGNATURA	Quattro Castella	127.609	127.609	0	127.609	0	0	0	-127.609	-100%	Da verifiche effettuate in campo non risultano problematiche di insufficienza idraulica. Da ridefinire con l'Amministrazione comunale le priorità di intervento
2018REIA0222	Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso-Mancasale	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	600.000	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000	-100%	Eseguite prime valutazioni preliminari: da posare circa 1.800 m di condotta in acciaio DN 600 per un importo stimato di ~ 1.200.000. Gran parte del tracciato su terreni agricoli privati. Da ripianificare nel nuovo POI 2024-2027
2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Eseguite prime valutazioni preliminari: da posare circa 1.500 m di condotta in acciaio DN 1000 per un importo stimato di ~ 2.200.000. Tracciato su strada provinciale ad elevato traffico. Da ripianificare nel nuovo POI 2024-2027
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0225	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	250.000	0	0	0	79.429	0	79.429	79.429	100%	Intervento concluso: realizzati ripristini definitivi
2018REIA0226	Sostituzione rete idrica in Via F.lli Rosselli	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	200.000	0	0	0	142.558	0	142.558	142.558	100%	Cantiere ultimato: manca ripristino definitivo
2018REIA0227	Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Roncoesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	200.000	0	0	0	771	0	771	771	100%	Progettazione definitiva conclusa: in corso di ottenimento le autorizzazioni
2018REIA0228	Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Roncoesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	300.000	0	0	0	23.849	0	23.849	23.849	100%	Progetto di fattibilità concluso: si rende necessaria la costruzione di un nuovo fabbricato per l'alloggiamento dell'impianto. L'importo risulta ~ 1.400.000. Da ripianificare nel nuovo POI 2024-2027

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0229	Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000	0	0	0	2.028	0	2.028	2.028	100%	Progettazione in sospenso: intervento non prioritario. Grazie ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria gli allagamenti in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi risultano modesti e non generano criticità
2018REIA0230	Potenziamento rete fognaria in F.lli Rosselli	FOGNATURA	Reggio Emilia	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0232	Depuratore di Roncocesi: adeguamenti impiantistici diversi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000	300.000	0	300.000	4.625	0	4.625	-295.375	-98%	Progetto di fattibilità concluso. Comprende vari interventi segnalati da Operation: 1) Realizzazione sistema di asportazione ed allontanamento schiume da vasche nitrificazione 2) Potenziamento ispessimento dinamico con trattamento odori 3) Rinnovo comparto disidratazione fanghi con installazione di seconda centrifuga, sostituzione sistema stoccaggio fanghi e relativo caricamento, realizzazione sistema trattamento aria del comparto 4) Revamping comparto sollevamento iniziale. L'importo totale è ~ 3.650.000. Interventi realizzabili anche singolarmente: in corso di valutazione le priorità di intervento in relazione alle somme disponibili. Da ripianificare nel nuovo POI 2024-2027
2018REIA0233	Copertura vasca di equalizzazione e post ispessitori depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	130.000	0	0	0	80.074	0	80.074	80.074	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2018REIA0234	Trattamento bottini e copertura caricamento fanghi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.670.000	1.670.000	0	1.670.000	19.167	0	19.167	-1.650.833	-98%	Coda di costi di progettazione. Confermato l'importo pari a ~ 6.400.000. Da ripianificare. Sul depuratore di Mancasale sono previsti altri interventi ritenuti prioritari rispetto a questo. L'importo molto elevato non consente l'inserimento nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2018REIA0235	Adeguamento impianto di condizionamento fanghi e stoccaggio depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000	0	0	0	18.398	0	18.398	18.398	100%	Progetto candidato PNRR - Rifiuti. L'importo definitivo ammonta a ~ 5.750.700
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0238	Depuratore di Reggiolo nuovo: adeguamento, ripristino e collaudo linea fanghi	DEPURAZIONE	Reggiolo	150.000	0	0	0	418	0	418	418	100%	Progetto di fattibilità concluso. La prima ipotesi progettuale prevedeva di riutilizzare le strutture esistenti per ottenere la riduzione dei fanghi attraverso una stabilizzazione aerobica che però non è risultata adeguata in termini di costi benefici. Si è optato per una soluzione tecnologicamente più avanzata che consente utilizzando la pirolisi una riduzione dei fanghi dell'88%. L'importo di progetto sale però a ~ 850.000. Da ripianificare nel prossimo POI 2024-2027
2018REIA0239	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario Area Sud centro urbano per problemi di insufficienza idraulica	FOGNATURA	Rio Saliceto	53.422	53.422	0	53.422	0	0	0	-53.422	-100%	Da definire con il Comune di Rio Saliceto le priorità d'intervento in relazione all'importo a disposizione
2018REIA0240	Piano Fognario - Estendimento rete fognaria nera in via Crocetta	FOGNATURA	Rolo	123.255	0	0	0	144.074	0	144.074	144.074	100%	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2018REIA0241	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0243	Piano Fognario - Rifacimento collettore fognario in Via Primo Maggio	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	FOGNATURA	Scandiano	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-70.000	-100%	In corso valutazioni per la definizione del tracciato che interessa esclusivamente terreni agricoli privati
2018REIA0245	Depuratore di Bosco	DEPURAZIONE	Scandiano	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0246	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario in Via del Serraglio	FOGNATURA	Scandiano	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	DEPURAZIONE	Ventasso	200.000	200.000	0	200.000	2.252	0	2.252	-197.748	-98%	Progetto di fattibilità in corso: difficoltà di individuazione di un'area stabile per la realizzazione dell'impianto in una zona di dissesto idrogeologico
2018REIA0248	Unificazione scarichi loc. Acquabona	DEPURAZIONE	Ventasso	150.000	0	0	0	3.998	0	3.998	3.998	100%	A seguito delle verifiche effettuate, l'intervento non risulta più prioritario e non è rientrato nella pianificazione 2024-2027. Andrà rivalutato in successive annualità
2018REIA0249	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	845.000	0	0	0	1.083	0	1.083	1.083	100%	Cantiere in corso: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0250. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	156.650	0	0	0	257.839	0	257.839	257.839	100%	Cantiere in corso: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0249. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo	DEPURAZIONE	Villaminozzo	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	-100%	In corso valutazioni di fattibilità: per collettare l'agglomerato di Case Zobbi alla rete depurata occorre estendere la rete per circa 700 m fino al depuratore di Villaminozzo capoluogo. A seguito delle verifiche effettuate l'importo previsto non è sufficiente. L'intervento è stato ripianificato nel nuovo POI 2024-2027 nell'annualità 2026-2027

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	ACQUEDOTTO	Villaminazzo	180.000	0	0	0	159.693	0	159.693	159.693	100%	Serbatoio completato: in corso opere di completamento della camera di manovra e dell'impianto elettrico. Maggiori costi dovuti principalmente alla compensazione del caro materiali
2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	3.623.126	0	3.623.126	1.623.126	81%	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti e rotture su macchine e apparecchiature. Inoltre sono stati portati a termine 4 interventi di adeguamento comparto particolarmente onerosi, quali: Ristrutturazione edile e sostituzione carro ponte sedimentatore secondario linea 3 depuratore Mancasale; Sostituzione rete di diffusione aria comparto nitrificazione linea 3 depuratore Mancasale; Sostituzione rete di diffusione aria comparto nitrificazione con implementazione controller di processo depuratore Salvaterra; Rifacimento comparto di de fosfatazione tramite dosaggio di Cloruro ferrico depuratore di Le Forche
2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	5.600.000	1.400.000	0	1.400.000	4.000.844	0	4.000.844	2.600.844	185%	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero di interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori interventi di manutenzione straordinaria su rotture riscontrate a seguito di nuove ispezioni/ricerche programmate, realizzate con sistemi satellitari ;maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali. Maggiori interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento esistenti
2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	2.400.000	600.000	0	600.000	355.750	0	355.750	-244.250	-40%	Minori necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti per acque meteoriche rispetto a quanto pianificato
2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000	100.000	0	100.000	-14.620	16.250	1.630	-98.370	-98%	Minori necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti per acque meteoriche rispetto a quanto pianificato
2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.881.209	1.960.403	0	1.960.403	3.817.532	1.046	3.818.578	1.858.175	94%	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti per la gestione dell'utenza (progetto IREN WAY)
2018REIA0258	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		493.565	720.060	1.213.625	432.589	767.135	1.199.724	-13.901	-1%	
2021REIA0259	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0156 - Febbio (AE 157)	DEPURAZIONE	Villaminazzo		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0260	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0108 - Santonio (AE 153)	DEPURAZIONE	Villaminazzo		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0261	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0259 - Cortogno (AE 141)	DEPURAZIONE	Casina		0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2021REIA0262	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0115 - Maro (AE 90)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0263	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0141 - Cerrè Sologno-Via Bertini (AE 90)	DEPURAZIONE	Villaminazzo		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0264	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0203 - Garfagnolo (AE 87)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0265	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0113 - Morsiano (AE 82)	DEPURAZIONE	Villaminazzo		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0266	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0146 - Melca (AE 81)	DEPURAZIONE	Guastalla		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0267	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0130 - Cà del Cavo (AE 80)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0268	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0123 - Primaore (AE 67)	DEPURAZIONE	Villaminazzo		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0269	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0187 - Strada (AE 67)	DEPURAZIONE	Vetto d'enza		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0270	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0747 - Roncopò (AE 61)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0271	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0240 - Cerredolo dei Coppi-Chiesa (AE 54)	DEPURAZIONE	Canossa		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0272	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0169 - Quarqua (AE 52)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2021REIA0273	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0250 - Pulpiano (AE 52)	DEPURAZIONE	Viano		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0274	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0256 - Serra (AE 51)	DEPURAZIONE	Viano		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0275	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0279 - Noce (AE 50)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0276	PNRR - Alleggerimento portate miste scolmate al nodo "La Nave"	FOGNATURA	Reggio Emilia	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0277	Realizzazione collegamento fognario tra Corso Prampa e Via della Vittoria	FOGNATURA	Villaminozzo	100.000	0	0	0	15.586	0	15.586	15.586	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nell'annualità 2023
2021REIA0278	Potenziamento reticolo fognario in Via Dante Alighieri, Via della Pace	FOGNATURA	Castellarano	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0279	Collettamento Agglomerato Cà Guidetti (ARE0856)	FOGNATURA	Casalgrande	300.000	0	0	0	12.678	0	12.678	12.678	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nell'annualità 2023
2021REIA0280	Adeguamento collettore fognario in Via Crispi	FOGNATURA	Poviglio	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0281	Adeguamento reticolo fognario in Via Papa Giovanni XXIII	FOGNATURA	Ventasso	60.000	0	0	0	5.024	0	5.024	5.024	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nell'annualità 2023
2021REIA0282	Adeguamento reticolo fognario in Via Costa	FOGNATURA	Novellara	125.000	0	0	0	12.577	0	12.577	12.577	100%	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nell'annualità 2023
2021REIA0283	Adeguamento reticolo fognario in Via Caduti delle Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0284	Potenziamento collettore fognario in Via Pellizzi	FOGNATURA	Reggio Emilia	350.000	0	0	0	32.540	0	32.540	32.540	100%	Progettazione definitiva conclusa: in attesa autorizzazione in deroga per parallelismo linea ferroviaria FER
2021REIA0285	Realizzazione collegamento fognario in Via Cavallotti	FOGNATURA	Reggio Emilia	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0286	Realizzazione collegamento fognario in Via Boschi	FOGNATURA	Castelnovo Monti	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2021REIA0287	Rifacimento condotto scolmatore in Via Roma	FOGNATURA	Castelnovo Monti	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0288	Realizzazione collegamento fognario in Via Bacchi	FOGNATURA	Brescello	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	ACQUEDOTTO	Canossa	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0290	Sostituzione rete di di distribuzione acqua in Via Gorganza e Via dell'Industria	ACQUEDOTTO	Cavriago	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021REIA0291	Ristrutturazione edile e adeguamento sismico Centrale idrica Via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2022REIA0292	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Villa Minozzo per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Villaminazzo	80.000	0	80.000	80.000	84.416	0	84.416	4.416	5%	
2022REIA0293	Realizzazione di Impianto fotovoltaico in copertura da 126 kWp in autoconsumo presso la Centrale Idrica di Salvaterra	ACQUEDOTTO	Casalgrande	175.000	120.000	0	120.000	147.550	0	147.550	27.550	22%	Cantiere in corso: si prevede il completamento e l'entrata in esercizio nella primavera 2023. I maggiori costi sono dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime
2023REIA0294	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0	0%	
					<b>Importo netto pianificato 2022</b>	<b>Finanziamenti pubblici pianificati 2022</b>	<b>Importo lordo pianificato 2022</b>	<b>Investimento gestore consuntivo 2022</b>	<b>Finanziamenti pubblici consuntivo 2022</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2022</b>	<b>Valore consuntivo lordo - pianificato lordo</b>	<b>PERCENTUALE INVESTIMENTI CONSUNTIVATI RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO esclusi investimenti di struttura</b>	
<b>Importo Totale</b>					<b>23.967.686</b>	<b>800.060</b>	<b>24.767.746</b>	<b>33.105.958</b>	<b>1.900.942</b>	<b>35.006.900</b>	<b>10.239.154</b>		
<b>Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura</b>					<b>22.007.283</b>	<b>800.060</b>	<b>22.807.343</b>	<b>29.288.425</b>	<b>1.899.896</b>	<b>31.188.322</b>	<b>8.380.979</b>	<b>137%</b>	



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia  
F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante  
F.to Marialuisa Campani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 27 novembre 2023

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna
