

CLFC/2015/7 del 4 dicembre 2015

CONSIGLIO LOCALE DI FORLI' - CESENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo
2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

IL COORDINATORE
F.to Carlo Battistini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CLFC/2015/7

CONSIGLIO LOCALE DI FORLÌ - CESENA

L'anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 9.30 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale convocato dal Coordinatore con lettera PG AT/2015/8361 del 22 novembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BAGNO DI ROMAGNA	Gabrielli Simone	Assessore	SI	1,5724
BERTINORO	Zaccarelli Nevio	Sindaco	SI	2,5384
BORGHI			NO	0,8634
CASTROCARO T. e TERRA del SOLE	Sanzani William	ViceSindaco	SI	1,6499
CESENA	Battistini Carlo	ViceSindaco	SI	20,1987
CESENATICO			NO	5,5679
CIVITELLA di ROMAGNA			NO	1,0861
DOVADOLA	Carnaccini Marco	Assessore	SI	0,6443
FORLÌ	Zaccarelli Nevio	Assessore	SI	24,4368
FORLIMPOPOLI	Peperoni Gian Matteo	Assessore	SI	2,9912
GALEATA	Scalzulli Potito	Assessore	SI	0,8216
GAMBETTOLA	Battistini Eugenio	Assessore	SI	2,4223
GATTEO	Candoli Daniele	Assessore	SI	2,1470
LONGIANO	Sarpieri Widmer	Assessore	SI	1,7173
MELDOLA	Cicognani Vittorio	Assessore	SI	2,3730
MERCATO SARACENO	Casali Luciano	ViceSindaco	SI	1,7505
MODIGLIANA			NO	1,2797
MONTIANO			NO	0,6526
PORTICO e SAN BENEDETTO			NO	0,4594
PREDAPPIO			NO	1,6514
PREMILCUORE	Menghetti Marco	Sindaco	SI	0,4665
ROCCA SAN CASCIANO			NO	0,7146
RONCOFREDDO			NO	1,0038
SAN MAURO PASCOLI	Ricci Azzurra	Assessore	SI	2,5990
SANTA SOFIA	Anagni Tommaso	Sindaco	SI	1,1692
SARSINA			NO	1,0467
SAVIGNANO sul RUBICONE	Bertozzi Natascia	Assessore	SI	3,9321
SOGLIANO al RUBICONE	Zamagni Loredana	Assessore	NO	0,9739
TREDOZIO			NO	0,5610
VERGHERETO			NO	0,7092
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA			NO	10,0000

Presenti n. 18 pari a quote 74,40
Assenti n. 13 pari a quote 25,60

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 2 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Forlì-Cesena è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"*;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;

- C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
- D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;

e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 2 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Forlì-Cesena relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

con voti a favore n. 14 (quote 64,00), astenuti n. 4 (quote 10,40 – Comuni di Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone);

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 2 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Forlì-Cesena relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2014
GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: FORLÌ CESENA

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì Cesena n. 02 del 25 Marzo 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 Agosto 2015 (prot. PG/2015/0005672) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. PG/2015/0004968).

		PIANIFICATO 2014	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 10'537'000	€ 1'538'040	€ 12'075'040
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1'315'000	-€ 1'136'827	€ 178'173
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 9'222'000	€ 2'674'867	€ 11'896'867
CONTO TERZI	Importo Pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 1'583'000	-€ 895'273	€ 687'727
TOTALI	TOTALE PIANIFICATO GESTORE + CONTRIBUTI + ALTRI INVESTITORI	€ 12'120'000	€ 642'767	€ 12'762'767

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

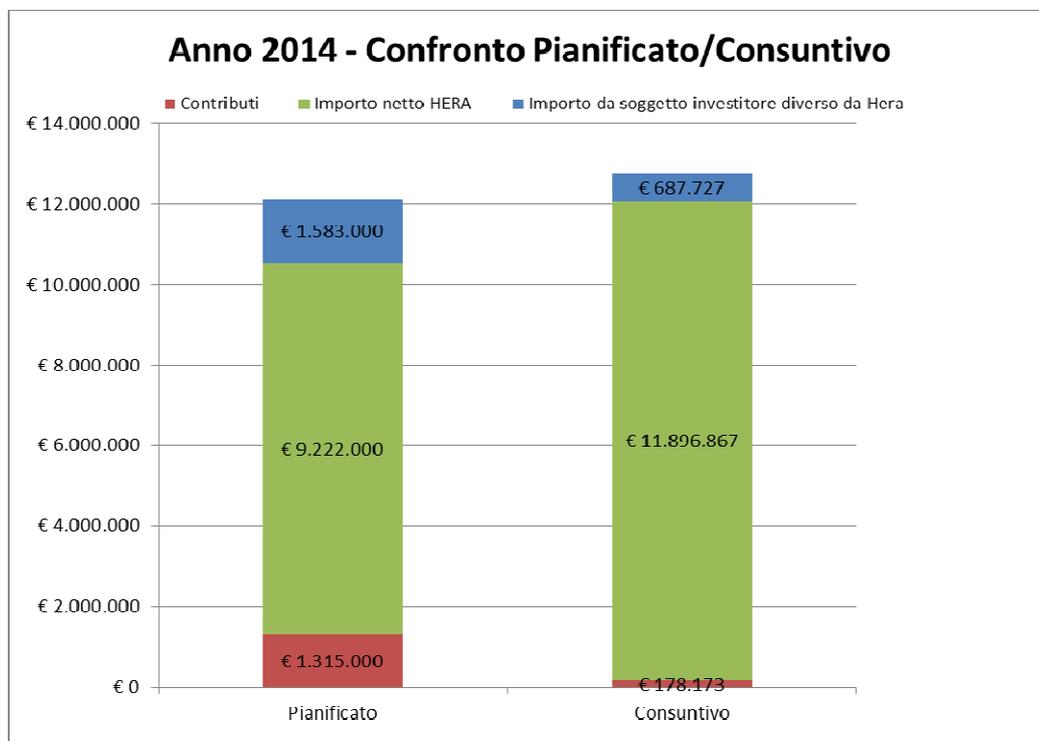


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014: 104

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 90

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	27	€ 0	€ 793'000	3	2014FCHA0113 2014FCHA0038 2014FCHA0055
2	Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	3	€ 12'557	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	10	€ 326'517	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	54	€ 8'377'726	€ 7'399'000	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	23	€ 4'045'968	€ 3'928'000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 27 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3); per 3 tra questi interventi le giustificazioni, che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento dei progetti, non sono state ritenute esaustive e per tal motivo ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto agli 90 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 60% di questi (54 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

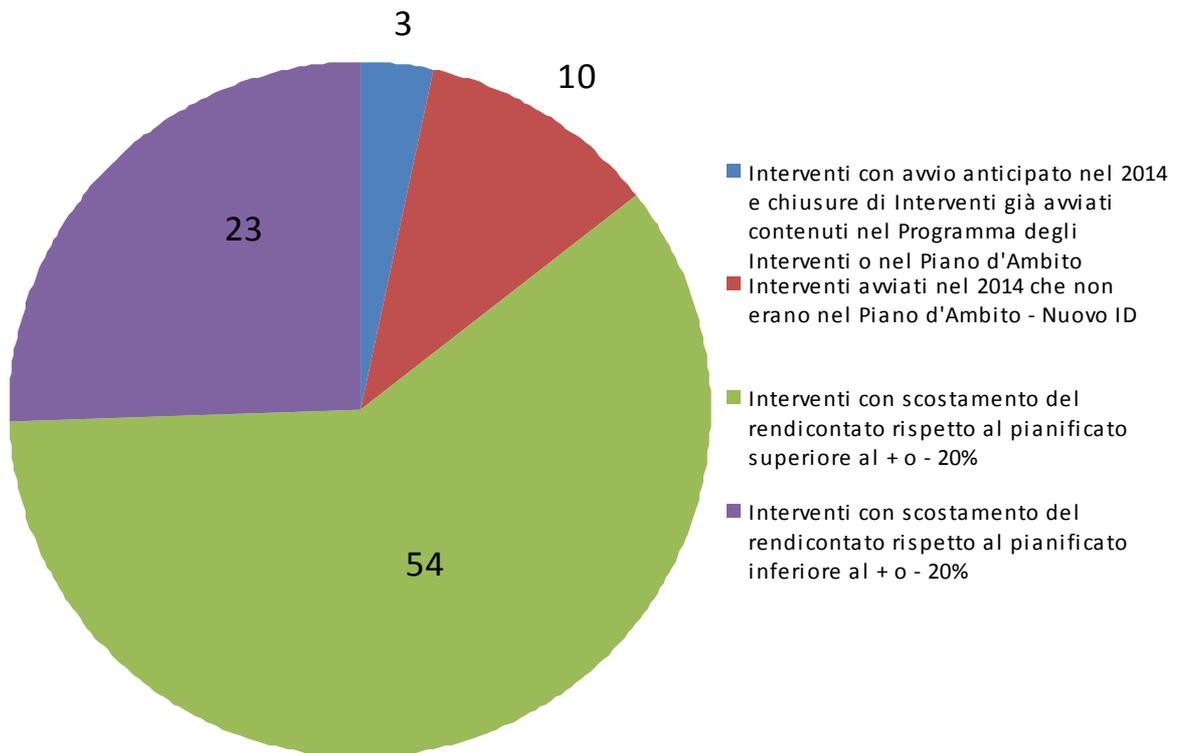


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione.)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto
2014FCHA0008	ACQUEDOTTO	RIFAC. CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA - GESTORE	Bertinoro	GESTORE HERA	20'000
2014FCHA0090	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	150'000
2014FCHA0022	ACQUEDOTTO	BON. RETE ALL. V.FANTAGUZZI	Cesena	GESTORE HERA	55'000
2014FCHA0023	ACQUEDOTTO	BON.RETE E ALL. V.AMBUGI - CESENA	Cesena	GESTORE HERA	55'000
2014FCHA0074	ACQUEDOTTO	RINN RETE X FRANA PIAN DI SPINO-MELDOLA	Meldola	GESTORE HERA	30'000
2014FCHA0002	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.CASELLINA	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	30'000
2014FCHA0120	FOGNATURA	RISAN.SC.1-2-3-15-16-17-18-33 VERGHERETO	Verghereto	GESTORE HERA	10'000
2014FCHA0122	FOGNATURA	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	Verghereto	GESTORE HERA	10'000
2014FCHA0113	FOGNATURA	RIS. SC. 3 SARSINA - SOLL. + PREMENTE	Sarsina	GESTORE HERA	5'000
2014FCHA0071	FOGNATURA	NUOVA RETE FOG NERA V.CORBARI GATTEO	Gatteo	GESTORE HERA	6'000
2014FCHA0037	FOGNATURA	RINN RETE FOG V.CALCINARO CESENA	Cesena	GESTORE HERA	2'000
2014FCHA0043	FOGNATURA	NUOVA RETE MISTA V.SQUERO-SUCCI-SEMPRINI	Cesenatico	GESTORE HERA	5'000
2014FCHA0109	FOGNATURA	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	Santa Sofia	GESTORE HERA	10'000
2014FCHA0038	FOGNATURA	STUDIO PRELIMINARE CESUOLA	Cesena	GESTORE HERA	10'000
2014FCHA0055	DEPURAZIONE	ADEG. SOLL. S. BARTOLO - V. BOLOGNA	Forlì	GESTORE HERA	5'000
2014FCHA0056	DEPURAZIONE	ADEG. SOLL. S. MARINO 1A - V. BOLOGNA	Forlì	GESTORE HERA	5'000
2014FCHA0116	DEPURAZIONE	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	Savignano sul Rubicone	GESTORE HERA	5'000
2014FCHA0028	ACQUEDOTTO	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	Cesena	IPOTESI	10'000
2014FCHA0014	ACQUEDOTTO	POTEN.RETEACQ.SMARIANUOVOALOTTO3PROVINCIA	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	15'000
2014FCHA0088	ACQUEDOTTO	POT RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE *	50'000
2014FCHA0105	FOGNATURA	RIS.SCARICO 6 - VIA VALLE - FRAZ.SANTA P	Roncofreddo	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	5'000
2014FCHA0017	FOGNATURA	RIS.SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA,BERTINORO	Bertinoro	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	200'000
2014FCHA0064	FOGNATURA	RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STRAL	Forlì	IPOTESI	10'000
2014FCHA0039	FOGNATURA	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	Cesena	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	35'000
2014FCHA0106	FOGNATURA	RISAN.SC.1-2-4-5-21, RONCOFREDDO-COMPL.	Roncofreddo	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	5'000
2014FCHA0018	FOGNATURA	RISAN.SC.36-37-38 E POT.ACQUA, BERTINORO	Bertinoro	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	20'000
2014FCHA0021	FOGNATURA	BORGHI-TRIBOLA-STRADONE	Borghi	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	30'000

793'000

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO 1

HERA SpA - DIREZIONE ACQUA
Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 8 Forlì Cesena

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FCHA0091	FOGNATURA	ST. PREL. RISANAM. FOSSI TOMBINATI AMBITO FORLI'	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0117	FOGNATURA	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	Sogliano al Rubicone	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0008	ACQUEDOTTO	RIFAC. CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA - GESTORE	Bertinoro	GESTORE HERA	20.000		20.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF.
2014FCHA0009	ACQUEDOTTO	RIFAC. CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA - R. ACQUE	Bertinoro	IPOTESI ROMAGNA ACQUE				0	0	0	#DIV/0!	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO DIVENTATO C/TO HERA COME DA ACCORDI CON RASDF. L'INTERVENTO VERRÀ REALIZZATO COMPLETAMENTE DA HERA MEDIANTE L'ID 2014FCHA0008. INIZIALMENTE L'INTERVENTO ERA INFATTI DIVISO IN PARTE CARICO HERA E IN PARTE CARICO RASDF. ACCORPATI IMPORTI PIANIFICATI NELL'ID 2014FCHA0008.
2014FCHA0083	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	880.000		880.000	1.057.791	0	1.057.791	20%	
2014FCHA0084	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	805.000		805.000	990.170	0	990.170	23%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0085	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	275.000		275.000	214.423	0	214.423	-22%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0086	ACQUEDOTTO	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	280.000		280.000	395.625	0	395.625	41%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0087	ACQUEDOTTO	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000		50.000	46.964	0	46.964	-6%	
2014FCHA0092	FOGNATURA	MANUT.STRA.RETI/ALL. FOGNATURA - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	453.000		453.000	563.541	0	563.541	24%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0093	FOGNATURA	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000		50.000	44.367	0	44.367	-11%	
2014FCHA0094	FOGNATURA	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	250.000		250.000	253.522	0	253.522	1%	
2014FCHA0089	DEPURAZIONE	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	650.000		650.000	776.472	0	776.472	19%	
2014FCHA0090	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE - FC	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	150.000		150.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014FCHA0022	ACQUEDOTTO	BON. RETE ALL. V.FANTAGUZZI	Cesena	GESTORE HERA	55.000		55.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 LEGATO A LAVORI DEL COMUNE (RIQUALIFICAZIONE)
2014FCHA0102	ACQUEDOTTO	SPOST.RETE A SP3-FOSSO DELLE CAMINATE	Premilcuore	GESTORE HERA	40.000		40.000	15.908	0	15.908	-60%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014FCHA0044	ACQUEDOTTO	RINN.RETE PER DISSESTO FRANOSO-GIAGGIOLO	Civitella	GESTORE HERA	30.000		30.000	24.305	0	24.305	-19%	INTERVENTO TERMINATO.
2014FCHA0050	ACQUEDOTTO	RINN RETE E ALL.ACQUA V.PALAZZOLA FORLI'	Forlì	GESTORE HERA	40.000		40.000	76.921	0	76.921	92%	MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0023	ACQUEDOTTO	BON.RETE E ALL. V.AMBUGI - CESENA	Cesena	GESTORE HERA	55.000		55.000	0	0	0	-100%	EFFETTUATO STUDIO DI FATTIBILITÀ CHE HA MESSO IN EVIDENZA CHE L'INTERVENTO NON RISULTA AD OGGI ESSERE PRIORITARIO. L'INTERVENTO E' STATO OPPORTUNAMENTE RIPROGRAMMATO AL 2016.
2014FCHA0024	ACQUEDOTTO	BON.RETE ALL.VMACRELLI CORB.COMAN.CESENA	Cesena	GESTORE HERA	80.000		80.000	35.211	0	35.211	-56%	POSTICIPATA PARTE DEL LAVORO AL 2015 PER COMPLESSITÀ PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE
2014FCHA0074	ACQUEDOTTO	RINN RETE X FRANA PIAN DI SPINO-MELDOLA	Meldola	GESTORE HERA	30.000		30.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO TERMINATO. UNA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO E' STATA ESEGUITA NELLE PASSATE ANNUALITÀ. L'IMPORTO APPOSTATO PER IL 2014 NON E' STATO UTILIZZATO IN QUANTO SULLA BASE DELLE VERIFICHE TECNICHE NON SI E' RICONTRATA LA NECESSITÀ DI UN ULTERIORE STRALCIO DI INTERVENTO.
2014FCHA0001	ACQUEDOTTO	MAGNANA BAGNO DI ROMAGNA-ASSE3	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	10.000	-94.000	-84.000	28.494	0	28.494	185%	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0080	ACQUEDOTTO	MONTE ZALU MODIGLIANA-ASSE3	Modigliana	GESTORE HERA	30.000	-84.000	-54.000	43.103	0	43.103	44%	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0075	ACQUEDOTTO	CEPPARETO MELDOLA-ASSE3	Meldola	GESTORE HERA	5.000	-46.000	-41.000	8.427	0	8.427	69%	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0119	ACQUEDOTTO	CAPANNE VERGHERETO-ASSE3	Verghereto	GESTORE HERA	51.000	-56.000	-5.000	69.477	0	69.477	36%	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0002	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.CASELLINA	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	30.000		30.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO POICHE' SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE HANNO RISOLTO LA CRITICITÀ
2014FCHA0051	ACQUEDOTTO	RINN PENSILE VILLA SELVA FORLI'	Forlì	GESTORE HERA	100.000		100.000	172.659	0	172.659	73%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI COSTI DOVUTI IN CORSO D'OPERA ALLA NECESSARIA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA DI ACCUMULO E AL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA TORRE PIEZOMETRICA. MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA DOVUTI AL NOLO DELLA PIATTAFORMA RICHIESTA DAL CSE (SU PRESCRIZIONI DEI VVFF) PER TUTTO IL PERIODO DELLA LAVORAZIONE IN QUOTA.
2014FCHA0099	ACQUEDOTTO	BONIF. RETE IDR V.SANZIO PREDAPPIO	Predappio	GESTORE HERA	50.000		50.000	42.882	0	42.882	-14%	
2014FCHA0025	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O LOC.PIEVESISTINA	Cesena	GESTORE HERA	3.000		3.000	13.493	0	13.493	350%	MAGGIORI ONERI IN FASE PROGETTUALE. L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO CONCOMITANTE E LEGATO AGLI INTERVENTI ACQUE E FOGNATURA CON ID 2014FCHA0028 E 2014FCHA0039 SU PIEVESISTINA
2014FCHA0052	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO SERBATOIO SADURANO FORLI'	Forlì	GESTORE HERA	14.000	-82.000	-68.000	9.212	-91.706	-82.494	-34%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0003	ACQUEDOTTO	RINNOVO CONDOTTA SERB.SCOPELO BAGNO R.	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	15.000	-100.000	-85.000	26.552	-86.467	-59.915	77%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0019	ACQUEDOTTO	REALIZ. CENTRALE POMP. LOC.FORANO BORGHI	Borgli	GESTORE HERA		-49.000	-49.000	566	0	566	#DIV/0!	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0020	ACQUEDOTTO	REALIZ.CENTRALE STRADONE M.REGGIANO	Borgli	GESTORE HERA	100.000		100.000	93.299	0	93.299	-7%	
2014FCHA0103	ACQUEDOTTO	NUOVO SERB. MONTE DELLE VACCHE	Roncofreddo	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0026	ACQUEDOTTO	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	Cesena	GESTORE HERA	5.000		5.000	9.885	0	9.885	98%	L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO CONCOMITANTE ALL'INTERVENTO DI RISANAMENTO FOGNARIO CON ID 2014FCHA0031 A PIOPPA CALABRINA
2014FCHA0067	ACQUEDOTTO	POT RETE H2O V.SOPRARIROSSA GAMBETTOLA	Gambettola	GESTORE HERA	5.000		5.000	1.957	0	1.957	-61%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO PER RICHIESTA INTEGRAZIONI CONSORZIO DI BONIFICA. PROGETTAZIONE CONCOMITANTE CON INTERVENTO FOGNARIO.
2014FCHA0027	ACQUEDOTTO	RINN.RETE AC - V. ACQUAROLA CESENA	Cesena	GESTORE HERA	65.000		65.000	52.711	0	52.711	-19%	INTERVENTO TERMINATO.
2014FCHA0045	ACQUEDOTTO	RINN. RETE AC - VIA CARINI CIVITELLA	Civitella	GESTORE HERA	50.000		50.000	35.734	0	35.734	-29%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014FCHA0107	ACQUEDOTTO	RINN. RETE H2O VIA G.LORCA	San Mauro Pascoli	GESTORE HERA	45.000		45.000	738	0	738	-98%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 LEGATO A LAVORI DEL COMUNE (RIQUALIFICAZIONE)
2014FCHA0046	ACQUEDOTTO	RINN.RETE ACQUA V.TREGGIOLO	Dovadola	GESTORE HERA	110.000		110.000	75.844	0	75.844	-31%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014FCHA0082	ACQUEDOTTO	RIN.RETE ALL.GALILEI-MARCONI-VOLTA-DAVIN	Montiano	GESTORE HERA	45.000		45.000	39.323	0	39.323	-13%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.
2014FCHA0081	FOGNATURA	ADEG. COLLET. MODIGLIANA E DEP. 2° LOTTO	Modigliana	GESTORE HERA	165.000		165.000	109.880	0	109.880	-33%	MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0076	FOGNATURA	ADEG.POTENZ.IMHOFF TEODORANO-SC6<2000AE	Meldola	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0004	FOGNATURA	RISAN . SC. 6-8-41 - LOC.ACQUAPARTITA:	Bagno di Romagna	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0005	FOGNATURA	RISAN.SC 4-5-7-9-B.ROMAGNA-LOC.VARIE	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	10.000		10.000	9.715	0	9.715	-3%	
2014FCHA0032	FOGNATURA	RISAN.SC.163 - V. DE CESARI FRAZ.BULGARN	Cesena	GESTORE HERA	2.000	-54.000	-52.000	8.208	0	8.208	310%	INTERVENTO TERMINATO. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0112	FOGNATURA	RISAN. SCARICO 6 - SORBANO LOC. MOLINO	Sarsina	GESTORE HERA	50.000		50.000	56.974	0	56.974	14%	
2014FCHA0120	FOGNATURA	RISAN.SC.1-2-3-15-16-17-18-33 VERGHERETO	Verghereto	GESTORE HERA	10.000		10.000	0	0	0	-100%	EFFETTUATO STUDIO DI FATTIBILITÀ CHE HA MESSO IN EVIDENZA CHE L'INTERVENTO NON RISULTA AD OGGI ESSERE PRIORITARIO. RIPROGRAMMATO NELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE.
2014FCHA0121	FOGNATURA	RISAN. SC. 7 - FRAZ. ALFERO	Verghereto	GESTORE HERA	10.000		10.000	5.414	0	5.414	-46%	PROGETTAZIONE SOSPESA PERCHÉ SI È RESO NECESSARIO PROCEDERE, INSIEME A CARTOGRAFIA, AD UNA PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AGGLOMERATO DA SOTTOPORRE ALLA PROVINCIA.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FCHA0122	FOGNATURA	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	Verghereto	GESTORE HERA	10.000		10.000	0	0	0	-100%	EFFETTUATO STUDIO DI FATTIBILITA' CHE HA MESSO IN EVIDENZA CHE L'INTERVENTO NON RISULTA AD OGGI ESSERE PRIORITARIO.
2014FCHA0042	FOGNATURA	POTENZ.SOLL.S9-ADEG. Q.E.-MIS.PORTATA	Cesenatico	GESTORE HERA	80.000	-338.000	-258.000	54.647	0	54.647	-32%	RIPROGRAMMATO NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014FCHA0033	FOGNATURA	RISAN. SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	Cesena	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0047	FOGNATURA	RIS. SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	Dovadola	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0058	FOGNATURA	RISAN SC 222 CARPINELLO - V. B. DA DURA	Forli	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0059	FOGNATURA	SOLL.FOGLN. VILLAFRANCA - V. 13 NOVEMBRE	Forli	GESTORE HERA	10.000		10.000	1.748	0	1.748	-83%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO PER L'ESIGENZA DI ESEGUIRE VERIFICHE SUL SISTEMA FOGNARIO ESISTENTE.
2014FCHA0006	FOGNATURA	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	Bagno di Romagna	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0016	FOGNATURA	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	Bertinoro	GESTORE HERA	5.000		5.000	2.251	0	2.251	-55%	LIEVE RITARDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2014FCHA0060	FOGNATURA	RISAN. SC 211-212 LOC. MARATELLO -V.MOND	Forli	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0034	FOGNATURA	RISANAMENTO SCARICO 50-55-136-137-138 AG	Cesena	GESTORE HERA	10.000	-218.000	-208.000	21.975	0	21.975	120%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA. MANCATO INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FCHA0068	FOGNATURA	SCARICO 2 VIA SOPRANOSSA GAMBETTOLA	Gambettola	GESTORE HERA	5.000		5.000	16.622	0	16.622	232%	MAGGIORI ONERI IN FASE PROGETTUALE.
2014FCHA0069	FOGNATURA	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE GAMBETTOLA	Gambettola	GESTORE HERA				11.149	0	11.149	#DIV/0!	ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AL 2014.
2014FCHA0070	FOGNATURA	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	Gambettola	GESTORE HERA				842	0	842	#DIV/0!	ANTICIPO PROGETTAZIONE LEGATO A RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI GAMBETTOLA.
2014FCHA0048	FOGNATURA	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12 DOVADOLA 1'STR	Dovadola	GESTORE HERA	62.000		62.000	9.652	0	9.652	-84%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014FCHA0049	FOGNATURA	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2'ST	Dovadola	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0061	FOGNATURA	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	Forli	GESTORE HERA	15.000		15.000	9.964	0	9.964	-34%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE PER IL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALL'INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE AUSL.
2014FCHA0113	FOGNATURA	RIS. SC. 3 SARSINA - SOLL. + PREMENTE	Sarsina	GESTORE HERA	5.000		5.000	0	0	0	-100%	PROGETTAZIONE RIPROGRAMMATA AL 2015 A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITA' INTERVENTI
2014FCHA0114	FOGNATURA	RIS. SC.2: DEVIAZIONE RETE SC 2, SARSINA	Sarsina	GESTORE HERA	25.000		25.000	5.334	0	5.334	-79%	RITARDI NELL'ITER PROGETTUALE AUTORIZZATIVO.
2014FCHA0062	FOGNATURA	POTENZ. SOLLEVAMENTO GORIZIA, FORLI	Forli	GESTORE HERA	95.000		95.000	55.902	0	55.902	-41%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0007	FOGNATURA	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	Bagno di Romagna	GESTORE HERA	10.000		10.000	2.089	0	2.089	-79%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' LEGATE A LOCALIZZAZIONE AREA IMPIANTO PER PRESENZA FRANE.
2014FCHA0063	FOGNATURA	RINN RETE FOGNA V.PALAZZOLA FORLI'	Forli	GESTORE HERA	146.000		146.000	182.891	0	182.891	25%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2014 COME DA PIANO. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0071	FOGNATURA	NUOVA RETE FOG NERA V.CORBARI GATTEO	Gatteo	GESTORE HERA	6.000		6.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014FCHA0035	FOGNATURA	RISAN. SCARICO 87 AIE TIPANO (RETE-ALL)	Cesena	GESTORE HERA	60.000		60.000	92.571	0	92.571	54%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER INTERVENTO, RICHIESTO DAL COMUNE, DI RIPRISTINO BANCHINE STRADALI IN STABILIZZATO.
2014FCHA0072	FOGNATURA	NUOVA RETE FOGN.N.V.GIOVANNI23 GATTEO	Gatteo	GESTORE HERA	200.000		200.000	124.985	0	124.985	-38%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0073	FOGNATURA	NUOVA RETE FOG NERA V.ALLENDE GATTEO	Gatteo	GESTORE HERA	15.000		15.000	8.227	0	8.227	-45%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0036	FOGNATURA	POTENZ. SOLL. E DORSALE S. GIORGIO	Cesena	GESTORE HERA	240.000		240.000	10.212	0	10.212	-96%	RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO STRETTAMENTE LEGATO AL NUOVO ITER AUTORIZZATIVO INTRODOTTO DALL' ART.158BIS DEL DLGS 152/2006
2014FCHA0037	FOGNATURA	RINN RETE FOG V.CALCINARO CESENA	Cesena	GESTORE HERA	2.000		2.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO L'INTERVENTO E' STATO RICOMPRESO NEL PROGETTO DEL RISANAMENTO DI PIEVESISTINA (ID 2014FCHA0039) FINANZIATO DA ROMAGNA ACQUE.
2014FCHA0043	FOGNATURA	NUOVA RETE MISTA V.SQUERO-SUCCI-SEMPRINI	Cesenatico	GESTORE HERA	5.000		5.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO IN SEGUITO ALLE VERIFICHE ESEGUITE NON SUSSISTE ALCUN TIPO DI CRITICITA' SUL SISTEMA.
2014FCHA0077	FOGNATURA	RIFAC. ATTRAVERS. FOG. RIO PARA MELDOLA	Meldola	GESTORE HERA	10.000		10.000	827	0	827	-92%	INTERVENTO POSTICIPATO PER SOPRAVVENUTE CRITICITA' CHE HANNO COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI PREVISTI. ATTUALMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE, PREVISTA REALIZZAZIONE NEL 2015-2016
2014FCHA0109	FOGNATURA	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	Santa Sofia	GESTORE HERA	10.000		10.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO IN SEGUITO ALLE VERIFICHE ESEGUITE NON SUSSISTE ALCUN TIPO DI CRITICITA' SUL SISTEMA.
2014FCHA0066	FOGNATURA	REALIZZ.FOGLNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	Forlimpopoli	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0095	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0038	FOGNATURA	STUDIO PRELIMINARE CESUOLA	Cesena	GESTORE HERA	10.000		10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN QUANTO E' IN CORSO RACCOLTA DATI PER STUDIO PRELIMINARE
2014FCHA0029	DEPURAZIONE	ADEG. DEP CESENA - SEDIM SECONDO - 2° STRA	Cesena	GESTORE HERA	15.000		15.000	14.909	0	14.909	-1%	
2014FCHA0041	DEPURAZIONE	RISAN. SC.D1 - ADEG. DEP.CESENATICO	Cesenatico	GESTORE HERA	2.385.000		2.385.000	4.168.000	0	4.168.000	75%	ANTICIPATE LAVORAZIONI PIANIFICATE NEL 2015.
2014FCHA0115	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. DI SAVIGNANO - COMPLET. LINEA	Savignano sul Rubicone	GESTORE HERA	870.000	-194.000	676.000	822.988	0	822.988	-5%	
2014FCHA0053	DEPURAZIONE	RISAN . SC. D1 FORLI - POTENZ. SEDIM -	Forli	GESTORE HERA	325.000		325.000	62.207	0	62.207	-81%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0118	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. TREDOZIO - DISINFEZIONE	Tredozio	GESTORE HERA	10.000		10.000	17.339	0	17.339	73%	IN SEDE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (2014) SI È RESA NECESSARIA LA RIVISITAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO; RISPETTO ALL'INTERVENTO DELIBERATO IN DAL22/2014 SI E' INCLUSO ANCHE L'ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI SEDIMENTAZIONE
2014FCHA0110	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. SARSINA - DISINFEZIONE	Sarsina	GESTORE HERA	25.000		25.000	27.885	0	27.885	12%	
2014FCHA0054	FOGNATURA	POT.SOLL.FOGLNA CARPENNA-V.REDEFOSSI 6A	Forli	GESTORE HERA	15.000		15.000	3.812	0	3.812	-75%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DEGLI APPROFONDIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI RESISI NECESSARI.
2014FCHA0055	DEPURAZIONE	ADEG. SOLL. S. BAROLO - V. BOLOGNA	Forli	GESTORE HERA	5.000		5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO PER APPROFONDIMENTO IN CORSO SULLA SOLUZIONE TECNICA PIU' APPROPRIATA DA ADOTTARE.
2014FCHA0056	DEPURAZIONE	ADEG. SOLL. S. MARINO 1A - V. BOLOGNA	Forli	GESTORE HERA	5.000		5.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO. IL SOLLEVAMENTO RISULTA GIA' ADEGUATO. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014FCHA0104	DEPURAZIONE	CONSOLIDAMENTO AREA DEP. DIOLAGUARDIA	Roncofreddo	GESTORE HERA	178.000		178.000	118.101	0	118.101	-34%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2014 COME DA PIANO. NEL 2015 PREVISTO RESIDUO CONTABILE. IMPORTO CONSUNTIVO LEGGERMENTE INFERIORE ALL'IMPORTO PIANIFICATO PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0078	DEPURAZIONE	ADEG. DEPURATORE BACCIOLINO DISINFEZIONE	Mercato Saraceno	GESTORE HERA	100.000		100.000	97.083	0	97.083	-3%	
2014FCHA0116	DEPURAZIONE	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	Savignano sul Rubicone	GESTORE HERA	5.000		5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO. INIZIO PROGETTAZIONE NEL 2015 E REALIZZAZIONE ANTICIPATA RISPETTO A TEMPISTICA PREVISTA NEL PIANO 2014-2017.
2014FCHA0108	DEPURAZIONE	ADEG. DEPURATORE SANTA SOFIA DISINFEZ.	Santa Sofia	GESTORE HERA	230.000		230.000	287.620	0	287.620	25%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER INTERVENTI ACCESSORI RESISI NECESSARI IN CORSO D'OPERA.
2014FCHA0057	DEPURAZIONE	ADEGUAM. DEPURATORE PIEVEQUINTA	Forli	GESTORE HERA	50.000		50.000	19.905	0	19.905	-60%	INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL RADDOPPIO DELLE LINEE DI TRATTAMENTO.
2014FCHA0101	FOGNATURA	ADEG.AREA ED IMP.SOLL.EX DEP.PREDAPPIO	Predappio	GESTORE HERA	50.000		50.000	16.638	0	16.638	-67%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PROGRAMMATO.
2014FCHA0111	DEPURAZIONE	ADEG. CAP. E SPOST. SC 7 SARSINA (IMHOFF)	Sarsina	GESTORE HERA	40.000		40.000	33.543	0	33.543	-16%	
2014FCHA0079	DEPURAZIONE	DISM. DEP. BORGO STECCHI MERCATO SAR.	Mercato Saraceno	GESTORE HERA	10.000		10.000	8.760	0	8.760	-12%	
2014FCHA0030	DEPURAZIONE	IMP. FITODEPURAZIONE BAGNILE	Cesena	GESTORE HERA	10.000		10.000	28.081	0	28.081	181%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2015. LO SCOSTAMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO COMPLESSIVO E' RICONDUCEBILE A PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE AUTORIZZATIVA DAL PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVALENTEMENTE IN RELAZIONE AI RIPRISTINI
2014FCHA0100	ACQUEDOTTO	LOC.FIUMANA-POTEN.RETE ACQUA	Predappio	ROMAGNA ACQUE	277.000			63.405	0	63.405	-77%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE (RILASCIO PRATICA SISMICA).
2014FCHA0028	ACQUEDOTTO	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	Cesena	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	10.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI LEGATI ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF.
2014FCHA0010	ACQUEDOTTO	POT. RETE ACQUEDOTTO DI S.MARIA L1 A	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	55.000			41.109	0	41.109	-25%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0011	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO RETE ACQU DI S.MARI TRA.B	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	10.000			5.829	0	5.829	-42%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.
2014FCHA0012	ACQUEDOTTO	POTEN.RETEACQ S MARIANOVA-LOTTO2	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	10.000			9.447	0	9.447	-6%	

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FCHA0013	ACQUEDOTTO	POTEN.RETEACQ.SMARIANUOVALOTTO3	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	15.000			18.468		18.468	23%	MAGGIORI ONERI PER RIPRISTINO ASFALTI.
2014FCHA0014	ACQUEDOTTO	POTEN.RETEACQ.SMARIANUOVALOTTO3PROVINCIA	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	15.000			0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO TUTTO L'INTERVENTO È STATO ACCORPATO ALL'ID 2014FCHA0013. INIZIALMENTE L'INTERVENTO ERA PREVISTO SDOPPIATO IN 2 STRALCI DISTINTI (ID ATERSIR 2014FCHA0013 E 2014FCHA0014) IN QUANTO DOVEVA ESSERCI UN'ANTICIPAZIONE DI UNO STRALCIO IN CONCOMITANZA AD INTERVENTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE CHE NON VERRANNO PERÒ PIÙ REALIZZATI.
2014FCHA0015	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	Bertinoro	ROMAGNA ACQUE	8.000			3.672	0	3.672	-54%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI LEGATI ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF.
2014FCHA0088	ACQUEDOTTO	POT RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE *	50.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF (ROMAGNA ACQUE)
2014FCHA0096	FOGNATURA	POTEN.SOLLEV.CESOLINO 2S-IMP	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE	511.000			428.700	0	428.700	-16%	
2014FCHA0097	FOGNATURA	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - I*	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE	10.000			11.930	0	11.930	19%	
2014FCHA0105	FOGNATURA	RIS.SCARICO 6 - VIA VALLE - FRAZ.SANTA P	Roncofreddo	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	5.000			0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO TRASFORMATO IN INTERVENTO A CARICO DEL GESTORE COME DA ACCORDI CON RASDF. IN OCCASIONE DEL NUOVO PIANO 2015-2018 E' STATA RICHIESTA LA CREAZIONE DI NUOVO ID SPECIFICO.
2014FCHA0017	FOGNATURA	RIS.SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA,BERTINORO	Bertinoro	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	200.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF (ROMAGNA ACQUE)
2014FCHA0064	FOGNATURA	RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STRAL	Forlì	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	10.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF.
2014FCHA0039	FOGNATURA	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	Cesena	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	35.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF CON UN INCREMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA LEGATI PREVALENTEMENTE ALLA MODIFICA DEL PERCORSO DELLA CONDOTTA, IMPOSTO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADE.
2014FCHA0040	FOGNATURA	RISANAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA UBER	Cesena	ROMAGNA ACQUE	50.000			26.744	0	26.744	-47%	POSTICIPATO AL 2015 PARTE DEL LAVORO PIANIFICATO NEL 2014.
2014FCHA0065	FOGNATURA	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITÀ BO	Forlì	ROMAGNA ACQUE				0	0	0	#DIV/0!	
2014FCHA0106	FOGNATURA	RISAN.SC.1-2-4-5-21, RONCOFREDDO-COMPL	Roncofreddo	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	5.000			0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO TRASFORMATO IN INTERVENTO A CARICO DEL GESTORE. IN OCCASIONE DEL NUOVO PIANO 2015-2018 E' STATA RICHIESTA LA CREAZIONE DI NUOVO ID SPECIFICO.
2014FCHA0018	FOGNATURA	RISAN.SC.36-37-38 E POT.ACQUA, BERTINORO	Bertinoro	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	20.000			0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF (ROMAGNA ACQUE)
2014FCHA0021	FOGNATURA	BORGHI-TRIBOLA-STRADONE	Borghesi	IPOTESI ROMAGNA ACQUE	30.000			0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO TRASFORMATO IN INTERVENTO A CARICO DEL GESTORE COME DA ACCORDI CON RASDF.
2014FCHA0098	FOGNATURA	COLL. REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE *	200.000			12.769	0	12.769	-94%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF (ROMAGNA ACQUE)
2014FCHA0031	DEPURAZIONE	RISANAMENTO LOCALITÀ PLOPPA-CALABRINA	Cesena	ROMAGNA ACQUE	57.000			65.655	0	65.655	15%	
2014FCHA0123	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - ATO 8	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	147.828	0	147.828	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014FCHA0124	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETE ACQUA COLLINELLO	Bertinoro	GESTORE HERA	0	0	0	1.494	0	1.494	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Intervento sulla rete acquedottistica concomitante all'intervento di risanamento scarico a Polenta-Colonnello ID 2014FCHA0018. I costi 2014 sono relativi alle attività di progettazione.
2014FCHA0126	ACQUEDOTTO	VERIF. E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQUEDOTTO ATO 8	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	10.860	0	10.860	#DIV/0!	CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI - Interventi per la verifiche e le successive opere per l'adeguamento alla normativa sismica dei serbatoi pensili esistenti e necessari al servizio.
2014FCHA0127	FOGNATURA	RISANAMENTO FOGNATURA SORBANO (SOLO LINEA)	Sarsina	GESTORE HERA	0	0	0	6.014	0	6.014	#DIV/0!	CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 8 ante 2014 (ID 40051) ed è stato concluso nel 2014.
2014FCHA0128	FOGNATURA	RISANAMENTO SCARICO 26 FRAZIONE S. CRISTOFORO	Cesena	GESTORE HERA	0	0	0	1.637	0	1.637	#DIV/0!	CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 8 ante 2014 (ID 51009) ed è stato concluso nel 2014.
2014FCHA0129	FOGNATURA	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO DOVADOLA	Dovadola	GESTORE HERA	0	0	0	2.041	0	2.041	#DIV/0!	CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: Modellazione per individuazione soluzioni per risanamento scarichi
2014FCHA0130	DEPURAZIONE	TRATTAMENTO ODORI-DEP FORLI	Forlì	GESTORE HERA	0	0	0	102.678	0	102.678	#DIV/0!	CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 8 ante 2014 (ID 40060).
2014FCHA0134	ACQUEDOTTO	POTENZ. RETE V.ANTOLINA SAVIGNANO R.	Savignano sul Rubicone	GESTORE HERA	0	0	0	32.431	0	32.431	#DIV/0!	CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI
2014FCHA0131	ACQUEDOTTO	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQUEDOTTO - ATO 8	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	8.328	0	8.328	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Tali interventi sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria impianti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014FCHA0132	FOGNATURA	RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI - ATO 8	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi.
2014FCHA0133	FOGNATURA	REGOLARIZZAZIONE SCOLMATORI MERCATO SARACENO	Mercato Saraceno	GESTORE HERA	0	0	0	13.206	0	13.206	#DIV/0!	CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI . Interventi sugli scolmatori per la corretto esercizio delle reti fognarie
					12.120.000	-1.315.000	9.222.000	12.762.768	-178.173	12.584.595		
					11.863.000							
					12.120.000	-1.315.000	9.222.000	12.762.768	-178.173	12.584.595		

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Carlo Battistini

Il segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 04 gennaio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
