

CLPC/2022/11 del 15 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi
2020 – 2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE
F.to Franco Albertini

CLPC/2022/11

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

L'anno **2022** il giorno **15** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011263 del 09/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Risultano presenti all'appello:

| Comune | Cognome e Nome | Qualifica | Presenti | Quote |
|--------------------|------------------|-----------|----------|--------|
| AGAZZANO | | | | 0,7586 |
| ALSENO | | | | 1,5304 |
| ALTA VAL TIDONE | Franco Albertini | Sindaco | SI | 1,0225 |
| BESENZONE | | | | 0,4630 |
| BETTOLA | Paolo Negri | Sindaco | SI | 0,9358 |
| BOBBIO | | | | 1,1649 |
| BORGONOVO | | | | 2,4771 |
| CADEO | Marco Bricconi | Assessore | SI | 1,8990 |
| CALENDASCO | | | | 0,8816 |
| CAORSO | | | SI | 1,5335 |
| CARPANETO | Arfani Andrea | Sindaco | SI | 2,3681 |
| CASTEL S. GIOVANNI | Massimo Bollati | Assessore | SI | 4,2090 |
| CASTELL'ARQUATO | Giuseppe Bersani | Sindaco | SI | 1,4996 |
| CASTELVETRO P.NO | Luca Quintavalla | Sindaco | SI | 1,6893 |
| CERIGNALE | | | | 0,2290 |
| COLI | | | | 0,4305 |
| CORTEBRUGNATELLA | | | | 0,3474 |
| CORTEMAGGIORE | Luigi Merli | Sindaco | SI | 1,5247 |
| FARINI | | | | 0,5004 |
| FERRIERE | Carlotta Oppizzi | Sindaco | SI | 0,5138 |
| FIORENZUOLA D'ARDA | Romeo Gandolfi | Sindaco | SI | 4,4361 |

| Comune | Cognome e Nome | Qualifica | Presenti | Quote |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| GAZZOLA | Simone Maserati | Sindaco | SI | 0,7937 |
| GOSSOLENGO | Andrea Balestrieri | Sindaco | SI | 1,8234 |
| GRAGNANO T.SE | Patrizia Calza | Sindaco | SI | 1,4879 |
| GROPPARELLO | Armando Piazza | Sindaco | SI | 0,7977 |
| LUGAGNANO | Antonio Vincini | Sindaco | SI | 1,3004 |
| MONTICELLI D'ONG. | Gimmi Distante | Sindaco | SI | 1,6437 |
| MORFASSO | Paolo Calestani | Sindaco | SI | 0,4453 |
| OTTONE | Maria Lucia Girometta | Vice Sindaco | SI | 0,3221 |
| PIACENZA | Matteo Bongiorno | Assessore | SI | 29,5559 |
| PIANELLO | | | | 0,8148 |
| PIOZZANO | Lorenzo Burgazzoli | Sindaco | SI | 0,3611 |
| PODENZANO | Alessandro Piva | Sindaco | SI | 2,7892 |
| PONTE DELL'OLIO | Gabriele Valla | Assessore | SI | 1,5084 |
| PONTENURE | Fagnoni Angela | Vice Sindaco | SI | 2,0585 |
| RIVERGARO | | | | 2,1969 |
| ROTTOFRENO | | | | 3,6832 |
| S. GIORGIO P.NO | Donatella Alberoni | Sindaco | SI | 1,7932 |
| S. PIETRO IN CERRO | Luigi Galelli | Assessore | SI | 0,4216 |
| SARMATO | Claudia Ferrari | Sindaco | SI | 1,0342 |
| TRAVO | Lodovico Albasi | Sindaco | SI | 0,8102 |
| VERNASCA | Giuseppe Sidoli | Sindaco | SI | 0,7666 |
| VIGOLZONE | | | | 1,3932 |
| VILLANOVA | Romano Freddi | Sindaco | SI | 0,6764 |
| ZERBA | | | | |
| ZIANO | | | | 0,8924 |
| PROVINCIA di PIACENZA | | | | 10,0000 |

Presenti n. 29 quote 70,49 Assenti n. 18 quote 29,51

Riconosciuta la validità della seduta Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione del Consiglio d'ambito n.3 del 15 marzo 2018 per il Gestore IRETI S.p.A. è stata approvata la revisione straordinaria annualità 2018-2019 Programma Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 3 del 15 marzo 2018;
- con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 30 aprile 2020 è stata approvata la revisione straordinaria delle annualità 2020-2021 e 2022 e approvazione annualità 2023;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
 - la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022 e dalla CAMB 84/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, **palesi ed unanimi**

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Irete S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 11 del 15 novembre 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi – 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 15 novembre 2022

Il Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: IRETI S.p.a.
BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

| | PIANIFICATO 2021 | CONSUNTIVO 2021 | DIFFERENZA | DIFF. % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| GESTORE | 17.772.478,00 | 24.414.661,70 | +6.642.183,70 | 137% |
| SOCIETÀTERZE | // | // | // | 0% |
| FINANZIAMENTI PUBBLICI | 2.099.285,00 | 753.002,33 | -1.346.282,67 | 36% |
| TOTALE | 19.871.763,00 | 25.167.664,03 | +5.295.901,03 | 127% |

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 ammontano ad €. 1.232.819,62. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 137% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato del 36%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 127%.

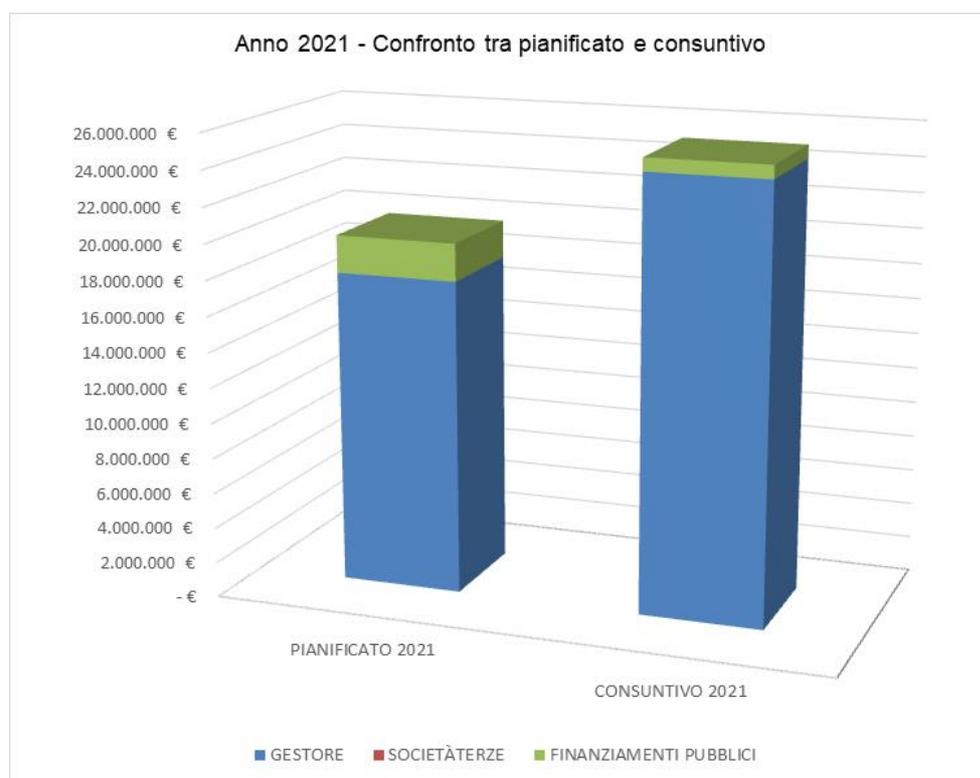


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

I minori contributi incassati sono riferiti al mancato avvio dei lavori di adeguamento degli impianti acquedottistici ai valori limite del cromo, di seguito elencati.

| Codice | Titolo | Comuni | Importo progettuale |
|---------------|---|------------------|----------------------------|
| 2018PCIE0230 | Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione | Bobbio | 190.000,00 |
| 2018PCIE0231 | Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale | Bobbio | 170.000,00 |
| 2018PCIE0232 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli | Cortebrugnatella | 215.000,00 |
| 2018PCIE0233 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli | Cortebrugnatella | 135.000,00 |
| 2018PCIE0234 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18 | Cerignale | 210.000,00 |
| 2018PCIE0235 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane | Cerignale | 165.000,00 |
| 2018PCIE0236 | Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata | Cerignale | 215.000,00 |
| 2018PCIE0237 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi | Coli | 210.000,00 |
| 2018PCIE0238 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra | Coli | 150.000,00 |
| 2018PCIE0239 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie | Coli | 175.000,00 |
| 2018PCIE0241 | Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta | Farini | 160.000,00 |
| 2018PCIE0242 | Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni | Ferriere | 925.000,00 |
| 2018PCIE0243 | Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone | Ferriere | 165.000,00 |
| 2018PCIE0244 | Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie | Ferriere | 215.000,00 |
| 2018PCIE0245 | Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra | Ferriere | 175.000,00 |

| Codice | Titolo | Comuni | Importo progettuale |
|---------------|---|---------------|----------------------------|
| 2018PCIE0247 | Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sermadasco | Ferriere | 210.000,00 |
| 2018PCIE0252 | Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione | Coli | 160.000,00 |
| 2018PCIE0254 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | Farini | 145.000,00 |
| 2018PCIE0257 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | Farini | 165.000,00 |
| TOTALE | | | 4.155.000,00 |

TAB.2 – Interventi non attuati, con contributi non incassati, relativi all'adeguamento ai limiti del cromo.

Mediante un accordo con la Regione Emilia Romagna, l'importo sopra indicato andrà a finanziare i seguenti titoli, già presenti nel Programma Operativo degli Interventi:

| Codice | Titolo | Comuni |
|---------------|---|---|
| 2018PCIE0260 | 2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) | Nibbiano |
| 2018PCIE0262 | 2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) | Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano |
| 2020PCIE0317 | Collegamento Roncaglia - Caorso | Caorso |
| 2015PCIE0085 | Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento Calendasco-Sarmato-Castel San Giovanni-Borgonovo-Rottofreno | Calendasco-Sarmato-Castel San Giovanni-Borgonovo-Rottofreno |

TAB.3 – Interventi finanziati in sostituzione di quelli della TAB. 2.

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

1. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

| | PIANIFICATO 2021 | CONSUNTIVO 2021 | DIFFERENZA | DIFF. % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| ACQUEDOTTO | 8.614.213,00 | 15.209.779,13 | 6.595.566,13 | 177% |
| DEPURAZIONE | 8.740.050,00 | 4.835.637,35 | -3.904.412,65 | 55% |
| FOGNATURA | 1.867.500,00 | 4.093.125,36 | 2.225.625,36 | 219% |
| ACQUE METEORICHE | 150.000 | 0 | -150.000,00 | 0% |
| TUTTI | 500.000,00 | 1.029.122,19 | 529.122,19 | 206% |
| TOTALE | 19.871.763,00 | 25.167.664,03 | 5.295.901,63 | 127% |

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

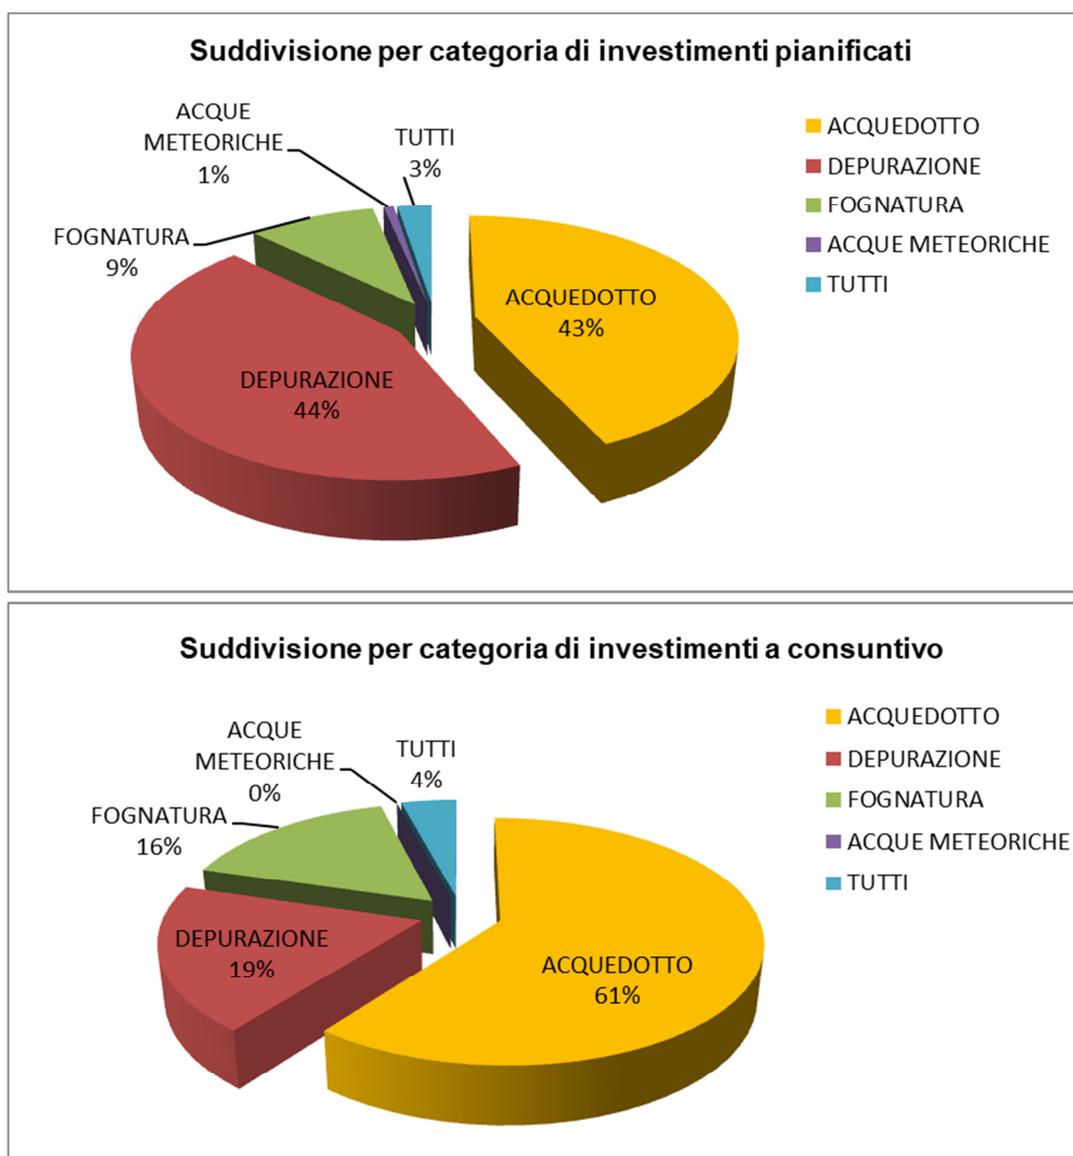


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

| | PIANIFICATO 2021 | CONSUNTIVO 2021 | DIFFERENZA | DIFF % |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| ACQUEDOTTO | 2.500.000 | 7.870.159,96 | 5.370.159,96 | 315% |
| DEPURAZIONE | 1.000.000 | 1.746.621,67 | 746.621,67 | 175% |
| FOGNATURA | 1.100.000 | 3.401.316,72 | 2.301.316,72 | 309% |
| ACQUE METEORICHE | 150.000 | 0 | -150.000,00 | 0% |
| TOTALE | 4.750.000 | 13.018.098,35 | 8.268.098,35 | 274% |

TAB.5 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non sono emerse criticità.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

| | N. | PIANIFICATO 2021 | CONSUNTIVO 2021 | DIFFERENZA | DIFF. % |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Fino a 500.000 € | 146 | 1.981.250 | 2.943.059,94 | 961.809,94 | 149% |
| 500.001-1.000.000 € | 32 | 3.566.250 | 1.377.197,63 | -2.189.052,37 | 39% |
| 1.000.001-2.000.000 € | 22 | 3.920.050 | 2.755.307,45 | -1.164.742,55 | 70% |
| 2.000.001-5.000.000 € | 9 | 2.995.000 | 1.888.309,76 | -1.106.690,24 | 63% |
| Oltre 5.000.000 € | 1 | 0 | 88.806,65 | 88.806,65 | 100% |
| Manutenzioni e titoli cumulativi | 19 | 7.409.213 | 16.114.982,60 | 8.705.769,60 | 217% |
| TOTALE | 229 | 19.871.763 | 25.167.664,03 | 5.295.901,03 | 127% |

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;

- Mancata attuazione di interventi legati all'adeguamento degli impianti di trattamento ai limiti del cromo;
- Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche ed al miglioramento del macroindicatore M4;
- Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 90

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2021: 131.

| | NUMERO INTERVENTI | IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021 | IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021 |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%) | 30 | 1.602.000 | 0 |
| Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%) | 71 | 0 | 3.908.290,02 |
| Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20% | 55 | 16.620.550 | 19.626.646,37 |
| Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20% | 5 | 2.885.890 | 2.865.547,26 |

TAB.7 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

2. INTERVENTI NON AVVIATI

| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Tipo Investimento | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 |
|----|--------------|---|----------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2014PCIE0011 | G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff. | D | Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere | Gestore | 1.750.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | 2015PCIE0134 | Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione | A | Sarmato | Gestore | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3 | 2018PCIE0230 | Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione | A | Bobbio | Gestore | 190.000,00 | 38.000,00 |
| 4 | 2018PCIE0231 | Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale | A | Bobbio | Gestore | 170.000,00 | 34.000,00 |
| 5 | 2018PCIE0232 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli | A | Cortebrugnatella | Gestore | 215.000,00 | 43.000,00 |
| 6 | 2018PCIE0233 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli | A | Cortebrugnatella | Gestore | 135.000,00 | 27.000,00 |
| 7 | 2018PCIE0234 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18 | A | Cerignale | Gestore | 210.000,00 | 42.000,00 |
| 8 | 2018PCIE0235 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane | A | Cerignale | Gestore | 165.000,00 | 33.000,00 |
| 9 | 2018PCIE0236 | Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata | A | Cerignale | Gestore | 215.000,00 | 43.000,00 |
| 10 | 2018PCIE0237 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi | A | Coli | Gestore | 210.000,00 | 42.000,00 |
| 11 | 2018PCIE0238 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra | A | Coli | Gestore | 150.000,00 | 30.000,00 |

| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Tipo Investimento | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 |
|----|---------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 12 | 2018PCIE0239 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie | A | Coli | Gestore | 175.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | 2018PCIE0241 | Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta | A | Farini | Gestore | 160.000,00 | 32.000,00 |
| 14 | 2018PCIE0242 | Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni | A | Ferriere | Gestore | 925.000,00 | 185.000,00 |
| 15 | 2018PCIE0243 | Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone | A | Ferriere | Gestore | 165.000,00 | 33.000,00 |
| 16 | 2018PCIE0244 | Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie | A | Ferriere | Gestore | 215.000,00 | 43.000,00 |
| 17 | 2018PCIE0245 | Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra | A | Ferriere | Gestore | 175.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 2018PCIE0247 | Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sermadasco | A | Ferriere | Gestore | 210.000,00 | 42.000,00 |
| 19 | 2018PCIE0252 | Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione | A | Coli | Gestore | 160.000,00 | 32.000,00 |
| 20 | 2018PCIE0254 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | A | Farini | Gestore | 145.000,00 | 29.000,00 |
| 21 | 2018PCIE0257 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | A | Farini | Gestore | 165.000,00 | 33.000,00 |
| 22 | 2018PCIE0292 | CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi | A | Opere pluricomunali | Gestore | 300.000,00 | 50.000,00 |

| | Codice | Titolo | Ser- vizio | Comuni | Tipo In- vesti- mento | Importo pro- gettuale | Importo lor- do pianifica- to 2021 |
|----|---------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 23 | 2020PCIE0318 | Manutenzione straordinaria acque meteoriche | F | Opere pluricomunali | Gestore | | 150.000,00 |
| 24 | 2020PCIE0320 | Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario) | F | Opere pluricomunali | Gestore | | 100.000,00 |
| 25 | 2020PCIE0329 | Studi di fattibilità e modellazioni | TUT- TI | Opere pluricomunali | Gestore | | 50.000,00 |
| 26 | 2020PCIE0341 | Sostituzione rete idrica in Via Nespi | A | Gragnano Trebbiense | Gestore | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 27 | 2021PCIE0342 | Rifacimento Collettore Fognario in Loc Capannette di Pej | F | Zerba | Gestore | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28 | 2021PCIE0345 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola | A | Fiorenzuola | Gestore | 190.000,00 | 10.000,00 |
| 29 | 2021PCIE0346 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato- | A | Castell'Arquato | Gestore | 160.000,00 | 10.000,00 |

| | Codice | Titolo | Ser- vizio | Comuni | Tipo In- vesti- mento | Importo pro- gettuale | Importo lor- do pianifica- to 2021 |
|----|---------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30 | 2021PCIE0348 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni . Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni | A | Castel San Giovanni | Gestore | 75.000 | 10.000 |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|----|--------------|---|----------|---|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 1 | 2014PCIE0001 | 203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari | D | Vernasca | 115.000,00 | - | - | - | 2.759,80 | - | 2.759,80 | 2.759,80 | 100 | Progettazione in corso. Il ritardo nella realizzazione dell'opera è determinato dalla necessità di approfondire alcune possibili criticità legate alla soluzione progettuale da adottare. |
| 2 | 2014PCIE0002 | E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al depuratore del capoluogo. | D | Borgonovo Val Tidone | 1.500.000,00 | - | - | - | 29.077,36 | - | 29.077,36 | 29.077,36 | 100 | Costi di progettazione. E' necessario, prima di realizzare le opere, completare la progettazione con le necessarie verifiche di compatibilità idraulica dell'impianto. |
| 3 | 2014PCIE0004 | G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza - Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi | A | Grandi opere, Piacenza | 5.300.000,00 | - | - | - | 88.806,65 | - | 88.806,65 | 88.806,65 | 100 | Opere di completamento: opere a verde, sistemazione piazzale, gruppo elettrogeno |
| 4 | 2014PCIE0005 | G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO | A | Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello | 2.600.000,00 | - | - | - | 48.656,42 | - | 48.656,42 | 48.656,42 | 100 | Coda lavori per asfalti, sistemazione serbatoio Mocomero per messa in servizio definitiva |
| 5 | 2014PCIE0007 | G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: TRAVO-GAZZOLA: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano e collegamento a Rezzanello (BOFFALORA) (più collegamento Boffalora - Paderna) | A | Gazzola, Travo, Grandi opere, Piozzano | 1.180.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2014PCIE0008 | G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara. | A | Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone | 1.000.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 289.007,31 | - | 289.007,31 | 239.007,31 | 478 | Realizzati interventi in base alle necessità. Sorgenti Fabbrica e Toveraia (Ottone), sorgenti Camminata e Ballerini (Cortebrugnatella), sorgente Cornareto (Cerignale), sorgente Vezzolacca (Vernasca) |
| 7 | 2014PCIE0010 | G20080012 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano | D | Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, Grandi opere | 1.740.000,00 | 29.000,00 | - | 29.000,00 | 478.742,68 | - | 478.742,68 | 449.742,68 | 1550 | Lavori in corso. Intervento pianificato nell'annualità precedente. |
| 8 | 2014PCIE0011 | G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff. | D | Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere | 1.750.000,00 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - 150.000,00 | -100 | Lavori posticipati in attesa dell'adeguamento del depuratore di Castelvetro |
| 9 | 2014PCIE0012 | G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano. | F | Grandi opere, Podenzano, Vigolzone | 160.851,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2014PCIE0013 | G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi | D | Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone | 1.000.000,00 | 307.500,00 | - | 307.500,00 | 8.452,79 | - | 8.452,79 | - 299.047,21 | -97 | Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere ed alla difficoltà di affidamento delle opere. |
| 11 | 2014PCIE0014 | G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi | D | Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone | 800.000,00 | 239.000,00 | - | 239.000,00 | 56.524,86 | - | 56.524,86 | - 182.475,14 | -76 | Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere ed alla difficoltà di affidamento delle opere. |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|----|--------------|--|----------|--|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 12 | 2014PCIE0015 | G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006). | D | Grandi opere, Castel San Giovanni | 3.512.000,00 | - | - | - | 8.974,27 | - | 8.974,27 | 8.974,27 | 100 | Costi dovuti alla necessità di completare i pagamenti legati alla fornitura delle membrane, che nello specifico riguardavano la formazione del personale. |
| 13 | 2014PCIE0016 | G20080018 -Collettamento loc. Trezzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso | F | Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone | 1.000.000,00 | 312.500,00 | - | 312.500,00 | 21.311,80 | - | 21.311,80 | - 291.188,20 | -93 | Difficoltà di acquisizione delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione delle opere. |
| 14 | 2014PCIE0017 | G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff. | D | Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 2014PCIE0018 | G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure. | D | Grandi opere, Pontenure | 847.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 2014PCIE0019 | G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estensione rete loc.Caminata | F | Grandi opere, Coli | 1.158.201,00 | - | - | - | 704,46 | - | 704,46 | 704,46 | 100 | Necessità di approfondimento di alcuni aspetti funzionali dell'impianto di depurazione che di fatto hanno ritardato il completamento delle opere accessorie dell'area dell'impianto e della strada di accesso al medesimo. |
| 17 | 2014PCIE0020 | G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO | D | Ziano Piacentino, Grandi opere | 1.000.000,00 | 297.500,00 | - | 297.500,00 | 34.649,61 | - | 34.649,61 | - 262.850,39 | -88 | Il ritardo nella realizzazione è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere. |
| 18 | 2014PCIE0021 | G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti. | D | Bobbio | 980.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 7.800,17 | - | 7.800,17 | - 92.199,83 | -92 | Il ritardo nella realizzazione dell'opera è stato determinato da cause esterne (situazione economica mondiale, conflitto) che stanno influenzando l'esecuzione dei lavori dalla fine del 2021. L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile. |
| 19 | 2014PCIE0024 | G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servizi e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore | D | Rottofreno, Grandi opere, Calendasco | 1.750.000,00 | - | - | - | 6.720,68 | - | 6.720,68 | 6.720,68 | 100 | In fase di completamento rilascio dei permessi di esecuzione opere e adeguamento progetto esecutivo |
| 20 | 2014PCIE0030 | P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio | D | San Giorgio Piacentino | 1.300.000,00 | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 133,43 | - | 133,43 | - 299.866,57 | -99 | Il ritardo nella realizzazione dell'opera è stato determinato da cause esterne (situazione economica mondiale, conflitto) che stanno influenzando l'esecuzione dei lavori dalla fine del 2021. L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile. |
| 21 | 2014PCIE0032 | P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST. | D | Agazzano | 1.200.000,00 | 339.000,00 | 140.055,00 | 198.945,00 | 626.283,56 | - | 626.283,56 | 287.283,56 | 84 | Lavori in corso. Intervento pianificato nell'annualità precedente. |
| 22 | 2014PCIE0033 | P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia | D | Cadeo | 1.100.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 866,79 | - | 866,79 | - 199.133,21 | -99 | Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di raggiungere gli accordi bonari per l'acquisizione dell'area su cui realizzare il potenziamento dell'impianto di depurazione. |
| 23 | 2014PCIE0035 | P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore. | D | Bobbio | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 2014PCIE0036 | P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda. | F | Cadeo | 200.000,00 | - | - | - | 168.853,06 | - | 168.853,06 | 168.853,06 | 100 | Intervento pianificato negli anni precedenti ed eseguito nel 2021 |
| 25 | 2014PCIE0039 | P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi | D | Gazzola | 1.040.000,00 | 410.800,00 | 90.154,00 | 320.646,00 | 81.728,47 | - | 81.728,47 | - 329.071,53 | - 80 | Costi di progettazione. Ritardo dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere. |
| 26 | 2014PCIE0041 | P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo | D | Pecorara, Alta Val Tidone | 1.500.000,00 | 771.250,00 | - | 771.250,00 | 9.328,32 | - | 9.328,32 | - 761.921,68 | - 98 | Accordi bonari in corso di definizione. Progettazione in corso alla luce dei risultati delle indagini geologiche. Ritardo dovuto alla difficoltà di individuare un'adeguata soluzione progettuale che risulti compatibile con le condizioni geomorfologiche e di dissesto delle aree individuate per la realizzazione dell'impianto di depurazione |
| 27 | 2014PCIE0042 | P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud | D | Pecorara, Alta Val Tidone | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.334,22 | - | 1.334,22 | 1.334,22 | 100 | Costi per sopralluoghi |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|----|--------------|--|----------|--|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|------|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 28 | 2014PCIE0044 | P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e zona Ovest Capoluogo | A | Pontenure | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 2014PCIE0047 | P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto | D | Castell'Arquato | 100.000,00 | - | - | - | 41.225,64 | - | 41.225,64 | 41.225,64 | 100 | Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021 |
| 30 | 2014PCIE0048 | P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete. | F | Podenzano | 100.000,00 | - | - | - | 112.632,91 | - | 112.632,91 | 112.632,91 | 100 | Lavori in corso dall'anno precedente |
| 31 | 2014PCIE0053 | P2011001 - Impianto di telegestione depuratori. | D | Opere pluricomunali | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 1.267,09 | - | 1.267,09 | - 48.732,91 | - 97 | Non si sono manifestate esigenze nel corso dell'anno |
| 32 | 2014PCIE0057 | P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo. | F | Monticelli d'Ognina | 160.000,00 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 126.551,72 | - | 126.551,72 | 46.551,72 | 58 | Intervento pianificato nel 2020 e 2021 ma realizzato nel 2021. Manca AUA |
| 33 | 2014PCIE0059 | P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo. | D | Travo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 18.541,08 | - | 18.541,08 | - 31.458,92 | - 62 | Costi di progettazione |
| 34 | 2014PCIE0060 | P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5 | D | Ziano Piacentino | 900.000,00 | 403.750,00 | - | 403.750,00 | 63.713,64 | - | 63.713,64 | - 340.036,36 | - 84 | Costi di progettazione. Il ritardo nella realizzazione è dovuto al prolungarsi della conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di esecuzione opere. |
| 35 | 2014PCIE0063 | P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo. | D | Gossolengo | 1.700.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 11.821,01 | - | 11.821,01 | - 38.178,99 | - 76 | Costi di progettazione |
| 36 | 2014PCIE0065 | P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza. | F | Piacenza | 800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 2014PCIE0071 | P2014012/P2014025 - CASTELL'ARQUATO - Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo (loc. Rastella); SAN GIORGIO - Realizzazione nuovo impianto di dep. di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera; VILLANOVA - Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata acquedotto e fognatura. | TUTTI | Caorso, Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Villanova sull'Arda, Coli, Farini, Ferriere, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 368.256,67 | - | 368.256,67 | 168.256,67 | 84 | Lavori in corso e terminati nel 2021 a Sant'Agata. In corso la progettazione esecutiva di San Lorenzo e Centovera che avranno inizio nel 2022. |
| 38 | 2014PCIE0072 | Cartografia | TUTTI | Opere pluricomunali | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 306.456,38 | - | 306.456,38 | 106.456,38 | 53 | Maggiori costi dovuti a campagna di rilevamento della rete di canali di Piacenza città come autorizzato da ATERSIR. |
| 39 | 2015PCIE0075 | P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocase | A | Monticelli d'Ognina | 260.000,00 | - | - | - | 365,58 | - | 365,58 | 365,58 | 100 | Coda di lavori per opere elettriche |
| 40 | 2015PCIE0084 | Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIOREZZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO | A | Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello | 800.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 3.894,77 | - | 3.894,77 | - 96.105,23 | - 96 | Mancato raggiungimento accordi con proprietario terreni limitrofi ad area demaniale |
| 41 | 2015PCIE0085 | Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO-Cattagnina | A | Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco | 900.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 63.657,02 | - | 63.657,02 | - 36.342,98 | - 36 | Costi per progettazione inferiori rispetto alle previsioni |
| 42 | 2015PCIE0087 | Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano | D | Grandi opere, Podenzano, Vigolzone | 1.742.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 571,80 | - | 571,80 | - 99.428,20 | - 99 | Progettazione in corso. |
| 43 | 2015PCIE0088 | G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora | D | Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Grandi opere | 1.275.000,00 | 420.000,00 | - | 420.000,00 | 368.409,01 | - | 368.409,01 | - 51.590,99 | - 12 | |
| 44 | 2015PCIE0089 | Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte | D | Grandi opere, Piacenza | 3.000.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 81.511,41 | - | 81.511,41 | - 118.488,59 | - 59 | Costi di progettazione |
| 45 | 2015PCIE0090 | Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2. PIACENZA | D | Grandi opere, Piacenza | 440.000,00 | - | - | - | 8.321,67 | - | 8.321,67 | 8.321,67 | 100 | Anticipato costi per analisi preliminare intervento |
| 46 | 2015PCIE0092 | Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con contributo | D | Alseno | 500.000,00 | 21.250,00 | - | 21.250,00 | 1.476,50 | - | 1.476,50 | - 19.773,50 | - 93 | CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100% |
| 47 | 2015PCIE0094 | Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica | A | Besenzone | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|----|--------------|--|----------|------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 48 | 2015PCIE0099 | Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana | F | Borgonovo Val Tidone | 70.000,00 | - | - | - | 157.720,81 | - | 157.720,81 | 157.720,81 | 100 | Lavori in corso. Intervento pianificato annualità precedenti. |
| 49 | 2015PCIE0100 | Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia) | F | Cadeo | 500.000,00 | - | - | - | 17.843,75 | - | 17.843,75 | 17.843,75 | 100 | Realizzati allacciamenti ENEL per impianti sollevamento |
| 50 | 2015PCIE0101 | Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco | F | Calendasco | 100.000,00 | - | - | - | 3.883,39 | - | 3.883,39 | 3.883,39 | 100 | Ritardo a causa ottenimento autorizzazioni da parte di privati. Costi per servitù. Lavori in corso nel 2022 |
| 51 | 2015PCIE0103 | Sistemazione rete fognaria via Marconi | F | Castell'Arquato | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 2015PCIE0104 | Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi | A | Castell'Arquato | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 2015PCIE0106 | Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli | A | Castel San Giovanni | 335.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 2015PCIE0108 | Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO | F | Castelvetro Piacentino | 700.000,00 | - | - | - | 3.718,26 | - | 3.718,26 | 3.718,26 | 100 | Anticipato costi per progettazione in corso |
| 55 | 2015PCIE0111 | Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione | D | Cortemaggiore | 700.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 49.313,96 | - | 49.313,96 | - 50.686,04 | - 50 | Costi per progettazione opera. In linea con pianificazione |
| 56 | 2015PCIE0112 | Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi | D | Cortemaggiore | 500.000,00 | - | - | - | 8.574,81 | - | 8.574,81 | 8.574,81 | 100 | Anticipato costi per analisi preliminare intervento |
| 57 | 2015PCIE0115 | Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica | F | Fiorenzuola | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 2015PCIE0117 | Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto | D | Gazzola | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 2015PCIE0122 | Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo) | A | Monticelli d'Ognina | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 2015PCIE0123 | Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda | F | Monticelli d'Ognina | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 2015PCIE0125 | Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane) | D | Ottone | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 2015PCIE0126 | Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio | F | Podenzano | 1.200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 30.595,87 | - | 30.595,87 | - 169.404,13 | - 84 | Progettazione in corso. Ritardo dovuto all'uso promiscuo del condotto esistente (irrigazione e fognatura) e alla difficoltà di individuare una soluzione condivisa con il Consorzio di Bonifica. |
| 63 | 2015PCIE0128 | Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio | D | Ponte dell'Olio | 1.000.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 1.573,61 | - | 1.573,61 | - 198.426,39 | - 99 | Progettazione in corso. |
| 64 | 2015PCIE0129 | Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo - studio fattibilità e avvio intervento | A | Pontenure | 110.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 2015PCIE0130 | Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami | D | Pontenure | 190.000,00 | - | - | - | 4.356,70 | - | 4.356,70 | 4.356,70 | 100 | Avviata progettazione. Necessità di approfondire alcune possibili criticità legate alla soluzione progettuale da adottare. |
| 66 | 2015PCIE0132 | Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio | D | San Giorgio Piacentino | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 2015PCIE0134 | Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione | A | Sarmato | 61.000,00 | 61.000,00 | - | 61.000,00 | - | - | - | - 61.000,00 | - 100 | Lo studio approntato 8 anni fa prevedeva di ampliare due tubazioni su strade comunali derivandole dalla rete presente sulla strada Statale. L'opera serviva per alimentare 4 capannoni privati + night club. Progetto sempre rimandato |
| 68 | 2015PCIE0135 | Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità | F | Travo | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | 2015PCIE0137 | Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi | A | Travo | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 2015PCIE0138 | Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca | A | Vernasca | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 2015PCIE0139 | Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognario | D | Vernasca | 800.000,00 | 406.000,00 | - | 406.000,00 | 75.767,04 | - | 75.767,04 | - 330.232,96 | - 81 | Difficoltà legate all'acquisizione dei terreni ed all'avvio della CdS |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|----|--------------|---|----------|--|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 72 | 2016PCIE0152 | Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità | A | Bettola | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 2016PCIE0153 | Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio | A | Podenzano | 1.865.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 2016PCIE0154 | Completamento rete fognaria in loc. Bassano. | F | Rivergaro | 70.000,00 | - | - | - | 1.290,20 | - | 1.290,20 | 1.290,20 | 100 | Costi per sopralluoghi. Ritardo dovuto a problemi di acquisizione area impianto di sollevamento subordinata al raggiungimento di un accordo tra privato e Amministrazione Comunale. |
| 75 | 2016PCIE0155 | Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini | A | Grandi opere, Farini | 216.000,00 | - | - | - | 40.762,11 | - | 40.762,11 | 40.762,11 | 100 | Coda lavori da anni precedenti per asfaltature |
| 76 | 2016PCIE0157 | Interventi straordinari sul pozzo Le Forche | A | Bettola | 110.000,00 | - | - | - | 27.773,32 | - | 27.773,32 | 27.773,32 | 100 | Completamento locale tecnico e installazione impianto disinfezione |
| 77 | 2016PCIE0162 | Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure | F | Farini | 223.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 2016PCIE0163 | Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia | A | Farini | 110.000,00 | - | - | - | 56.659,73 | - | 56.659,73 | 56.659,73 | 100 | Completamento locale tecnico, installazione impianto disinfezione, cablaggio idraulico pozzo e installazione pompe |
| 79 | 2016PCIE0164 | Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure | F | Ferriere | 260.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 2016PCIE0165 | Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo | D | Ferriere | 1.145.000,00 | - | - | - | 222.419,65 | 288.238,98 | 65.819,33 | 222.419,65 | 100 | Liquidazione opere finali del depuratore |
| 81 | 2016PCIE0172 | Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (difesa spondale) | A | Travo | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 2016PCIE0175 | Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo | D | Travo | 108.000,00 | - | - | - | 5.798,11 | - | 5.798,11 | 5.798,11 | 100 | Coda completamento lavori |
| 83 | 2016PCIE0176 | Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola | D | Vigolzone | 351.000,00 | - | - | - | 12.829,95 | - | 12.829,95 | 12.829,95 | 100 | Coda completamento lavori |
| 84 | 2016PCIE0177 | Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure (Finanziamento RER Alluvione) | A | Grandi opere, Ferriere, Farini | 4.905.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 665.908,54 | - | 665.908,54 | 465.908,54 | 232 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 85 | 2016PCIE0179 | Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli | A | Grandi opere, Bettola | 745.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 2016PCIE0180 | Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità. | A | Grandi opere, Cortemaggiore, Caorso, San Pietro in Cerro | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 2016PCIE0182 | Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità | A | Bettola | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 2016PCIE0183 | Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità | F | Bettola | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 2016PCIE0185 | Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale | A | Fiorenzuola | 190.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 2016PCIE0186 | * Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo | A | Fiorenzuola | 700.000,00 | - | - | - | 2.200,72 | - | 2.200,72 | 2.200,72 | 100 | Coda intervento da anni precedenti |
| 91 | 2016PCIE0188 | Realizzazione rete fognatura via Beati | F | Piacenza | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 2016PCIE0189 | Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante. | A | Piacenza | 350.000,00 | - | - | - | 2.487,73 | - | 2.487,73 | 2.487,73 | 100 | Costi di progettazione |
| 93 | 2016PCIE0190 | Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza. | D | Piacenza | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|---------------|---|----------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 94 | 2016PCIE0191 | Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure. | F | Pontenure | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | 2016PCIE0192 | Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private. | A | Rivergaro | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 2016PCIE0193 | Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità. | F | Rottofreno | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 2016PCIE0194 | Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano | F | San Pietro in Cerro | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 2016PCIE0195 | * Estendimento reti con contributo a carico di privati | TUTTI | Opere pluricomunali | | - | - | - | 136.089,51 | 5.824,22 | 130.265,29 | 136.089,51 | 100 | Interventi realizzati in base a richieste. Contributi ancora da contabilizzare. |
| 99 | 2017PCIE0197 | * Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI | A | Opere pluricomunali | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 2017PCIE0198 | * Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte Trebbia Calendasco. | A | Piacenza, Calendasco, Rottofreno | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | 2017PCIE0199 | * Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via Einaudi) | A | Piacenza, Calendasco, Rottofreno | 690.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | 2017PCIE0203 | * Ripristino danni alluvione depuratore Pradella | D | Coli | 50.000,00 | - | - | - | 26.074,09 | - | 26.074,09 | 26.074,09 | 100 | Lavori pianificati in anni precedenti |
| 103 | 2017PCIE0207 | * Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale | D | Bobbio | 100.000,00 | - | - | - | 4,60 | - | 4,60 | 4,60 | 100 | In corso valutazione nuova soluzione progettuale con posizionamento impianto su area demaniale. In corso acquisizione autorizzazioni. |
| 104 | 2017PCIE0210 | * Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone) | A | Besenzone | 290.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | 2017PCIE0212 | * Potenziamento pozzi esistenti | A | Calendasco, Piacenza | 80.000,00 | - | - | - | 7.620,22 | - | 7.620,22 | 7.620,22 | 100 | Code anni precedenti |
| 106 | 2017PCIE0213 | * Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco | A | Calendasco, Piacenza | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 38.165,28 | - | 38.165,28 | - 161.834,72 | - 80 | Spese di progettazione e screening campo pozzi |
| 107 | 2018PCIE0027A | Manutenzioni straordinarie ed interventi in emergenza | A | Opere pluricomunali | | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | 7.870.159,96 | - | 7.870.159,96 | 5.370.159,96 | 214 | Maggiori costi dovuti ad interventi di manutenzione non prevedibili e tra gli altri: Consistente aumento delle distrettualizzazioni di rete nei comuni di Castelvetro e Piacenza, Adeguamento nuovi serbatoi distribuzione Penice BOBBIO, Nuovo impianto di dosaggio potabilizzatore di Mignano, Rifacimento rete distribuzione Castellotti GROPPARELLO (autorizzata da ATERSIR), Sostituzione rete distribuzione in via Nespi GRAGNANO per un importo pari a 201.264~ (autorizzata da ATERSIR ma erroneamente rendicontata su questo codice e non su quello specifico) |
| 108 | 2018PCIE0027B | Manutenzioni straordinarie ed interventi in emergenza | F | Opere pluricomunali | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 3.401.316,72 | - | 3.401.316,72 | 2.401.316,72 | 240 | Maggiori costi sostenuti, tra gli altri, per: Relining canali in muratura e tubazioni a Bobbio, Sostituzione tubazioni e adeguamento camerette a CSG, Sostituzione tubazioni e relining tubazione in pressione impianto sollevamento Mercatone Uno a Fiorenzuola, Sostituzione tubazioni ammalorate a Lugagnano, Relining e sostituzione tubazioni a PC, Rifacimento condotte a Travo, Rifacimento caditoie e bocche di lupo a PC, Rifacimento impianto Montecuoco e rifacimento impianti Voltone Decca, Via Einaudi, Crocione di Gerbido a PC, Rifacimento impianto sollevamento Via Matteotti e SS45 Rotonda di Pittolo a Gossolengo, Rifacimento tubazione in via Nazionale a Perino. |
| 109 | 2018PCIE0027C | Manutenzioni straordinarie ed interventi in emergenza | D | Opere pluricomunali | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1.746.621,67 | - | 1.746.621,67 | 746.621,67 | 74 | Maggiori costi sostenuti, tra gli altri, per: Piacenza - nuova scala accesso camino caldaia, sigillatura giunti canale ingresso a denitri, sostituzione diffusori aria linea ox 3, manutenzione straordinaria compressori aria. Pontenure - manutenzione griglia grossolana. Niviano - manutenzione decantatore secondario. San Giorgio - riparazione ponte decantatore, Valconasso - riparazione perdita sedimentatore. Castell'arquato - acquisto pacchi lamellari per sedimentatore. Fiorenzuola - acquisto nuovo sistema di regolazione e controllo pompaggio aria. |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|---|----------|------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 110 | 2018PCIE0227 | Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio) | A | Piacenza | 1.500.000,00 | - | - | - | 273.401,12 | - | 273.401,12 | 273.401,12 | 100 | Completamento impianto, opere civili e fpo gruppo elettrogeno |
| 111 | 2018PCIE0228 | Trattamento Pozzo Marchesana | A | Gossolengo | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | 2018PCIE0229 | Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC CROMO | A | Bobbio | 355.000,00 | - | - | - | 222.529,33 | - | 222.529,33 | 222.529,33 | 100 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 113 | 2018PCIE0230 | Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione | A | Bobbio | 190.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | - | - | - | - | - 38.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - BBT02 SK 15 |
| 114 | 2018PCIE0231 | Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale | A | Bobbio | 170.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | - | - | - | - | - 34.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - BBT06 SK 19 |
| 115 | 2018PCIE0232 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli | A | Cortebrugnatella | 215.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - | - | - | - | - 43.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - CBT01 SK 21 |
| 116 | 2018PCIE0233 | Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli | A | Cortebrugnatella | 135.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | - | - | - 27.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - CBT02 SK20 |
| 117 | 2018PCIE0234 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18 | A | Cerignale | 210.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | - | - | - | - | - 42.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - CGT01 SK 22 |
| 118 | 2018PCIE0235 | Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane | A | Cerignale | 165.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | - | - | - 33.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - CGT02 SK 23 |
| 119 | 2018PCIE0236 | Acq Cerignale-Carissasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata | A | Cerignale | 215.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - | - | - | - | - 43.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - CGT07 SK 24 |
| 120 | 2018PCIE0237 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi | A | Coli | 210.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | - | - | - | - | - 42.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - COT04 SK 25 |
| 121 | 2018PCIE0238 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra | A | Coli | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - 30.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - COT05 SK 30 |
| 122 | 2018PCIE0239 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie | A | Coli | 175.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - 35.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - COT06 SK 26 |
| 123 | 2018PCIE0240 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini (da realizzare)-FSC CROMO | A | Coli | 175.000,00 | - | - | - | 62.022,18 | - | 62.022,18 | 62.022,18 | 100 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 124 | 2018PCIE0241 | Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta | A | Farini | 160.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | - | - | - | - | - 32.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FAT03 SK 30 |
| 125 | 2018PCIE0242 | Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni | A | Ferriere | 925.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | - | - | - | - | - 185.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FET01 SK 37 |
| 126 | 2018PCIE0243 | Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone | A | Ferriere | 165.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | - | - | - 33.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FET02 SK 38 |
| 127 | 2018PCIE0244 | Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie | A | Ferriere | 215.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - | - | - | - | - 43.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FET03 SK 39 |
| 128 | 2018PCIE0245 | Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra | A | Ferriere | 175.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - 35.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FET04 SK 41 |
| 129 | 2018PCIE0246 | Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri - FSC CROMO | A | Morfasso | 190.000,00 | - | - | - | 1.439,06 | - | 1.439,06 | 1.439,06 | 100 | In corso progettazione per nuova soluzione progettuale |
| 130 | 2018PCIE0247 | Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sarmadasco | A | Ferriere | 210.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | - | - | - | - | - 42.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - FET06 SK 41 |
| 131 | 2018PCIE0248 | Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere | A | Bobbio | 145.000,00 | - | - | - | 2.738,59 | - | 2.738,59 | 2.738,59 | 100 | Costi progettazione |
| 132 | 2018PCIE0249 | Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO | A | Bobbio | 185.000,00 | - | - | - | 28.059,56 | - | 28.059,56 | 28.059,56 | 100 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 133 | 2018PCIE0250 | Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO | A | Bobbio | 185.000,00 | - | - | - | 25.199,66 | - | 25.199,66 | 25.199,66 | 100 | Costi progettazione a seguito modifica in corso d'opera |
| 134 | 2018PCIE0251 | Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FS CROMOC | A | Coli | 135.000,00 | - | - | - | 114.301,51 | - | 114.301,51 | 114.301,51 | 100 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 135 | 2018PCIE0252 | Acq Coli-Gavi - Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione | A | Coli | 160.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | - | - | - | - | - 32.000,00 | - 100 | < 25 rinuncia FSC - COT03 SK 28 |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|---|----------|---|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 136 | 2018PCIE0253 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO | A | Farini | 145.000,00 | - | - | - | 165.106,96 | - | 165.106,96 | 165.106,96 | 100 | Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021 |
| 137 | 2018PCIE0254 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | A | Farini | 145.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | - | - | - | - | 29.000,00 | 100 | < 25 rinuncia FSC - FAT03 SK 30 |
| 138 | 2018PCIE0255 | Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC | A | Farini | 145.000,00 | - | - | - | 7.300,38 | - | 7.300,38 | 7.300,38 | 100 | Coda lavori da anni precedenti |
| 139 | 2018PCIE0256 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO | A | Farini | 185.000,00 | - | - | - | 39.722,91 | - | 39.722,91 | 39.722,91 | 100 | Intervento pianificato anni precedenti e realizzato nel 2021 |
| 140 | 2018PCIE0257 | Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione | A | Farini | 165.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | - | - | 33.000,00 | 100 | < 25 rinuncia FSC - FAT91 SK 35 |
| 141 | 2018PCIE0258 | Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione della rete idrica con installazione potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati | A | Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Castel San Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino, Alseno | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142 | 2018PCIE0259 | 2° stralcio: interconnessione tra pozzo Barabasca e rete Fiorenzuola (attraversamento FFSS e torrente Arda) - con collegamento per Nuovo ospedale | A | Fiorenzuola | 60.000,00 | - | - | - | 53.061,59 | - | 53.061,59 | 53.061,59 | 100 | Coda lavori da anni precedenti per asfaltature |
| 143 | 2018PCIE0260 | 2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) | A | Nibbiano, Alta Val Tidone | 550.000,00 | - | - | - | 390.759,44 | - | 390.759,44 | 390.759,44 | 100 | Intervento pianificato anni precedenti e iniziato nel 2021 |
| 144 | 2018PCIE0261 | 2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (posa tubazione definitiva) | A | Pecorara, Alta Val Tidone | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 2018PCIE0262 | 2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) | A | Pianello Val Tidone | 1.300.000,00 | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 44.904,56 | - | 44.904,56 | 355.095,44 | 88 | Intervento pianificato anni precedenti e iniziato nel 2021 |
| 146 | 2018PCIE0263 | Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati) | A | Nibbiano, Alta Val Tidone | 200.000,00 | - | - | - | 52.356,33 | - | 52.356,33 | 52.356,33 | 100 | Realizzati lavori di potenziamento serbatoio. Per la parte di rete siamo in attesa di avere l'impegno scritto dei privati che dichiarino la disponibilità di sostenere le spese di loro competenza per poter predisporre il progetto esecutivo. |
| 147 | 2018PCIE0264 | Progetto riassetto alta Val Nure: razionalizzazione pozzi e sorgenti con ristrutturazione serbatoi, automazione sistema, sostituzione tratti di rete | A | Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio | 700.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 | 2018PCIE0265 | Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1° stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC PERDITE | A | Bobbio | 380.000,00 | - | - | - | 11.288,50 | - | 11.288,50 | 11.288,50 | 100 | I lavori 2018PCIE0265 - 2018PCIE0266 sono lavori complementari e devono essere progettati e realizzati consecutivamente. I lavori inizieranno nel 2022 |
| 149 | 2018PCIE0266 | Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 2° stralcio: rifacimento sistema sorgenti (serbatoio Casoni di Bobbio). | A | Bobbio | 133.000,00 | 133.000,00 | - | 133.000,00 | 55.197,43 | - | 55.197,43 | 77.802,57 | 58 | I lavori 2018PCIE0265 - 2018PCIE0266 sono lavori complementari e devono essere progettati e realizzati consecutivamente. Lavoro terminato nel 2021 |
| 150 | 2018PCIE0267 | Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone | A | Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino | 540.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166.981,04 | - | 166.981,04 | 66.981,04 | 66 | Lavori in corso dall'anno precedente e terminati nel 2021 |
| 151 | 2018PCIE0268 | Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord | F | Caorso | 310.000,00 | - | - | - | 3.691,10 | - | 3.691,10 | 3.691,10 | 100 | Costi per progettazione |
| 152 | 2018PCIE0269 | Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino | F | Castel San Giovanni | 225.000,00 | - | - | - | 4.009,12 | - | 4.009,12 | 4.009,12 | 100 | Costi per progettazione |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|---|----------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 153 | 2018PCIE0270 | Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo-Chiavenna Landi | A | Cortemaggiore | 300.000,00 | - | - | - | 109.683,71 | - | 109.683,71 | 109.683,71 | 100 | Lavori terminati con maggior spesa dovuta a: maggiori opere rese necessarie per mantenere pressioni in Strada sant'Anna; ripristini con misto cementato in quanto impianti bitume chiusi a causa COVID; maggiorazione dei costi del materiale (decreto ministeriale). Si è inoltre resa necessaria e urgente la posa contestuale di una tubazione in pressione per lo smaltimento dei reflui di Saliceto. |
| 154 | 2018PCIE0271 | Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di depurazione di Fiorenzuola. | D | Fiorenzuola | 3.500.000,00 | 1.626.250,00 | - | 1.626.250,00 | 136.113,99 | - | 136.113,99 | - 1.490.136,01 | - 91 | Costi di progettazione. Ritardo nell'esecuzione dell'opera legato alle tempistiche di svolgimento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie per il potenziamento dell'impianto |
| 155 | 2018PCIE0272 | Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via San Rocco | A | Fiorenzuola | 2.300.000,00 | - | - | - | 13.715,90 | - | 13.715,90 | 13.715,90 | 100 | Costi per progettazione |
| 156 | 2018PCIE0273 | Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1° stralcio - FSC PERDITE | A | Gazzola | 175.000,00 | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 181.259,61 | - | 181.259,61 | 106.259,61 | 141 | Lavori in corso da anni precedenti. I maggiori costi sono dovuti alla necessità di rifacimento della strada che si è ammalorata a causa del transito dei mezzi di cantiere. |
| 157 | 2018PCIE0274 | Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria + I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE | TUTTI | Gragnano Trebbiense | 400.000,00 | - | - | - | 89.784,02 | - | 89.784,02 | 89.784,02 | 100 | Coda lavori da anni precedenti e terminato nel 2021. I costi sono aumentati a causa della maggiorazione dei costi del materiale (decreto ministeriale) |
| 158 | 2018PCIE0275 | Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE | A | Gropparello | 700.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 70.115,44 | - | 70.115,44 | - 429.884,56 | - 85 | Lavori iniziati per parte impiantistica |
| 159 | 2018PCIE0276 | Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto acquedottistico - alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda | A | Gropparello | 300.000,00 | - | - | - | 10.636,90 | - | 10.636,90 | 10.636,90 | 100 | Costi per progettazione |
| 160 | 2018PCIE0277 | Rifacimento rete loc. Case Magnani | A | Gropparello | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 161 | 2018PCIE0278 | Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina | TUTTI | Lugagnano Val d'Arda | 180.000,00 | - | - | - | 6.363,43 | - | 6.363,43 | 6.363,43 | 100 | Costi per progettazione |
| 162 | 2018PCIE0279 | Sostituzione tubazione loc. Camostrino | A | Lugagnano Val d'Arda, Verasca | 150.000,00 | - | - | - | 7.753,82 | - | 7.753,82 | 7.753,82 | 100 | Costi per progettazione |
| 163 | 2018PCIE0280 | Estendimento rete fognaria da Via Bertè a Via Posta dei Cavalli | F | Piacenza | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164 | 2018PCIE0281 | Rifacimento collettore via XXVI Aprile (sotto mura - lunghezza ca 1000 m) | F | Piacenza | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165 | 2018PCIE0282 | Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza (contributo privati) | A | Piacenza | 360.000,00 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | 19.579,38 | - | 19.579,38 | - 90.420,62 | - 82 | Spese tecniche per gara appalto e avvio cantiere. Lavori in corso nel 2022 |
| 166 | 2018PCIE0283 | Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente | A | Pianello Val Tidone | 175.000,00 | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 21.265,55 | - | 21.265,55 | - 103.734,45 | - 82 | Progettazione in fase di completamento. Acquisita area per serbatoio |
| 167 | 2018PCIE0284 | Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio - studio fattibilità | D | Rivergaro | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | 2018PCIE0285 | Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione permanente e controllo pressioni | A | Rivergaro | 139.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | 2018PCIE0286 | Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di depurazione di Rottofreno. | D | Rottofreno | 2.500.000,00 | 968.750,00 | - | 968.750,00 | 595.953,31 | - | 595.953,31 | - 372.796,69 | - 38 | Lavori in corso. Ritardo determinato dalla difficoltà di affidamento/avvio delle opere e dalla necessità di effettuare, preventivamente all'avvio del cantiere, un intervento di smaltimento rifiuti rinvenuti nell'area di espansione dell'impianto, ma non prevedibile in fase di progettazione |
| 170 | 2018PCIE0287 | Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti di tubazione Godi e Iustino - FSC PERDITE | A | San Giorgio Piacentino | 300.000,00 | - | - | - | 252.200,22 | - | 252.200,22 | 252.200,22 | 100 | Lavori in corso dall'anno precedente e terminati nel 2021 |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|---|----------|------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 171 | 2018PCIE0288 | Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e lustino/ telecontrollo sistema | A | San Giorgio Piacentino | 231.000,00 | - | - | - | 6.048,57 | - | 6.048,57 | 6.048,57 | 100 | L'opera è in ritardo in quanto rappresenta il completamento del progetto "Rifacimento reti acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e Viustino" cod Arsi 2018PCIE0287 attualmente in corso di realizzazione. |
| 172 | 2018PCIE0289 | Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc. Bettola | A | Sarmato | 185.000,00 | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 43.392,69 | - | 43.392,69 | - 31.607,31 | - 42 | Lavori iniziati nel 2021 e in corso nel 2022 |
| 173 | 2018PCIE0290 | Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere | A | Travo | 1.000.000,00 | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 27.627,35 | - | 27.627,35 | - 62.372,65 | - 69 | Costi di progettazione |
| 174 | 2018PCIE0291 | Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone | A | Vigolzone | 65.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175 | 2018PCIE0292 | CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi | A | Opere pluricomunali | 300.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - 50.000,00 | - 100 | Sul 2021 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già individuati. |
| 176 | 2018PCIE0293 | Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017 | A | Opere pluricomunali | | 670.000,00 | - | 670.000,00 | 284.236,73 | - | 284.236,73 | - 385.763,27 | - 57 | Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa emergenza sanitaria COVID 19 e forniture |
| 177 | 2018PCIE0294 | Studi e attività relative a procedura accorpamenti concessioni derivazione | A | Opere pluricomunali | 200.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 18.662,99 | - | 18.662,99 | - 31.337,01 | - 62 | Costi sostenuti secondo necessità. |
| 178 | 2018PCIE0296 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Bobbio - FSC CROMO | A | Bobbio | 350.000,00 | - | - | - | 3.486,72 | - | 3.486,72 | 3.486,72 | 100 | Lavori iniziati e poi interrotti. Ritardo dovuto a fallimento ditta appaltatrice. |
| 179 | 2018PCIE0297 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cerignale | A | Cerignale | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180 | 2018PCIE0298 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMO | A | Coli | 175.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181 | 2018PCIE0299 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti trattamento cromo nel comune di Cortebrugnatella | A | Cortebrugnatella | 75.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | 2018PCIE0300 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMO | A | Farini | 170.000,00 | - | - | - | 18.324,57 | - | 18.324,57 | 18.324,57 | 100 | Intervento pianificato annualità precedenti. Lavori in linea con le attività di cantiere. |
| 183 | 2018PCIE0301 | Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere | A | Ferriere | 220.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184 | 2018PCIE0304 | Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignano | A | Vigolzone | 1.010.000,00 | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 531.433,40 | - | 531.433,40 | 181.433,40 | 51 | Lavori in corso. Rendicontazione in linea con l'avanzamento del cantiere. Ultimati i lavori idraulici, asfaltature previste nel 2022 |
| 185 | 2018PCIE0305 | Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso | A | Morfasso | 140.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 186 | 2018PCIE0306 | Nuovi allacci | A | Opere pluricomunali | | 1.139.213,00 | 433.076,00 | 706.137,00 | 1.175.604,65 | 458.939,13 | 716.665,52 | 36.391,65 | 3 | |
| 187 | 2018PCIE0307 | Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione acquedotto a servizio della località Chiaravalle della Colomba | A | Alseno | 300.000,00 | - | - | - | 164.844,37 | - | 164.844,37 | 164.844,37 | 100 | Eseguite alcune lavorazioni rimanenti da anni precedenti e realizzato attraversamento FFSS |
| 188 | 2019PCIE0308 | Rifacimento potabilizzatore di Caorso | A | Caorso | 455.000,00 | - | - | - | 118.111,91 | - | 118.111,91 | 118.111,91 | 100 | Lavori eseguiti: acquisto ed installazione gruppo elettrogeno, realizzazione opere civili per alloggiamento gruppo elettrogeno e quadro di scambio con Enel, acquisto ed installazione dissabbiatori per pozzi |
| 189 | 2020PCIE0309 | Rifacimento fognatura in loc. San Bernardino | F | Castel San Giovanni | 200.000,00 | - | - | - | 145,39 | - | 145,39 | 145,39 | 100 | Progettazione conclusa. Ritardo nell'esecuzione dovuto a problematiche tecniche di gestione del traffico veicolare di difficile risoluzione. In valutazione la possibilità di eseguire georadar e spingitubo per attraversamento Via Emilia. |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 190 | 2020PCIE0310 | Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo | A | Pianello Val Tidone | 200.000,00 | - | - | - | 11.663,96 | - | 11.663,96 | 11.663,96 | 100 | Anticipato costi di progettazione |
| 191 | 2020PCIE0311 | Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici | A | Rivergaro | 500.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 12.851,84 | - | 12.851,84 | - 87.148,16 | - 87 | Progettazione definitiva in corso. Il ritardo nell'acquisizione dei terreni è dovuta ai tempi di chiusura alla successione e delle operazioni propedeutiche all'atto notarile. |
| 192 | 2020PCIE0312 | Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo | F | Ponte dell'Olio | 350.000,00 | - | - | - | 4.561,67 | - | 4.561,67 | 4.561,67 | 100 | Costi per progettazione |
| 193 | 2020PCIE0313 | Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da Cimitero a Franchini | A | Vernasca | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194 | 2020PCIE0314 | Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da Franchini a Bacedasco | A | Vernasca | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195 | 2020PCIE0315 | Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e alimentazione serbatoio Boffalora | A | Gazzola | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 196 | 2020PCIE0316 | Serbatoio Borgoforte | A | Piacenza | 2.400.000,00 | - | - | - | 31.503,00 | - | 31.503,00 | 31.503,00 | 100 | Costi sostenuti per Geologia - Fattibilità |
| 197 | 2020PCIE0317 | Collegamento Roncaglia - Caorso | A | Caorso | 2.100.000,00 | - | - | - | 305.972,92 | - | 305.972,92 | 305.972,92 | 100 | Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere |
| 198 | 2020PCIE0318 | Manutenzione straordinaria acque meteoriche | F | Opere pluricomunali | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - 150.000,00 | - 100 | Non sono emerse necessità |
| 199 | 2020PCIE0319 | Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche | A | Opere pluricomunali | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 694.972,88 | - | 694.972,88 | 394.972,88 | 131 | Interventi eseguiti secondo le necessità riscontrate. In particolare si evidenziano gli interventi di rifacimento della rete di adduzione a Magnano di Carpaneto, rifacimento della rete di distribuzione di case Martini a Travo e rifacimento della rete bdi distribuzione di Strada Centora a Rottofreno. |
| 200 | 2020PCIE0320 | Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario) | F | Opere pluricomunali | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - | - 100.000,00 | - 100 | Non sono emerse necessità particolari. Alcuni costi sono stati erroneamente scaricati nel capitolo delle manutenzioni straordinarie. |
| 201 | 2020PCIE0321 | Rifacimento servizi in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni | TUTTI | Opere pluricomunali | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 122.172,18 | - | 122.172,18 | 72.172,18 | 144 | Interventi realizzati in base a richieste. |
| 202 | 2020PCIE0322 | Investimenti di struttura | STRUTTURA | Opere pluricomunali | | 1.236.677,00 | - | 1.236.677,00 | 1.232.819,62 | - | 1.232.819,62 | - 3.857,38 | - | |
| 203 | 2020PCIE0323 | Rifacimento collettore fognario Via Montebello a Piacenza | F | Piacenza | 270.000,00 | - | - | - | 14.041,63 | - | 14.041,63 | 14.041,63 | 100 | Coda lavori da anni precedenti per asfaltature |
| 204 | 2020PCIE0324 | Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo Valtidone | F | Borgonovo Val Tidone | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | 2020PCIE0325 | Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso | A | Caorso | 160.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 | 2020PCIE0326 | Adeguamento depuratore Monticelli d'Ongina | D | Monticelli d'Ongina | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 | 2020PCIE0327 | Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio | D | Carpaneto | 700.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|-----|--------------|---|----------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 208 | 2020PCIE0328 | Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 2° stralcio | A | Gazzola | 300.000,00 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 27.970,61 | - | 27.970,61 | - 32.029,39 | - 53 | Avviata progettazione |
| 209 | 2020PCIE0329 | Studi di fattibilità e modellazioni | TUTTI | Opere pluricomunali | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - 50.000,00 | - 100 | Non sono emerse necessità |
| 210 | 2020PCIE0330 | Completamento rete idrica in loc. Dorba | A | Travo | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.190,98 | - | 16.190,98 | - 73.809,02 | - 82 | Costi di progettazione. Opera in ritardo per problema acquisizione autorizzazione privati |
| 211 | 2020PCIE0331 | Potenziamento rete acquedotto a servizio loc. San Genesio | A | Lugagnano Val d'Arda | 200.000,00 | - | - | - | 5.154,64 | - | 5.154,64 | 5.154,64 | 100 | Costi per progettazione |
| 212 | 2020PCIE0332 | Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello | D | Ziano Piacentino | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 213 | 2020PCIE0333 | Interramento tubazione in ribalta in loc. Case Foschi e potenziamento condotta loc. Bettolarga | A | Travo | 100.000,00 | - | - | - | 12.936,79 | - | 12.936,79 | 12.936,79 | 100 | Costi per progettazione |
| 214 | 2020PCIE0334 | Rifacimento rete acquedotto via Polezzera | A | Castel San Giovanni | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 215 | 2020PCIE0335 | Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima di Gossolengo | D | Gossolengo | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 216 | 2020PCIE0336 | Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille | A | Ziano Piacentino | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | 2020PCIE0337 | Sostituzione rete idrica in loc. Vesimo | A | Zerba | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 218 | 2020PCIE0338 | Adeguamento reticolo fognario zona Via King | F | Sarmato | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 219 | 2020PCIE0339 | Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni | A | Opere pluricomunali | | - | - | - | 7.434,38 | - | 7.434,38 | 7.434,38 | 100 | Scostamento legato alla necessità di analizzare le problematiche da risolvere. |
| 220 | 2020PCIE0340 | Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017 | A | Opere pluricomunali | | - | - | - | 393,78 | - | 393,78 | 393,78 | 100 | In questa voce sono stati rendicontati i costi derivanti da code di interventi e i contributi ricevuti dalla Protezione Civile. |
| 221 | 2020PCIE0341 | Sostituzione rete idrica in Via Nespi | A | Gragnano Trebbiense | 80.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - 30.000,00 | -100 | Lavori terminati nel 2021 ma erroneamente rendicontati nel titolo 2018PCIE0027A delle manutenzioni straordinarie. I costi sono aumentati a causa della richiesta dell'Amministrazione Comunale di prevedere un tratto maggiore e a causa della maggiorazione dei costi del materiale (decreto ministeriale) |
| 222 | 2021PCIE0342 | Rifacimento Collettore Fognario in Loc Capannette di Pej | F | Zerba | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - | - | - 150.000,00 | -100 | Intervento terminato ed erroneamente rendicontato nel capitolo delle Manutenzioni Straordinarie 2018PCIE0027B per un importo di 75.050 |
| 223 | 2021PCIE0343 | Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale Amendola | F | Castel San Giovanni | 1.000.000,00 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 20.253,50 | - | 20.253,50 | - 4.746,50 | -18 | |
| 224 | 2021PCIE0344 | Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord - Via Papa Giovanni XXIII | A | Travo | 130.000,00 | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 68.460,48 | - | 68.460,48 | 3.460,48 | 5 | |
| 225 | 2021PCIE0345 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola | A | Fiorenzuola | 190.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - 10.000,00 | -100 | Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la Progettazione al 2021. |
| 226 | 2021PCIE0346 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato- | A | Castell'Arquato | 160.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - 10.000,00 | -100 | Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la Progettazione al 2021. |
| 227 | 2021PCIE0347 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano | A | Lugagnano Val d'Arda | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 5.157,43 | - | 5.157,43 | - 4.842,57 | -48 | CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100% |
| 228 | 2021PCIE0348 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni . Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni | A | Castel San Giovanni | 75.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - 10.000,00 | -100 | Intervento in corso nel 2022. Non si è reso necessario anticipare la Progettazione al 2021. |

| | | | | | | Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020 | | | Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | | | Scostamento | | |
|---|--------------|---|----------|------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|
| | Codice | Titolo | Servizio | Comuni | Importo progettuale | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | Valore | % | Note giustificative |
| 229 | 2021PCIE0349 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e località Tassara (Alta Val Tidone) | A | Ziano Piacentino | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 4.446,62 | - | 4.446,62 | - 5.553,38 | -55 | CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100% |
| 230 | 2021PCIE0350 | Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e località Casa Rossa in Comune di Pecorara | A | Pecorara | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 4.188,83 | - | 4.188,83 | - 5.811,17 | -58 | CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100% |
| | | | | | | Importo lordo pianificato 2021 | Contributi pianificati 2021 | Importo netto pianificato 2021 | Importo lordo consuntivo 2021 | Contributi consuntivo 2021 | Investimento gestore consuntivo 2021 | PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura | | |
| Importo Totale | | | | | | 21.108.440,00 € | 2.099.285,00 € | 19.009.155,00 € | 26.400.483,65 € | 753.002,33 € | 25.647.481,32 € | 127% | | |
| Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura | | | | | | 19.871.763,00 € | 2.099.285,00 € | 17.772.478,00 € | 25.167.664,03 € | 753.002,33 € | 24.414.661,70 € | | | |

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza

F.to Franco Albertini

Il segretario verbalizzante

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
