

CLPR/2022/24 del 16 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021**

IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi

CLPR/2022/24

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2022** il giorno **16** del mese di **novembre** alle ore **14.00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011315 del 10/11/2022, in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO				0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	SINDACO	SI	0,7699
BERCETO	Luigi Lucchi	SINDACO	SI	0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO	Nicolas Passera	ASSESSORE	SI	1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dallavalle	ASSESSORE	SI	2,8389
COLORNO	Christian Stocchi	SINDACO	SI	1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	SINDACO	SI	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	SINDACO	SI	0,5175
FELINO	Flavio Marchesi	ASSESSORE	SI	1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	ASSESSORE	SI	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	ASSESSORE	SI	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	ASSESSORE	SI	1,2630
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MONTECHIARUGOLO	Daniele Friggeri	SINDACO	SI	2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI	Raffaella Devincenzi	SINDACO	SI	0,8188
NOCETO	Giovanna Maini	ASSESSORE	SI	2,5636
PALANZANO	Marinella Vicini	ASSESSORE	SI	0,3939
PARMA	Gianluca Borghi	ASSESSORE	SI	35,5990
PELLEGRINO PARMENSE				0,3770
POLESINE ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	SINDACO	SI	0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	ASSESSORE	SI	1,2519
SALSOMAGGIORE TERME	Trevisan Marco	ASSESSORE	SI	3,7795
SAN SECONDO PARMENSE				1,2470
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	ASSESSORE	SI	1,6113
SOLIGNANO				0,5112
SORAGNA	Maria Pia Piroli	ASSESSORE	SI	1,0636
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	ASSESSORE	SI	2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA	Claudio Alzapiedi	SINDACO	SI	0,2996
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	SINDACO	SI	0,6700
VARSÌ				0,4083
PROVINCIA DI PARMA				10,0000

Presenti n. 24, quote 71,45

Assenti n. 21, quote 28,55

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.6 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Ireti S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, modificata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di maggio dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, **palesi ed unanimi**

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Ireti S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 24 del 16 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 16 novembre 2022

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: IRETI S.p.a.
BACINO PROVINCIALE DI PARMA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 06 del 15/01/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	19.255.344	23.255.418,68	4.000.074,68	121%
SOCIETÀTERZE	//	//	//	//
FINANZIAMENTI PUBBLICI	605.281	394.166,83	-211.114,17	65%
TOTALE	19.860.625	23.649.585,51	3.788.960,51	119%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 ammontano ad €. 1.325.657,15. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 121% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato e pari al 65%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 119%.

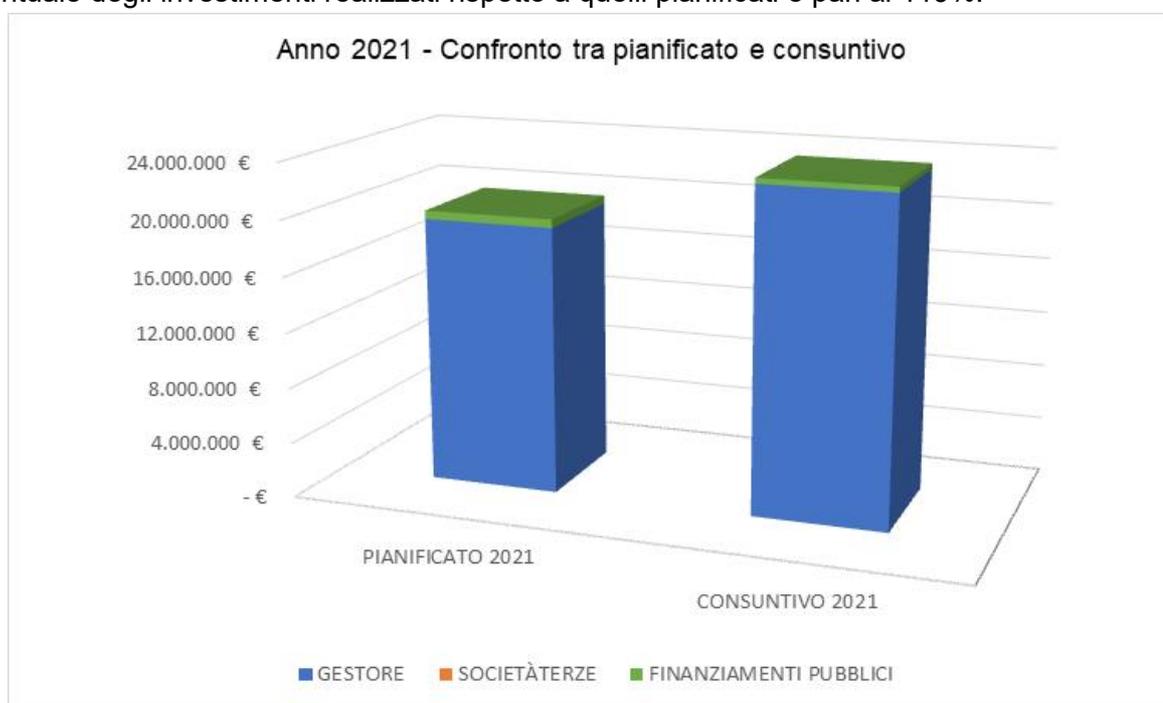


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	9.628.625,00	14.253.195,59	+4.624.570,59	148%
DEPURAZIONE	6.182.000,00	5.777.835,65	-404.164,35	93%
FOGNATURA	3.720.000,00	3.300.862,26	-419.137,74	89%
ACQUE METEORICHE	150.000,00	0	-150.000,00	0%
TUTTI	180.000,00	317.692,01	+137.692,01	176%
TOTALE	19.860.625	23.649.585,51	3.788.960,51	119%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

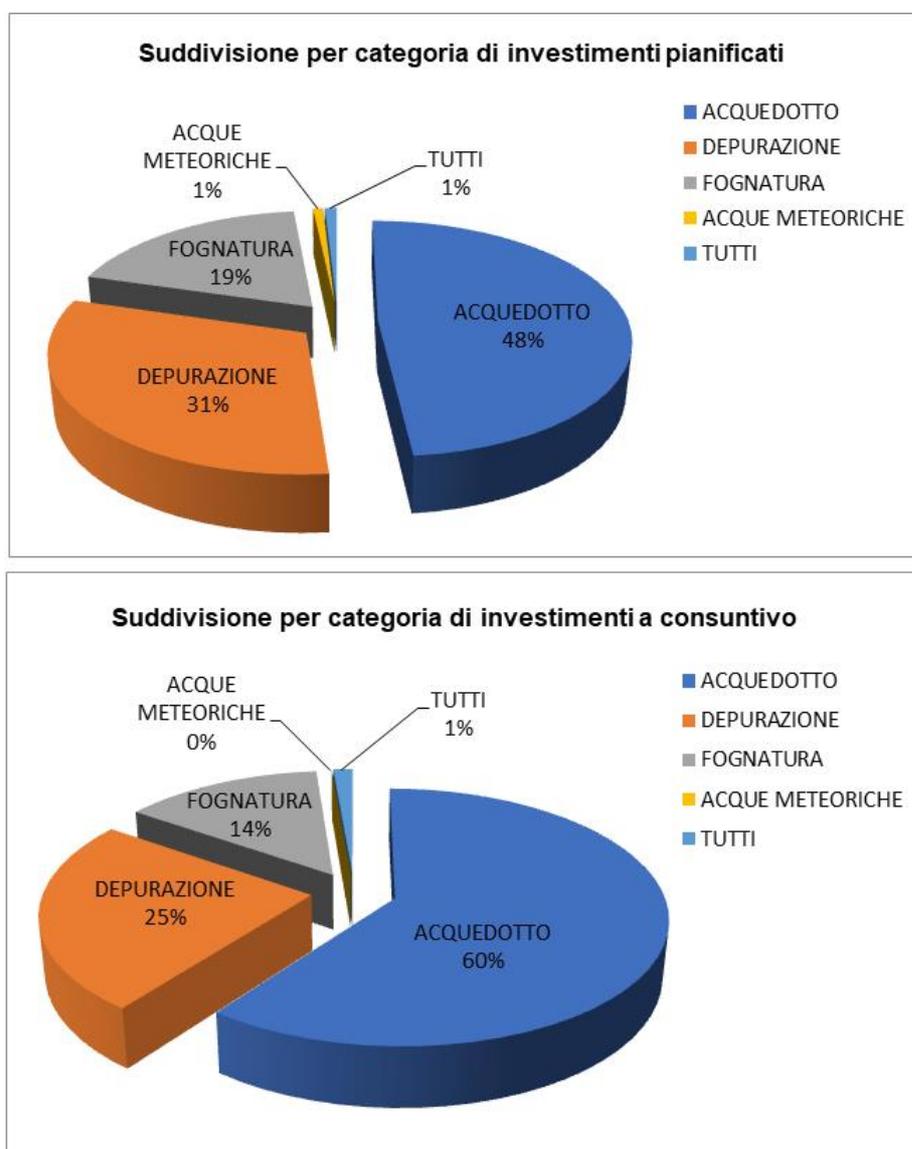


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	3.405.000	7.588.972,82	+4.183.972,82	223%
DEPURAZIONE	1.500.000	3.270.001,16	+1.770.001,16	218%
FOGNATURA	1.540.000	2.197.164,24	+657.164,24	143%
ACQUE METEORICHE	150.000	0	-150.000,00	0%
TOTALE	6.595.000	13.056.138,00	6.461.138,22	198%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non sono emerse criticità.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	100	1.972.000	1.757.312,62	-214.687,38	89%
500.001-1.000.000 €	18	975.000	1.916.566,04	941.566,04	197%
1.000.001-2.000.000 €	14	2.550.000	1.846.579,54	-703.420,46	72%
2.000.001-5.000.000 €	10	2.050.000	1.303.815,12	-746.184,88	64%
Oltre 5.000.000 €	5	3.350.000	2.741.569,89	-608.430,11	82%
Manutenzioni e titoli cumulativi	21	8.963.625	14.083.742,30	5.120.117,30	157%
TOTALE	168	19.860.625	23.649.586	3.788.960,51	119%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;
- Mancata attuazione di interventi legati all'adeguamento degli impianti di trattamento ai limiti del cromo;

- Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche, alla manutenzione straordinaria dei pozzi e degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto nonché alla risoluzione di criticità legate all'allagamento dei sottopassi;
- Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 70

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 90.

	N. INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	20	2.107.000	0
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	40	0	1.962.540,32
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	44	15.928.625	19.739.346,87
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	6	3.208.666	3.273.355,47

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI NON AVVIATI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	A	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	Gestore	2.000.000,00	350.000,00
2	2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi	D	Monchio delle Corti	Gestore	472.000,00	100.000,00
3	2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	D	Monchio delle Corti	Gestore	112.000,00	42.000,00
4	2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	D	Monchio delle Corti	Gestore	520.000,00	100.000,00
5	2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estensione fognatura - opera comp. A7	F	Parma	Gestore	1.000.000,00	100.000,00
6	2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	D	Corniglio	Gestore	70.000,00	70.000,00
7	2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	F	Parma	Gestore	280.000,00	40.000,00
8	2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	F	Mezzani	Gestore	150.000,00	130.000,00

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
9	2020PRIA0173	Ampliamento campo pozzi Vignale	A	Traversetolo	Gestore	125.000,00	50.000,00
10	2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	F	Opere pluricomunali	Gestore		150.000,00
11	2020PRIA0177	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	F	Opere pluricomunali	Gestore		300.000,00
12	2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di piena Parma e Provincia	F	Opere pluricomunali	Gestore	800.000,00	100.000,00
13	2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	D	Parma	Gestore	350.000,00	150.000,00
14	2020PRIA0195	Ristrutturazione/delocalizzazione fossa imhoff di Bosco	D	Corniglio	Gestore	90.000,00	90.000,00
15	2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	A	Noceto	Gestore	225.000,00	50.000,00
16	2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	A	Parma	Gestore	30.000,00	5.000,00
17	2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	A	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo	Gestore		100.000,00
18	2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	A	Collecchio, Felino, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Traversetolo	Gestore	125.000,00	50.000,00

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
19	2020PRIA0211	Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore		300.000
20	2020PRIA0214	Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area urbana Via Verona	F	Parma	Gestore	820.000	100.000

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento			
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
1	2014PRIA0001	153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza	A	Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, Traversetolo, Parma	1.000.000,00	100.000,00	-	100.000,00	77.279,45	-	77.279,45	-	22.720,55	-22	La realizzazione del pozzo ha avuto costi inferiori ai preventivati
2	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	A	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-100	L'opera è susseguente alla definizione delle potenzialità di emungimento aggiuntive dai nuovi pozzi previsti dal titolo precedente. Si è sospesa la progettazione definitiva.
3	2014PRIA0003	1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	A	Calestano	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	A	Calestano, Felino, Sala Baganza	2.500.000,00	50.000,00	-	50.000,00	3.772,47	-	3.772,47	-	46.227,53	-92	Costi inferiori delle indagini previste per definire il potenziale di captazione in sito (residui attività 2020).
5	2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	D	Collecchio	3.100.000,00	-	112.964,00	- 112.964,00	278.264,05	-	278.264,05	278.264,05	278.264,05	100	Andamento costi conseguente alla ripresa del cantiere sospeso
6	2014PRIA0007	3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	A	Collecchio	30.000,00	-	-	-	258,04	-	258,04	258,04	258,04	100	Sopraluogo personale interno
7	2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	A	Corniglio	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	7.274,83	-	7.274,83	-	242.725,17	-97	Ritardo dovuto a procedure espropriative in corso
8	2014PRIA0009	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	A	Corniglio	70.000,00	-	-	-	9.581,30	-	9.581,30	9.581,30	9.581,30	100	Coda intervento
9	2014PRIA0012	24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	D	Corniglio	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2014PRIA0013	6IAG - Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa	D	Corniglio	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	4.888,92	-	4.888,92	-	135.111,08	-96	Ritardo dovuto a problemi acquisizione area
11	2014PRIA0014	7IAG - Sistema depurativo in località Tre Rii e località Torre Tre Rii	D	Corniglio	100.000,00	-	-	-	6.757,52	-	6.757,52	6.757,52	6.757,52	100	Ritardo dovuto a problemi acquisizione area
12	2014PRIA0015	8IAG - Sistema depurativo in Località Signatico	D	Corniglio	150.000,00	-	-	-	2.326,25	-	2.326,25	2.326,25	2.326,25	100	Anticipo costi progettazione
13	2014PRIA0016	9IAG - Sistema depurativo località Petrignacola	D	Corniglio	70.000,00	-	-	-	3.271,55	-	3.271,55	3.271,55	3.271,55	100	Anticipo costi progettazione
14	2014PRIA0020	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	D	Fontevivo, Noceto	4.661.173,00	500.000,00	-	500.000,00	1.257,96	-	1.257,96	-	498.742,04	-99	Ritardi dovuti ad adeguamento progetto a nuove normative e verifica progetto ex art 26 dlgs 50/2016

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
15	2014PRIA0023	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli; località Strognano; località Cozzano con relativi collettamenti fognari	D	Langhirano	260.000,00	150.000,00	-	150.000,00	240,16	-	240,16	- 149.759,84	-99	Ritardo dovuto a difficile trattativa per posizione imhoff per Strognano con proprietario.
16	2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	D	Langhirano	2.000.000,00	100.000,00	-	100.000,00	67.014,22	-	67.014,22	- 32.985,78	-32	Minori spese progettuali e di indagine rete fognaria
17	2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	A	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	2014PRIA0026	15IAG - Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	D	Lesignano de Bagni	614.359,00	-	-	-	903,76	-	903,76	903,76	100	Code attività di chiusura progetto
19	2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	A	Medesano	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	2014PRIA0029	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	F	Medesano	550.000,00	-	-	-	103.208,15	-	103.208,15	103.208,15	100	Lavori in corso, ritardi per raccolta servitù in corso e richiesta attraversamento ferroviario
21	2014PRIA0030	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	F	Medesano	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	2014PRIA0032	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° stralcio	A	Collecchio, Medesano, Noceto	1.901.943,00	250.000,00	-	250.000,00	422.555,31	-	422.555,31	172.555,31	69	Andamento costi segue l'attività di cantiere
23	2014PRIA0033	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla-ATO-IREN	A	Collecchio, Noceto, Medesano	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	A	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefumi	D	Monchio delle Corti	472.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Progettazione definitiva conclusa. Ritardo nell'avvio del cantiere per servitù e permessi.
26	2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	D	Monchio delle Corti	112.000,00	42.000,00	-	42.000,00	-	-	-	- 42.000,00	-100	Ritardi dovuti a raccolta servitù
27	2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	D	Monchio delle Corti	520.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Progetto preliminare inviato in comune. Decisioni dell'amministrazione su procedura acquisto area. In attesa di risposta.
28	2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	D	Monchio delle Corti	70.000,00	-	-	-	201.767,86	-	201.767,86	201.767,86	100	Anticipata l'esecuzione opera in quanto pronta rispetto alle altre pianificate nel comune

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
29	2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	A	Monchio delle Corti	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto - 1° stralcio	D	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	15.988.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	168.816,97	-	168.816,97	- 1.831.183,03	-91	Conclusione attività verifica e adeguamento progetto
31	2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	D	Neviano degli Arduini	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	A	Neviano degli Arduini	1.400.000,00	500.000,00	-	500.000,00	585.924,24	-	585.924,24	85.924,24	17	
33	2014PRIA0052	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	A	Neviano degli Arduini	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00	4.229,47	-	4.229,47	- 95.770,53	-95	Progettazione in corso. Intervento in ritardo per difficoltà nell'individuazione della soluzione tecnica più adatta.
34	2014PRIA0055	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio dei Comuni di Neviano; Traversetolo; Montechiarugolo - 1° stralcio (1° e 2° lotto)	F	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	9.000.000,00	50.000,00	-	50.000,00	350.368,28	-	350.368,28	300.368,28	600	Realizzato tratto vecchio depuratore - nuovo depuratore in accordo quadro, costi legati all'andamento del cantiere
35	2014PRIA0056	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	D	Noceto	623.979,00	-	-	-	42.341,12	-	42.341,12	42.341,12	100	Coda intervento intervento pianificato in annualità precedenti
36	2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	F	Noceto	30.000,00	-	-	-	272,70	-	272,70	272,70	100	Coda lavori. Sopralluoghi
37	2014PRIA0059	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	A	Parma	5.350.000,00	100.000,00	-	100.000,00	25.220,40	-	25.220,40	- 74.779,60	-74	Costi inferiori a quanto previsto in quanto si è realizzato il monitoraggio quali-quantitativo della risorsa.
38	2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	A	Parma	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	D	Parma	2.400.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.009.078,15	-	1.009.078,15	9.078,15	1	
40	2014PRIA0062	44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore Parma Ovest	D	Parma	1.500.000,00	50.000,00	-	50.000,00	80.970,86	-	80.970,86	30.970,86	61	Costi progettazione e indagini superiori a previsto
41	2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	F	Parma	1.991.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	11.737,76	-	11.737,76	- 988.262,24	-98	In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
42	2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	D	Parma	131.151,00	-	-	157.508,22	-	157.508,22	157.508,22	100	Maggiori costi dovuti a esecuzione di ripetute prove in laboratorio di tenuta previsionale della struttura cementizia esistente, costi accessori dovuti a pulizie straordinarie con mezzo autoespurgo del bacino di accumulo del digestore, costi dovuti a verifiche integrità pareti interne con utilizzo di drone	
43	2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	D	Parma	480.000,00	-	-	320.707,90	-	320.707,90	320.707,90	100	Intervento in corso	
44	2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	A	Parma	425.138,00	-	-	-	-	-	-	-		
45	2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio per risoluzione problema nitrati	A	Parma	470.000,00	-	-	571,81	-	571,81	571,81	100	Costi per sopralluoghi per nuova soluzione progettuale	
46	2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	F	Parma	2.000.000,00	-	-	92.501,89	-	92.501,89	92.501,89	100	Code cantiere	
47	2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	F	Parma	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
48	2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	F	Parma	100.000,00	-	-	8.992,60	-	8.992,60	8.992,60	100	Intervento in corso	
49	2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	F	Parma	470.000,00	-	-	4.168,76	-	4.168,76	4.168,76	100	Intervento in corso	
50	2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura - opera comp. A7	F	Parma	1.000.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00	-100	Ritardo dovuto ai tempi di gara svolti per l'incarico di progettazione opere fognarie e per attivazione contratti relativamente al secondo stralcio dei lavori	
51	2014PRIA0083	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	A	Parma	985.966,00	25.000,00	-	25.000,00	706.958,51	-	706.958,51	681.958,51	2727	Si è proseguito con notevole velocità in lavoro di distrettualizzazione che era stato fortemente sviluppato nel corso del 2020. Questo slancio ha permesso di creare nuovi distretti con notevole velocità contando sulle maestranze ingaggiate già dal 2020 e permettendo il raggiungimento della copertura di quasi il 90% della rete.
52	2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	A	Parma	110.000,00	-	-	5.797,63	-	5.797,63	5.797,63	100	Code lavori anno precedente per chiusura cantiere (automazione elettrica)	
53	2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	A	Parma	20.038,00	25.000,00	-	23.376,99	-	23.376,99	- 1.623,01	-6		

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
54	2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	F	Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto	120.000,00	30.000,00	-	30.000,00	110.478,77	-	110.478,77	80.478,77	268	Conclusione attività monitoraggio modello PR
55	2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	A	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	A	Sala Baganza		-	-	-	-	-	-	-	-	
57	2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	A	Sala Baganza	1.317.619,94	-	-	-	170.390,95	-	170.390,95	170.390,95	100	Andamento spese in funzione tempi di cantiere
58	2014PRIA0092	119EN - Ampliamento depuratore Sorbolo	D	Sorbolo	2.204.646,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	2014PRIA0093	118EN - Opere per realizzazione distretti idrici	A	Sorbolo	30.000,00	-	-	-	5.114,04	-	5.114,04	5.114,04	100	La somma spesa ha la stessa natura dei lavori di cui sopra e relative motivazioni
60	2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	D	Traversetolo		-	-	-	-	-	-	-	-	
61	2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	A	Opere pluricomunali		3.000.000,00	-	3.000.000,00	7.155.590,10	-	7.155.590,10	4.155.590,10	138	Maggiori costi dovuti, tra gli altri, a: interventi di rifacimento reti, tra cui le più onerose sul comune di Parma. Sono state eseguite diverse manutenzioni di impianti come sorgenti, impianti di trattamento, pompaggi e serbatoi, tra cui le più onerose sui serbatoi di Maiatico (Sala Baganza), Felino, Monte Castello (Neviano) e Provazzano (Neviano). Come l'anno precedente si sono svolte campagne massive di ricerca perdite che hanno dato luogo a numerosi rifacimenti di derivazioni d'utenza, principalmente nei comuni di Sorbolo-Mezzani, Parma, Traversetolo, Langhirano, Medesano E Neviano.

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
62	2014PRIA0096	72IAG - Manutenzioni straordinarie	D	Opere pluricomunali			1.500.000,00	3.112.492,94	-	3.112.492,94	1.612.492,94	107	Maggiori costi dovuti a: demolizione letti di essiccamento fanghi depuratore di Medesano e realizzazione perimetro murario con misure antisismiche; Impermeabilizzazione delle vasche di contenimento acidi dell'impianto di disinfezione del depuratore Parma Ovest con resine ad alta resistenza antiacido; opere accessorie edili per realizzazione piazzola di sostegno del gruppo elettrogeno del depuratore di Medesano; opere edili per posa cavi di alimentazione nuovi del locale quadri di Fontevivo in seguito a incendio dell'esistente e allestimento del nuovo locale quadri; ripristino cavi elettrici e utenze di collegamento del depuratore di Fontevivo danneggiate durante l'incendio, rifacimento quadro elettrico provvisorio e inverter, raddoppio dei corrugati esistenti e cavidotti delle linee nuove bruciate con l'incendio. Depuratore di Mezzani: maggiori costi per modifica software per automazione impianto e sostituzione aeratori con soffianti; Depuratore Borghetto di Noceto - ampliamento: sistemazione opere murarie e di carpenteria, nonché posa di collegamenti elettrici accessori non terminati durante le opere di ampliamento. Depuratore di Collecchio: rimozione canna fumaria in amianto e posa della nuova e smaltimento; Depuratore Santa Maria: sistemazione stradello di accesso, sostituzione lampioni e rifacimento rete di drenaggio interno. Depuratore Sorbolo: rifacimento locali servizi e locali tecnici e piazzola biossido x disinfezione uscita impianto. Catramatura locale cabina di ricezione MT del depuratore Parma Est.	
63	2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	F	Opere pluricomunali	21.966.088,00		1.200.000,00	2.197.164,24	-	2.197.164,24	997.164,24	83	Maggiori costi dovuti a: rifacimento di numerosi tratti fognari ammalorati che rischiavano il collassamento della struttura stradale, rifacimento di numerosi tratti fognari fessurati che causavano infiltrazioni, manutenzione straordinaria impianti di sollevamento, Interventi relativi a manutenzione reti meteoriche e Scolmatori erroneamente rendicontati su questo capitolo e non sugli specifici.	
64	2014PRIA0098	74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo	1.063.273,00		150.000,00	317.692,01	-	317.692,01	167.692,01	111	Maggiori costi dovuti a campagna di monitoraggio della rete fognaria dell'agglomerato di Langhirano e ad attività di videoispezione e spurgo delle reti fognarie nonché ad attività di sostituzione chiusini, necessaria all'esecuzione del rilevamento, effettuata nel quartiere Cittadella di Parma.	
65	2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	A	Opere pluricomunali			200.000,00	211.421,54	-	211.421,54	11.421,54	5		
66	2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	F	Opere pluricomunali			200.000,00	107.853,54	-	107.853,54	- 92.146,46	-46	Andamento costi in funzione delle richieste pervenute	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento			
					Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
67	2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	A	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	330.000,00	50.000,00	-	50.000,00	72.032,08	-	72.032,08	22.032,08	44	Realizzati interventi secondo necessità
68	2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	D	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	1.321.043,06	50.000,00	-	50.000,00	90.835,74	-	90.835,74	40.835,74	81	Realizzati interventi secondo necessità
69	2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	F	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	505.078,00	50.000,00	-	50.000,00	400,26	-	400,26	- 49.599,74	-99	Realizzati interventi secondo necessità
70	2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	A	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		50.000,00	25.000,00	25.000,00	4.901,48	48.185,00	- 43.283,52	- 45.098,52	-90	Andamento costi in funzione delle richieste pervenute

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
					Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
71	2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	F	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	50.000,00	25.000,00	25.000,00	67.436,27	29.400,00	38.036,27	17.436,27	34	CAMB 75 Franchigia < 20.000 - Scostamento < 100%
72	2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua - Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro	A	Opere pluricomunali	100.000,00	-	100.000,00	117.897,40	-	117.897,40	17.897,40	17	
73	2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	A	Opere pluricomunali	50.000,00	-	50.000,00	34.316,95	-	34.316,95	- 15.683,05	-31	CAMB 75 Franchigia < 20.000 - Scostamento < 100%
74	2016PRIA0108	Complesso acquedottistico relativo all'impianto di trattamento acqua delle gallerie Braia e dei pozzi Fabiola	A	Langhirano, Felino	3.250.000,00	500.000,00	500.000,00	11.366,25	-	11.366,25	- 488.633,75	-97	Ritardo su conclusione fase autorizzazione
75	2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	D	Corniglio	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	- 70.000,00	-100	Eseguite attività propedeutiche alla progettazione
76	2016PRIA0111	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	F	Parma	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
77	2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	F	Parma	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
78	2016PRIA0113	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	F	Parma	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
79	2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di manutenzione impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	F	Parma	280.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	- 40.000,00	-100	Non sono state rilevate necessità di intervento nel corso del 2020
80	2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	F	Parma	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento			
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
81	2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	F	Parma	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00	4.408,82	-	4.408,82	-	45.591,18	-91	Coda lavori anno precedente
82	2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	A	Opere pluricomunali		50.000,00	-	50.000,00	167.903,61	-	167.903,61	117.903,61		235	Andamento in funzione delle necessità riscontrate
83	2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	A	Sorbolo, Parma	400.000,00	-	-	-	85.592,68	-	85.592,68	85.592,68		100	Ultimazione lavori intervento pianificato anni precedenti
84	2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	A	Sorbolo	100.000,00	-	-	-	315,59	-	315,59	315,59		100	Sopraluoghi personale
85	2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	F	Sorbolo	1.500.000,00	100.000,00	-	100.000,00	6.956,56	-	6.956,56	-	93.043,44	-93	Avviata procedura espropriativa da parte dell'amministrazione comunale. Tempi di realizzazione condizionati dalla contestuale esecuzione della pista ciclabile da parte del Comune
86	2016PRIA0130	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	F	Opere pluricomunali		40.000,00	-	40.000,00	48.624,46	-	48.624,46	8.624,46		21	CAMB 75 Franchigia < 20.000 - Scostamento < 100%
87	2016PRIA0131	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST; PR EST; FELINO	D	Opere pluricomunali	100.000,00	-	-	-	5.965,48	-	5.965,48	5.965,48		100	Coda lavori anni precedenti
88	2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	F	Mezzani	150.000,00	130.000,00	-	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00	-100	Ripianificato nel 2022
89	2016PRIA0134	73IAG - Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	F	Mezzani	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	2016PRIA0135	80IAG - RISTRUTTURAZIONE/manutenzione straordinaria ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb Manzano	A	Langhirano	950.000,00	100.000,00	-	100.000,00	17.198,31	-	17.198,31	-	82.801,69	-82	Contenzioso con proprietari terreni che hanno fatto causa al comune per errata procedura amministrativa che ha impedito inizio lavori
91	2016PRIA0139	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	A	Palanzano	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	A	Palanzano	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogroppo	D	Palanzano	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	F	Palanzano	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	F	Parma	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	F	Parma	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento			
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
97	2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	F	Parma	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
98	2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	F	Parma	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	27.683,68	-	27.683,68	-	22.316,32	-44	Lavori iniziati ultimi mesi dell'anno. Costi come da andamento cantiere
99	2016PRIA0157	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto;Reno di TIZZANO; Capriglio; Pianestolla, Boschetto, Pietta e Groppo.	F	Tizzano Val Parma	500.000,00	100.000,00	-	100.000,00	156.318,02	-	156.318,02	56.318,02	56	56	Lavori secondo andamento cantiere in corso
100	2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	F	Sorbolo	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	2018PRIA0160	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	A	Opere pluricomunali		880.000,00	-	880.000,00	685.627,95	-	685.627,95	-	194.372,05	-22	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa emergenza sanitaria COVID 19 e fornitura materiali.
102	2018PRIA0161	Sostituzione reti idriche fugganti via Tommasicchio-Don Corchia	A	Langhirano	150.000,00	-	-	-	37.874,89	-	37.874,89	37.874,89	100	100	Code lavori anno precedente
103	2018PRIA0162	Sostituzione rete idrica fuggante in strada Argini NORD	A	Lesignano de Bagni	150.000,00	-	-	-	25.031,48	-	25.031,48	25.031,48	100	100	Code lavori anno precedente
104	2018PRIA0163	Sostituzione reti idriche fugganti zona Passo del Bocco	A	Parma	300.000,00	-	-	-	701,74	-	701,74	701,74	100	100	Code lavori anno precedente
105	2018PRIA0164	Sostituzione reti idriche fugganti zona Strada Massese	A	Tizzano Val Parma	200.000,00	-	-	-	673,24	-	673,24	673,24	100	100	Code lavori anno precedente
106	2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	D	Traversetolo	350.000,00	-	-	-	64.368,05	-	64.368,05	64.368,05	100	100	Sviluppo progettazione esecutiva
107	2019PRIA0166	Nuovi Allacci	A	Opere pluricomunali		1.213.625,00	442.317,00	771.308,00	459.281,58	316.581,83	142.699,75	-	754.343,42	-62	Interventi realizzati in funzione delle richieste ricevute
108	2019PRIA0167	Opere di difesa spondale per la protezione del Campo Pozzi di Velago	A	Neviano degli Arduini	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	2020PRIA0169	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		1.383.666,00	-	1.383.666,00	1.325.657,15	-	1.325.657,15	-	58.008,85	-4	
110	2020PRIA0170	Progettazione sistema acquedottistico Fragno (serb+pompaggio+reti)	A	Calestano	1.000.000,00	-	-	-	411,71	-	411,71	411,71	100	100	Sopraluoghi personale
111	2020PRIA0171	Adeguamento serbatoio Quinzano	A	Langhirano	200.000,00	-	-	-	5.197,56	-	5.197,56	5.197,56	100	100	Anticipo spese progettuali
112	2020PRIA0172	Nuovo serbatoio Cardale loc. Beduzzo	A	Corniglio	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
113	2020PRIA0173	Ampliamento campo pozzi Vignale	A	Traversetolo	125.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	-100	Non avviata perchè in attesa risultati del pozzo trivellato per valutare la capacità produttiva del campo pozzi.
114	2020PRIA0174	Rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 2° stralcio	A	Medesano	2.500.000,00	-	-	-	76,24	-	76,24	76,24	100	Sopraluoghi personale
115	2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	F	Opere pluricomunali		150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	- 150.000,00	-100	Lavori erroneamente rendicontati nel capitolo delle Manutenzioni straordinarie
116	2020PRIA0176	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	A	Opere pluricomunali		1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.910.394,48	-	1.910.394,48	910.394,48	91	Interventi svolti secondo segnalazioni ricevute dal gestore al fine di risolvere situazioni di sistematiche rotture e perdite. L'andamento medio annuale richiede interventi sistematicamente superiori a quelli previsti a piano
117	2020PRIA0177	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	F	Opere pluricomunali		300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	- 300.000,00	-100	Lavori erroneamente rendicontati nel capitolo delle Manutenzioni straordinarie
118	2020PRIA0178	Rifacimento fognatura camminabile Via Solari tra Piazzale Fiume e Piazzale Barbieri	F	Parma	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	2020PRIA0179	Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per razionalizzare gli scarichi in sostituzione della fossa Imhoff esistente	F	Fontevivo	200.000,00	30.000,00	-	30.000,00	588,49	-	588,49	- 29.411,51	-98	Sopraluoghi personale. Opera da ripianificare in funzione della realizzazione dell'impianto di Fontevivo
120	2020PRIA0180	Sistemazione fognatura e sollevamento Via Santi/Caselli Chiozzola	F	Sorbolo	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di piena Parma e Provincia	F	Opere pluricomunali	800.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Ancora in fase di sperimentazione con posa di Data Logger di vari fornitori in comodato d'uso gratuito.
122	2020PRIA0182	Adeguamento impianto di Vairo inferiore	D	Palanzano	100.000,00	80.000,00	-	80.000,00	12.119,96	-	12.119,96	- 67.880,04	-84	Costi di progettazione. Ritardo dovuto a problemi di regolarizzazione acquisto aree da parte dell'amministrazione comunale
123	2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	D	Parma	350.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	- 150.000,00	-100	Importo ridotto in quanto il progetto di riduzione fanghi in oggetto ha subito rallentamenti a causa di problematiche dovute al Covid e interruzioni da parte dello Studio di progettazione per revisioni degli elaborati.
124	2020PRIA0184	Rifacimento disinfezione depuratore Parma OVEST	D	Parma	200.000,00	-	-	-	364,05	-	364,05	364,05	100	Eseguiti sopralluoghi
125	2020PRIA0185	Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi depuratore Parma OVEST	D	Parma	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	2020PRIA0186	Nuovo accumulo fanghi biologici depuratore Parma OVEST	D	Parma	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria al depuratore Parma EST	D	Parma	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	2020PRIA0188	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma OVEST	D	Parma	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	2020PRIA0189	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma EST	D	Parma	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento			
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
130	2020PRIA0190	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore di Felino	D	Felino	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
131	2020PRIA0191	Installazione gruppo elettrogeno dep Traversetolo capoluogo e rifacimento quadro elettrico	D	Traversetolo	120.000,00	60.000,00	-	60.000,00	46.630,71	-	46.630,71	-	13.369,29	-22	CAMB 75 Franchigia < 20.000 - Scostamento < 100%
132	2020PRIA0192	Installazione gruppo elettrogeno al depuratore di Medesano capoluogo	D	Medesano	60.000,00	-	-	-	78.850,09	-	78.850,09	78.850,09	100	100	Lavoro in corso pianificato in anni precedenti
133	2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	D	Parma	150.000,00	-	-	-	3.290,05	-	3.290,05	3.290,05	100	100	Avviata progettazione
134	2020PRIA0194	Ristrutturazione/ delocalizzazione letto percolatore Reno Borghetto	D	Tizzano Val Parma	150.000,00	-	-	-	16.803,11	-	16.803,11	16.803,11	100	100	Interventi sistemazione area
135	2020PRIA0195	Ristrutturazione/delocalizzazione fossa imhoff di Bosco	D	Corniglio	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00	-100	Eseguite attività propedeutiche alla progettazione
136	2020PRIA0196	Pretrattamento fanghi biologici Parma OVEST	D	Parma	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	2020PRIA0197	Potenziamento Centrale Fornello, nuove captazioni, aumento stoccaggio, trattamento	A	Felino	450.000,00	-	-	-	114,36	-	114,36	114,36	100	100	Sopraluoghi personale
138	2020PRIA0198	Messa fuori esercizio e abbattimento del serbatoio Pensile Ponte Taro sostituito da gruppo di rilancio a pressione	A	Fontevivo	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	2020PRIA0199	Adeguamento tecnico e funzionale del telecontrollo di Medesano	A	Medesano	175.000,00	130.000,00	-	130.000,00	12.599,27	-	12.599,27	-	117.400,73	-90	L'intervento è stato eseguito tra l'annualità 2021 e inizio 2022, la maggior parte della contabilità è entrata nel 2022.
140	2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	A	Noceto	225.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-100	Problematiche con privato che impediscono inizio attività
141	2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	A	Parma	30.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-100	Interventi realizzati secondo necessità
142	2020PRIA0202	Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale Idrica di Marore con nuova impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio e interventi per la riduzione dei consumi energetici e sostituzione membrane	A	Parma	450.000,00	-	-	-	213.963,85	-	213.963,85	213.963,85	100	100	Si è reso necessario a causa di un malfunzionamento dell'impianto di osmosi alla centrale di Marore la sostituzione urgente delle membrane. È stata eseguita l' impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio
143	2020PRIA0203	Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione del comune di Parma	A	Parma	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	2020PRIA0204	Interconnessione idraulica acquedotto Sala Baganza e acquedotto Collecchio (rete, impianto di rilancio e Telecontrollo)	A	Sala Baganza, Collecchio	420.000,00	-	-	-	3.606,61	-	3.606,61	3.606,61	100	100	Anticipo spese progettuali
145	2020PRIA0205	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Masdone con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico	A	Traversetolo	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	2020PRIA0206	Manutenzione straordinaria idraulica e edile della Centrale Idrica di Vignale	A	Traversetolo	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
147	2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	A	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo		100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Realizzati interventi secondo necessità
148	2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	A	Collecchio, Felino, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Traversetolo		50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	-100	Realizzati interventi secondo necessità
149	2020PRIA0209	Potenziamento del sistema acquedottistico della località Bassa e della frazione Rivalta	A	Lesignano de Bagni	900.000,00	100.000,00	-	100.000,00	931.128,50	-	931.128,50	831.128,50	831	Costi in funzione andamento cantiere
150	2020PRIA0210	Adeguamento sistema fognario area urbana canale Galasso	F	Parma		-	-	-	-	-	-	-	-	
151	2020PRIA0211	Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali		30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	- 30.000,00	-100	Non è emersa la necessità di studi diversi da quelli con titolo specifico
152	2020PRIA0212	Adeguamento sistema fognario zona via Figlie della Croce · via Matteotti · via Boudard	F	Sala Baganza	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	2020PRIA0213	Completamento sistema fognario acque nere loc. Castelguelfo	F	Fontevivo	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	2020PRIA0214	Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area urbana Via Verona	F	Parma	820.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Lavori terminati in annualità precedenti
155	2020PRIA0215	Completamento rete fognaria Via Ruffini	F	Parma	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	2020PRIA0216	Razionalizzazione sistema fognario zona Case Vecchie e Ravadese - studio fattibilità	F	Parma	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	2020PRIA0217	Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest	F	Parma	60.000,00	-	-	-	1.699,01	-	1.699,01	1.699,01	100	Code progettazione 2020. Opera non iniziata per accordi con Amministrazione comunale
158	2020PRIA0218	Razionalizzazione ed estensione sistema fognario e verifica sistema depurativo loc. Quinzano di Sopra	F	Langhirano	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	2020PRIA0219	Alimentazione nuova zona industriale Lesignano De Bagni	A	Lesignano de Bagni	550.000,00	200.000,00	-	200.000,00	36.736,27	-	36.736,27	- 163.263,73	-81	Code anno precedente
160	2020PRIA0220	Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker	A	Langhirano	250.000,00	-	-	-	2.934,43	-	2.934,43	2.934,43	100	Coda intervento intervento pianificato in annualità precedenti
161	2022PRIA0220	Opere di razionalizzazione sistema acquedottistico Lesignano De Bagni	A	Lesignano de Bagni	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	2022PRIA0221	Nuovo campo pozzi e centrale Parma Sud Ovest	A	Parma	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	2022PRIA0222	Reti collegamento pozzi Parma Sud Ovest verso la città	A	Parma	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	2022PRIA0223	Rifacimento condotta idrica centrale di Masdone	A	Traversetolo	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
165	2022PRIA0224	Manutenzione straordinaria e sistemazione accessibilità al Serbatoio Sesta Superiore	A	Corniglio	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	F	Calestano	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	2022PRIA0226	Nuovo serbatoio acqua potabile Madonna di Castrignano	A	Langhirano	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	2022PRIA0227	Estendimento fognario Strada Cartiera a Vigatto - studio di fattibilità	F	Parma	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	2022PRIA0228	Estendimento fognario Via Setti - Via Rocchi - studio di fattibilità	F	Parma	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale						21.244.291 €	605.281 €	20.639.010 €	24.975.242,66 €	394.166,83 €	24.581.075,83 €	119%		
Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura						19.860.625 €	605.281 €	19.255.344 €	23.649.585,51 €	394.166,83 €	23.255.418,68 €			

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
