

**CLFC/2019/4 del 28 marzo 2019**

**CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e approvazione del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE  
F.to William Sanzani

CLFC/2019/4

### CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sala Consiglio della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì - Cesena convocato con lettera protocollo PG/AT/00002019/1987 del 19/03/2019.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena	Gabriele Antonio Fratto	Presidente	SI'	10,0000
Bagno di Romagna			NO	1,5724
Bertinoro	Gabriele Antonio Fratto	Sindaco	SI'	2,5384
Borghi			NO	0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole	William Sanzani	Vicesindaco	SI'	1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	SI'	20,1987
Cesenatico			NO	5,5679
Civitella di Romagna	Antonio Dattoli	Consigliere	SI'	1,0861
Dovadola	Massimo Falciani	Assessore	SI'	0,6443
Forlì	William Sanzani	Assessore	SI'	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	SI'	2,9912
Galeata	Potito Scalzulli	Assessore	SI'	0,8216
Gambettola	Eugenio Battistini	Vicesindaco	SI'	2,4223
Gatteo			NO	2,1470
Longiano			NO	1,7173
Meldola	Vittorio Cicognani	Assessore	SI'	2,3730
Mercato Saraceno			NO	1,7505
Modigliana			NO	1,2797
Montiano	Mauro Ruscelli	Assessore	SI'	0,6526
Portico San Benedetto			NO	0,4594
Predappio			NO	1,6514
Premilcuore			NO	0,4665
Rocca San Casciano			NO	0,7146
Roncofreddo			NO	1,0038
San Mauro Pascoli			NO	2,5990
Santa Sofia			NO	1,1692
Sarsina	Enrico Cangini	Sindaco	SI'	1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	SI'	3,9321
Sogliano al Rubicone			NO	0,9739
Tredozio			NO	0,5610
Verghereto			NO	0,7092

Presenti n. 14 quote 74,79  
Assenti n. 17 quote 25,21

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. William Sanzani, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e approvazione del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n. 7 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena sono state approvate le modifiche del programma degli interventi 2014 e il consuntivo 2014, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito;
- con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - Cesena, conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all’approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;

- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- è stato eseguito un intervento aggiuntivo (nuovo ID), per un importo pari a 266.399 €, rispetto a quanto previsto dal POI 2015-19 approvato con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì Cesena;
- vi sono stati n. 4 interventi caratterizzati da avvio anticipato o chiusure dei lavori per interventi già contenuti nel POI; in particolare di questi solo 1 (ID 2015FCHA0032) rappresenta un intervento anticipato rispetto al POI per un importo totale di € 5.726;
- dall'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma è emersa la necessità di effettuare approfondimenti sulle motivazioni adottate dal gestore, a giustificazione degli scostamenti rispetto a quanto disposto in fase di pianificazione, in quanto le medesime sono state giudicate non esaustive;

**dato atto** che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione ed aggiunta degli interventi di cui sopra) nel corso dell'anno 2016, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2016, che non ha comportato ritardi su altri interventi;
- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 14 (quote 74,79), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto che le modifiche apportate dal Gestore consistenti nell'anticipazione dell'intervento citato in premessa nel corso dell'anno 2016 e nell'avvio di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal POI 2015-19, approvato con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì, comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2016;
2. di approvare pertanto il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto
3. dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere i necessari approfondimenti sulle motivazioni addotte dal gestore a giustificazione degli scostamenti rilevati sullo stato di avanzamento dei quattro interventi citati nella relazione di accompagnamento allegato 1 al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2016**

**GESTORE: HERA S.P.A.  
SOTTOAMBITO: FORLI'-CESENA**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 9.473.000	-€ 630.342	€ 8.842.658	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 880.000	-€ 181.563	€ 698.437	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 8.593.000	-€ 448.779	€ 8.144.221	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 4.473.000	-€ 3.441.784	€ 1.031.216	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
<b>Totale pianificato</b>	<b>€ 13.946.000</b>	<b>-€ 4.072.127</b>	<b>€ 9.873.873</b>	<b>Totale consuntivato</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 30 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha eseguito investimenti inferiori per un 5% rispetto a quanto pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

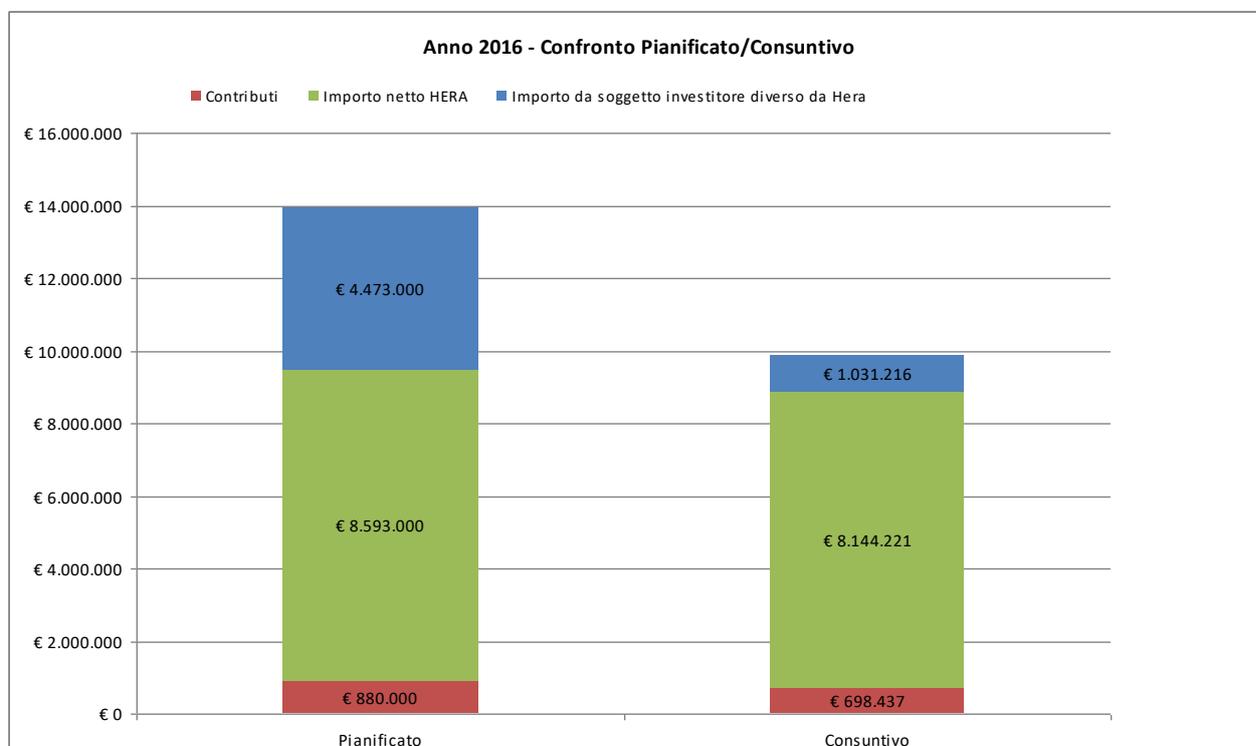


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2016 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2016*): 78

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 83

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	6	€ 0	€ 82.000	0	
2	Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	4	€ 17.376	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1	€ 266.399	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	50	€ 5.462.499	€ 9.550.000	4	2014FCHA0077; 2015FCHA0017; 2015FCHA0022; 2015FCHA0023
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	22	€ 4.127.600	€ 4.314.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2016 n.ro 6 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 4 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; in particolare di questi solo 1 (ID 2015FCHA0032) rappresenta un intervento anticipato rispetto al POI per un importo totale di € 5.726;
- è stato avviato un intervento che non era previsto nel Piano d'Ambito (nuovo ID)
- vi sono n.ro 4 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto agli 83 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 60 % di questi (50 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 43 % rispetto al pianificato.

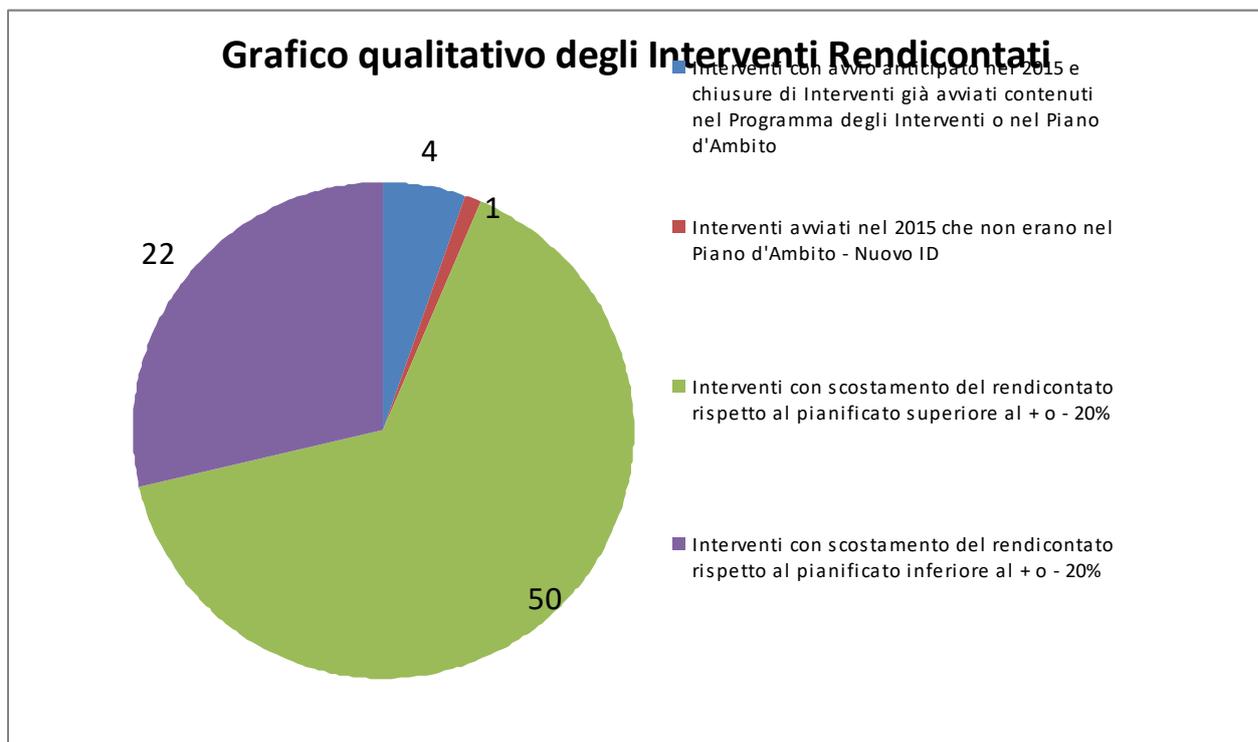


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO. (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI
2014FCHA0020	REALIZ.CENTRALE STRADONE M.REGGIANO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Borghi	10.000
2014FCHA0021	COLLETT. BORGHI E TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Borghi	20.000
2014FCHA0030	IMP. FITODEPURAZIONE BAGNILE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	5.000
							17.000
2014FCHA0049	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2*ST	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	
							20.000
2014FCHA0064	RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Forlì	
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014FCHA0001	MAGNANA BAGNO DI ROMAGNA-ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0002	RINN RETE H2O V.CASELLINA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0003	RINN RETE SERB.SCOPEO-BAGNO R--ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0004	RISAN. SC. 6-8-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0005	RISAN.SC 4-5-7-9-B.ROMAGNA-LOC.VARIE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	25.000	0	25.000	5.393	0	5.393	-19.607	-78%	
2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0003	RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0005	RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0006	RISAN. SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	10.000	0	10.000	-63.354	0	-63.354	-73.354	-734%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DAL GESTORE HERA MA VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "UNICA RETI". E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0002 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 SONO PROSEGUITE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE COME DA PIANO ATERSIR.
2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bagno di Romagna	250.000	0	250.000	16.106	0	16.106	-233.894	-94%	IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE ENTI
2014FCHA0008	POT CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bertinoro	20.000	0	20.000	-4.361	0	-4.361	-24.361	-122%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DAL GESTORE HERA MA VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "UNICA RETI". E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0003 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 SONO PROSEGUITE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE COME DA PIANO ATERSIR.
2014FCHA0009	POT CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA - R. ACQUE	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0010	POT.RETE ACQUEDOTTO S.MARIA-LOTTO1 TR.A	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0011	POT.RETE ACQUEDOTTO S.MARIA-LOTTO1 TR.B	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0012	POTEN.RETE ACQ.S.MARIA NUOVA - LOTTO 2	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	23.000	0	23.000	5.506	0	5.506	-17.494	-76%	
2014FCHA0013	POT.RETE ACQ.S.MARIA NUOVA LOTTO 3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	175.000	0	175.000	12.939	0	12.939	-162.061	-93%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI DI APPROVAZIONE COMUNE
2014FCHA0014	POT.RETE ACQ.S.MARIAN.LOTTO 3 PROV.-ANN	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0015	POT.RETE AC V.DISMANO-S. PIETRO IN G.	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	65.000	0	65.000	41.394	0	41.394	-23.606	-36%	RITARDO LEGATO AL REPERIMENTO DEI PERMESSI /AUTORIZZAZIONI
2014FCHA0124	RINN RETE H2O COLLINELLO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0016	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0017	RIS.SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA,BERTINORO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	960.000	0	960.000	314.556	0	314.556	-645.444	-67%	RITARDO LEGATO AL REPERIMENTO DEI PERMESSI /AUTORIZZAZIONI
2014FCHA0018	RISAN.SC.36-37-38 POLENTA E COLLINELLO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0008	RISAN.SC.36 POLENTA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0009	RISAN.SC.37-38 COLLINELLO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0019	REALIZ. CENTRALE POMP. LOC.FORANO BORGHI	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Borgi	0	-49.000	-49.000	0	-31.647	-31.647	0	0	
2014FCHA0020	REALIZ.CENTRALE STRADONE M.REGGIANO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Borgi	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. IMPORTO IPOTIZZATO NON UTILIZZATO
2014FCHA0021	COLLETT. BORGHI E TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Borgi	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	IN ATTESA DI SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO ATTUATIVO
2014FCHA0022	BON. RETE ALL. V.FANTAGUZZI	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0023	BON.RETE E ALL. V.AMBUGI - CESENA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0024	BON.RETE ALL.VMACRELLI CORB.COMAN.CESENA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0025	POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	85.000	0	85.000	37.417	0	37.417	-47.583	-56%	AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO LEGATO ALLA CONCOMITANZA DEGLI INTERVENTI ACQUE E FOGNATURA CON ID 2014FCHA0028 E 2014FCHA0039 SU PIEVESISTINA.
2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	6.000	0	6.000	21.818	0	21.818	15.818	264%	
2014FCHA0027	RINN.RETE AC - V. ACQUAROLA CESENA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cesena	282.000	0	282.000	60.249	0	60.249	-221.751	-79%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO TEMPI GARA (GARA EUROPEA)
2014FCHA0029	ADEG. DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2° STRA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	597.000	0	597.000	79.803	0	79.803	-517.197	-87%	MODESTO SLITTAMENTO AVVIO GARA D'APPALTO E SOVRASTIMA IMPORTO PIANIFICATO. TERMINE COMMESSA COERENTE CON LA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0030	IMP. FITODEPURAZIONE BAGNILE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. IMPORTO IPOTIZZATO NON UTILIZZATO
2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cesena	33.000	0	33.000	49.319	0	49.319	16.319	49%	
2014FCHA0032	RISAN SC.163 - V. DE CESARI FRAZ.BULGARN	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	-35.490	-35.490	0	0	
2014FCHA0033	RISAN. SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0034	RISANAMENTO SCARICO 50-55-136-137-138 AG	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0	
2014FCHA0035	RISAN. SCARICO 87 AIE TIPANO (RETE-ALL)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0036	POTENZ. SOLL. E DORSALE S. GIORGIO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	550.000	-70.000	480.000	473.279	0	473.279	-76.721	-14%	
2014FCHA0037	RINN RETE FOG V.CALCINARO CESENA-ANN	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0038	STUDIO PRELIMINARE FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	40.000	0	40.000	10.609	0	10.609	-29.391	-73%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE, IN ATTESA ACCORDI CON ENTI PER LA SOLUZIONE PROGETTUALE.
2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cesena	896.000	0	896.000	11.473	0	11.473	-884.527	-99%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO TEMPI GARA (GARA EUROPEA)
2014FCHA0040	RISAN.FOGNATURA MISTA VIA UBERTI-CESENA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0128	RISAN. SC 26 FRAZIONE S.CRISTOFORO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CES	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	40.000	0	40.000	44.599	0	44.599	4.599	11%	
2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO ERI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesena	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0041	RISAN. SC.D1 - ADEG. DEP.CESENATICO	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesenatico	759.000	0	759.000	999.600	0	999.600	240.600	32%	MAGGIORI ONERI PER NECESSITA' DI SISTEMARE LA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE AMMALORATASI DURANTE I LAVORI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA (PARAPETTI) E DEMOLIZIONI DI STRUTTURE MESSE FUORI SERVIZIO DALLA NUOVA CONFIGURAZIONE, INTERVENTI AGGIUNTIVI AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA DEGLI ODORI (BYPASS SEDIMENTATORI PRIMARI, RAFFREDDAMENTO ARIA VERSO STABILIZZAZIONE).
2014FCHA0042	POTENZ.SOLL.59-ADEG. Q.E.-MIS.PORTATA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesenatico	0	-304.000	-304.000	0	-219.601	-219.601	0	0	
2014FCHA0043	NUOVA RETE MISTA V.SQUERO-SUCCI-SEMPRINI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Cesenatico	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0044	RINN.RETE PER DISSESTO FRANOSO-GIAGGIOLO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Civitella	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0045	RINN. RETE AC - VIA CARINI CIVITELLA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Civitella	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0012	STUDIO DI FATTIBILITA' ACQUEDOTTI RURALI CIVITELL	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Civitella	5.000	0	5.000	3.946	0	3.946	-1.054	-21%	
2015FCHA0013	RISAN. AGGLOMERATO CIVITELLA DI ROMAGNA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Civitella	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0046	RINN.RETE ACQUA V.TREGGIOLO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0047	RISAN SC 10-11-15 LOC.CASONE - DOVADOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0048	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12 DOVADOLA 1°STR	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	0	0	0	7.985	0	7.985	7.985		RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014FCHA0049	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2*ST	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	17.000	0	17.000	0	0	0	-17.000	-100%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DAL GESTORE HERA MA VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "UNICA RETI". E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0007 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 NON SONO STATE EFFETTUATE ATTIVITA'. LA PROGETTAZIONE E' STATA AVVIATA NEL CORSO DEL 2017
2014FCHA0129	MODELL. SISTEMA FOGNARIO DOVADOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0050	RINN RETE E ALL.ACQUA V.PALAZZOLA FORLI'	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0051	RINN PENSILE VILLA SELVA FORLI'	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0052	POTENZ. SERB. SADURANO FORLI'-ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0053	RISAN. SC. D1 - POTENZ. SEDIMAZIONE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0056	ADEG. SOLL. S. MARINO 1A - V.BOLOGNA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0057	ADEG. DEPURATORE PIEVEQUINTA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	35.000	0	35.000	12.122	0	12.122	-22.878	-65%	AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI OTTENUTA NEL 2017, PERTANTO I LAVORI SI CONCLUDERANNO NELL'ANNO CORRENTE.
2014FCHA0130	TRATTAMENTO ODORI-DEP FORLI	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	199.000	0	199.000	198.015	0	198.015	-985	0%	
2017FCHA0001	SOSTIT.TUBAZ.RICIRCOLO FANGHI DEP.FORLI'	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	266.399	0	266.399	266.399		NUOVO ID COME DA RICHIESTA PEC DEL 24/03/2017: "INTERVENTO INDIFFERIBILE/URGENTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FORLI. SI RITIENE OPPORTUNO TRACCIARE IN MODO DISTINTO QUESTO INTERVENTO, PER LA RILEVANZA SIA ECONOMICA CHE FUNZIONALE, SCORPORANDOLO DAL CORRISPONDENTE TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014FCHA0089 - MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO8".
2014FCHA0054	POT.SOLL.FOGNA CARPENA-V.REDEFOSI 6A	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	4.000	0	4.000	745	0	745	-3.255	-81%	
2014FCHA0055	ADEG. SOLL. S. BARTELO - V. BOLOGNA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	6.000	0	6.000	7.468	0	7.468	1.468	24%	
2014FCHA0058	RISAN SC 222 CARPINELLO - V. B. DA DURA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0059	SOLL.FOGLN. VILLAFRANCA - V. 13 NOVEMBRE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	10.000	0	10.000	3.611	0	3.611	-6.389	-64%	
2014FCHA0060	RISAN. SC 211-212 LOC. MARATELLO -V.MOND	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0062	POTENZ. SOLLEVAMENTO GORIZIA, FORLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0063	RINN RETE FOGNA V.PALAZZOLA FORLI'	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0064	RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Forli	20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-100%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "ROMAGNA ACQUE" MA VERRA' FINANZIATO DAL GESTORE HERA. E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0012 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 NON SONO STATE EFFETTUATE ATTIVITA'.
2014FCHA0065	RISAN.SCARICHI 213-214 BORGO SISA-FORLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Forli	46.000	0	0	431	0	0	-45.569	-99%	PROBLEMA DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REALIZZATO PARZIALMENTE DAL PRIVATO MA CHE RISULTA ESSERE FALLITO. IN CORSO TENTATIVO DI ACCORDO DA PARTE DEL COMUNE.
2014FCHA0091	STUDIO RINSAN. FOSSI TOMBATI FORLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0066	REALIZZ.FOGLNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Forlimpopoli	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0067	POT RETE H2O V.SOPRARIGOSSA GAMBETTOLA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gambettola	135.000	0	135.000	86.360	0	86.360	-48.640	-36%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. CONCLUSIONE NEL 2017, AVANZAMENTO ECONOMICO COERENTE CON L'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE.
2014FCHA0068	SCARICO 2 VIA SOPRARIGOSSA GAMBETTOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gambettola	310.000	0	310.000	272.365	0	272.365	-37.635	-12%	
2014FCHA0069	INTERV. SU SC. 3 V.DELLE VIOLE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gambettola	140.000	0	140.000	19.778	0	19.778	-120.222	-86%	SLITTAMENTO PER SOSPENSIONE ITER AUTORIZZATIVO PER RICHIESTA ATERSIR RICLASSIFICAZIONE SCOLO CONSORZIALE.
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gambettola	5.000	0	5.000	4.902	0	4.902	-98	-2%	
2014FCHA0071	NUOVA RETE FOG NERA V.CORBARI GATTEO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0072	NUOVA RETE FOGN.N.V.GIOVANNI23 GATTEO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0073	NUOVA RETE FOG NERA V.ALLENDE GATTEO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0074	RINN RETE X FRANA PIAN DI SPINO-MELDOLA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Meldola	40.000	0	40.000	22.956	0	22.956	-17.044	-43%	
2014FCHA0075	CEPPARETO MELDOLA-ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Meldola	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015FCHA0014	RADDOPPIO VASCA CAMINATE	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Meldola	120.000	0	120.000	7.628	0	7.628	-112.372	-94%	FASE GARA: I TEMPI DI ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA HANNO RICHIESTO UN AGGRAVIO DI TEMPO PER L'AGGIUDICAZIONE; FASE AUTORIZZATIVA: I TEMPI DI ELABORAZIONE E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE SISMI, DELLA DELIBERA COMUNALE E IL PASSAGGIO DELLA PRATICA IN ATERSIR HANNO RESO NECESSARIO RI-PIANIFICARE I LAVORI.
2014FCHA0076	ADEG.POTENZ.IMHOFF TEODORANO-SC6<2000AE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Meldola	8.000	0	8.000	8.366	0	8.366	366	5%	
2014FCHA0077	RIFAC. ATTRAVERS. FOG. RIO PARA MELDOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Meldola	25.000	0	25.000	3.582	0	3.582	-21.418	-86%	A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI TECNICI SI È DECISO DI RIVEDERE LA SOLUZIONE PROGETTUALE RINVIANDO I LAVORI AL 2017
2014FCHA0078	ADEG. DEPURATORE BACCILINO DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Mercato Saraceno	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0079	DISM. DEP. BORGO STECCHI MERCATO SAR.	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Mercato Saraceno	55.000	0	55.000	30.223	0	30.223	-24.777	-45%	MODESTO SLITTAMENTO AVVIO GARA D'APPALTO
2014FCHA0133	REGOLARIZZ. SCOLMATORI MERCATO SARACENO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Mercato Saraceno	10.000	0	10.000	14.684	0	14.684	4.684	47%	
2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Mercato Saraceno	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0080	MONTE ZAULI MODIGLIANA-ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Modigliana	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0081	ADEG. COLLET. MODIGLIANA E DEP. 2° LOTTO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Modigliana	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0082	RIN.RETE ALL.GALILEI-MARCONI-VOLTA-DAVIN	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Montiano	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0083	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	950.000	0	950.000	890.783	0	890.783	-59.217	-6%	
2014FCHA0084	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.360.000	0	1.360.000	1.485.442	0	1.485.442	125.442	9%	
2014FCHA0085	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	385.000	0	385.000	474.332	0	474.332	89.332	23%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0086	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	180.000	0	180.000	149.445	0	149.445	-30.555	-17%	
2014FCHA0087	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	106.280	0	106.280	6.280	6%	
2014FCHA0088	POT.RETE AC BORG.ROSE-MOLINO DI SOPRA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	215.000	0	0	14.743	0	0	-200.257	-93%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO TEMPI GARA (VERIFICA OFFERTE ANOMALE)
2014FCHA0123	SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	125.000	0	125.000	123.856	0	123.856	-1.144	-1%	
2014FCHA0126	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ.FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	15.000	0	15.000	2.186	0	2.186	-12.814	-85%	
2014FCHA0131	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	30.000	0	30.000	46.979	0	46.979	16.979	57%	
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FC	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	13.137	0	13.137	3.137	31%	
2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI FC-ATO8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	4.326	0	4.326	-95.674	-96%	RIPIANIFICAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ
2015FCHA0018	TELELETTURA CONTATORI GRANDI CALIBRI FC ATO 8	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014FCHA0089	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	735.000	0	735.000	1.208.981	0	1.208.981	473.981	64%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0090	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	105.000	0	105.000	77.605	0	77.605	-27.395	-26%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	15.000	0	15.000	12.214	0	12.214	-2.786	-19%	
2014FCHA0092	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	331.000	0	331.000	793.758	0	793.758	462.758	140%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	50.000	0	50.000	58.524	0	58.524	8.524	17%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014FCHA0094	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	330.000	0	330.000	315.781	0	315.781	-14.219	-4%	
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	ATTIVITÀ TRASLATA A SUCCESSIVE ANNUALITÀ. NESSUN IMPATTO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO
2014FCHA0096	POTEN.SOLLEVAMENTO CESOLINO-2'STRALCIO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	0	0	0	1.392	0	0	1.392		RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE
2014FCHA0097	POTEN.SOLLEVAMENTO CESOLINO-1'STRALCIO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	536.000	0	0	325.349	0	0	-210.651	-39%	MINORE SPESA PER CONSOLIDAMENTO DEL RIBASSO DI GARA
2014FCHA0098	COLL.REFLUI A DEP. DI BACCIOLI-RANCHIO B	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	1.140.000	0	0	142.400	0	0	-997.600	-88%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO TEMPI GARA (VERIFICA OFFERTE ANOMALE)
2014FCHA0132	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	300.000	0	300.000	362.194	0	362.194	62.194	21%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-FC-ATO8	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	15.000	0	15.000	11.745	0	11.745	-3.255	-22%	
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO/BOCCONI/S.BEN	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Portico e San Benedetto in	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0099	BONIF. RETE IDR V.SANZIO PREDAPPIO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Predappio	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0100	LOC.FIUMANA-POTEN.RETE ACQUA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Predappio	62.000	0	0	51.465	0	0	-10.535	-17%	
2014FCHA0101	ADEG.AREA ED IMP.SOLL.EX DEP.PREDAPPIO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Predappio	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Predappio	80.000	0	80.000	20.653	0	20.653	-59.347	-74%	PROBLEMI LEGATI ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARSI.
2015FCHA0023	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Predappio	50.000	0	50.000	15.862	0	15.862	-34.138	-68%	PROBLEMI LEGATI ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARSI.
2014FCHA0102	SPOST.RETE A SP3-FOSSO DELLE CAMINATE	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Premilcuore	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0024	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER S.CA	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Rocca San Casciano	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0103	ADEG. SERB. MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0104	CONSOLIDAMENTO AREA DEP. DIOLAGUARDIA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	2.273	0	2.273	2.273		CODA CONTABILE. INTERVENTO REALIZZATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
2014FCHA0105	RIS.SCARICO 6 - VIA VALLE - FRAZ.S.PAOLA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0106	RISAN.SC.1-2-4-5-21, RONCOFREDDO-COMPL.	FOGNATURA	ATO 8 - FC	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0025	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	222.000	0	222.000	24.316	0	24.316	-197.684	-89%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI AUTORIZZAZIONE PROVINCIA
2015FCHA0026	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0027	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0028	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S-TA PAOLA AGGLOM.	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	15.000	0	15.000	11.194	0	11.194	-3.806	-25%	
2014FCHA0107	RINN RETE H2O V.LORCA MORETTI PASOLINI	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	San Mauro Pascoli	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0108	ADEG. DEPURATORE SANTA SOFIA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Santa Sofia	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0109	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Santa Sofia	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DAL GESTORE HERA MA VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "UNICA RETI". E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0020 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 SONO STATE AVVIATE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0110	ADEG. DEP. SARSINA - DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0111	ADEG.CAP.E SPOST. SC7 SARSINA (IMHOFF)	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0112	RISAN. SCARICO 6 - SORBANO LOC. MOLINO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0113	RIS. SC. 3 SARSINA - SOLL. + PREMENTE	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	10.000	0	10.000	772	0	772	-9.228	-92%	
2014FCHA0114	RIS. SC.2: DEVIAZIONE RETE SC 2, SARSINA	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	30.000	0	30.000	9.660	0	9.660	-20.340	-68%	RITARDI LEGATI ALLE TEMPSTICHE AUTORIZZATIVE.
2014FCHA0127	RISAN. FOGNATURA SORBANO (SOLO LINEA)	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0134	NUOVA RETE H2O V.ANTOLINA SAVIGNANO R.	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0115	ADEG. DEP. DI SAVIGNANO - COMPLET. LINEA	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	0	-261.000	-261.000	0	-411.699	-411.699	0		
2014FCHA0116	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	56.000	0	56.000	-19.978	0	-19.978	-75.978	-136%	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO NON VERRA' PIU' FINANZIATO DAL GESTORE HERA MA VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET "UNICA RETI". E' STATO PERTANTO CREATO UN NUOVO ID 2017FCHA0022 SUL QUALE VERRA' EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE TECNICO-ECONOMICA. NEL CORSO DEL 2016 SONO PROSEGUITE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE GIA' AVVIATE NEL 2015
2015FCHA0032	NUOVO BUSTER PER SERBATOIO MELETO	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sogliano al Rubicone	0	0	0	5.726	0	5.726	5.726		ANTICIPATA LA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI (PREVISTI PER IL 2017) PER PREVENIRE EVENTUALI CRITICITÀ E POSSIBILI TRASCINAMENTI. IN REALTÀ, DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE E ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI COSTRUTTIVE, SI È OPTATO PER UNA SOLUZIONE IMPIANTISTICA PIÙ SEMPLICE (REALIZZAZIONE DI UN BOOSTER, RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO), CON ONERI DI PROGETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE INFERIORI. IL RESTANTE BUDGET 2016 È STATO DESTINATO AD UNA PRIMA FORNITURA DI MATERIALE.
2014FCHA0117	RIFAC. FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Sogliano al Rubicone	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0118	ADEG. DEP. TREDOZIO - DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Tredozio	228.000	0	228.000	37.381	0	37.381	-190.619	-84%	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SU QUESTO ID VENGONO RENDICONTATE ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE POICHE' LE OPERE VERRANNO REALIZZATE MEDIANTE UN NUOVO ID FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET UNICA RETI. NEL 2016 SI SONO COMPLETATE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E QUINDI IL "COMPLETAMENTO" DI QUESTO ID. DAL 2017 INIZIERA' LA RENDICONTAZIONE SUL NUOVO ID DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.
2014FCHA0119	CAPANNE VERGHERETO-ASSE3	ACQUEDOTTO	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0120	RISAN.SC.1-2-3-15-16-17-18 VERGHERETO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0121	RISAN. SC. 7-33 - FRAZ. ALFERO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	15.000	0	15.000	5.185	0	5.185	-9.815	-65%	
2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0033	RISAN. SC.1-15-16 VERGHERETO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0034	RISAN. SC.17 VERGHERETO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0035	RISAN. SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	ATO 8 - FC	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Totale</b>							<b>13.946.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>8.593.000</b>	<b>9.873.873</b>	<b>-698.437</b>	<b>8.144.221</b>	<b>-4.072.127</b>		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 4 del 28 marzo 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e approvazione del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 28 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to William Sanzani

Il segretario verbalizzante  
F.to Ing. Stefano Santandrea

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 luglio 2019
