

**CLPR/2019/7 del 6 marzo 2019**

**CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria  
Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Iren S.p.A.**

IL COORDINATORE  
F.to Tiziana Benassi

**CLPR/2019/7**

### **CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

L'anno **2019** il giorno sei del mese di marzo alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 -, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2019/1591 dell'1.03.2019.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI	Solari Federico	Assessore	SI'	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO			NO	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Zanetti Michela	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO			NO	1,8860
COMPIANO			NO	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Raminzoni Valentino	Vice Sindaco	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO	Agoletti Matteo	Vice Sindaco	SI'	1,2243
FORNOVO DI TARO	Grenti Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI	Moretti Claudio	Sindaco	SI'	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO			NO	2,6033
PALANZANO	Franzini Lino	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA	Gattara Alessandro	Vice Sindaco	SI'	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Porta Enrica	Vice Sindaco	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Bernardi Nicola	Sindaco	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI			NO	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE			NO	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSI			NO	0,4384

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA	Delsante Giuseppe	Consigliere	SI'	10,000

Presenti n. 16 quote 68,37 Assenti n. 30 quote 31,63

Riconosciuta la validità della seduta, la Sig.ra Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Iren S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;
- con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2018 del Consiglio d'ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;

**dato atto che:**

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2017 che:

- non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-2019, approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017, fatto salvo gli interventi aggiuntivi, fatto salvo le revisioni ordinarie in conformità alla Deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 di Consiglio d'Ambito "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato";
- non sono stati avviati n.22 interventi per un importo complessivo lordo di € 1.435.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.21 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 1.647.311;
- per n.42 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2017;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Marco Grana Castagnetti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti unanimi e favorevoli**, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti e la revisione ordinaria per l'annualità 2017 del gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato:  
Consuntivo investimenti annualità 2017  
Gestore: IREN S.p.A. (PR)**

**6 marzo 2019**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 16.978.500	<b>+ € 912.232</b>	€ 17.890.732	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 820.000	<b>- € 637.569</b>	€ 182.431	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 16.158.500	<b>+ € 1.549.801</b>	€ 17.708.301	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti rispetto alla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a +€.912.232, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di + € .1.549.801 a fronte dei minori contributi incassati pari a -€ 637.569.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

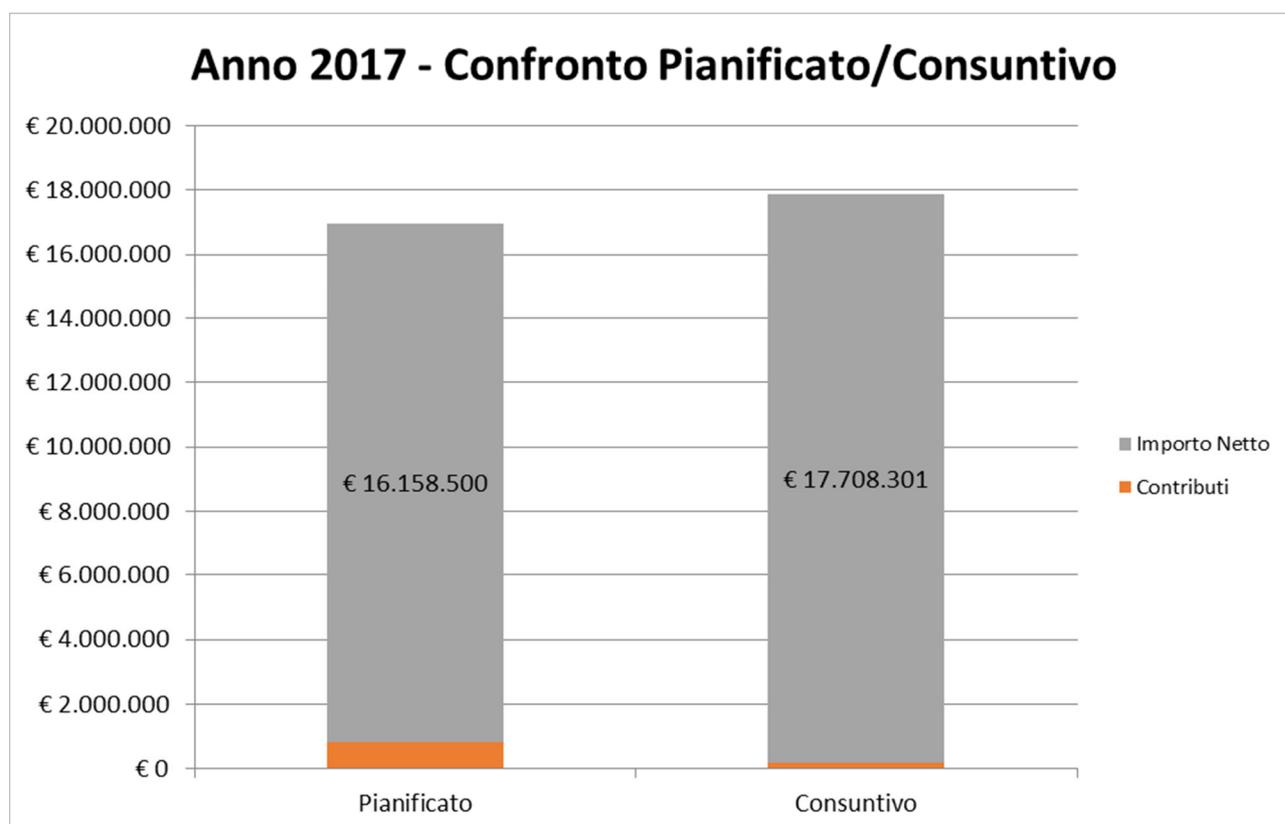


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

## ULTERIORI INTERVENTI - EMERGENZA IDRICA - FINANZIATI INTERAMENTE DALLA PROTEZIONE CIVILE

### INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017, e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 149/2017 e DPGR n.178/2017 – che sono attualmente in corso di rendicontazione.

### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2017: 68

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2017: 67

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	22	€ 0	€ 1.435.000	NO	2014PRIA0002 2014PRIA0005 2014PRIA0009 2014PRIA0043 2014PRIA0058 2014PRIA0066 2014PRIA0076 2014PRIA0102 2014PRIA0106 2016PRIA0108 2016PRIA0110 2016PRIA0113 2016PRIA0116 2016PRIA0121 2016PRIA0129 2016PRIA0136 2016PRIA0140 2016PRIA0141 2016PRIA0142 2016PRIA0147 2016PRIA0148 2016PRIA0154	
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	21	€ 1.647.311	€0	NO	2014PRIA0010 2014PRIA0018 2014PRIA0019 2014PRIA0031 2014PRIA0036 2014PRIA0041 2014PRIA0046 2014PRIA0047 2014PRIA0052 2014PRIA0059 2014PRIA0062 2014PRIA0077 2014PRIA0087 2014PRIA0089 2014PRIA0092 2016PRIA0111 2016PRIA0117 2016PRIA0123 2016PRIA0124 2016PRIA0128 2016PRIA0143	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	42	€ 14.523.280	€ 13.673.500	NO	2014PRIA0001 2014PRIA0006 2014PRIA0007 2014PRIA0020 2014PRIA0023 2014PRIA0026 2014PRIA0027 2014PRIA0029 2014PRIA0033 2014PRIA0042 2014PRIA0049 2014PRIA0051 2014PRIA0055 2014PRIA0056 2014PRIA0061 2014PRIA0063 2014PRIA0065 2014PRIA0067 2014PRIA0071 2014PRIA0074 2014PRIA0078 2014PRIA0083 2014PRIA0084 2014PRIA0086 2014PRIA0091 2014PRIA0095 2014PRIA0096 2014PRIA0097 2014PRIA0098 2014PRIA0101 2014PRIA0103 2014PRIA0104 2014PRIA0105 2014PRIA0107 2016PRIA0114 2016PRIA0119 2016PRIA0122 2016PRIA0125 2016PRIA0127 2016PRIA0130 2016PRIA0135 2016PRIA0157	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	4	€ 1.720.141	€ 1.870.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, nel 2017, non ha avviato n.22 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso rispetto a quanto programmato, per l'annualità 2017, n.21 interventi, nessun intervento non compreso nella programmazione è stato avviato e n.42 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. Per n.4 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

Si segnala inoltre che nel corso dell'anno 2017, con nulla osta prot.PG.AT/2017/0003410 del 08/06/2017, è stata autorizzata, ai sensi della CAMB 75/2017 (caso B), l'anticipazione in corso d'anno (annualità 2017) dell'intervento Codice Arsi ID:2014PRIA0078, già previsto nel Programma Operativo Interventi 2015-2019.

Sempre con nulla osta PG.AT/2017/0007571 del 22/11/2017, è stato autorizzato, ai sensi della CAMB 75/2017 (caso C) l'intervento: "Nuova realizzazione di collettore fognario per acque nere in strada Mons. Marocchi", in Comune di Parma, di importo complessivo pari ad €.118.000, da rendicontare all'interno del codice ID:2014PRIA0097 "Manutenzioni Straordinarie".

Tali interventi costituiscono revisione ordinaria del Programma Operativo Interventi – annualità 2017.

Con lo stesso nulla osta si è inoltre preso atto della non più necessità dell'intervento: "Manutenzione straordinaria via Trieste via Montello" ID:2016PRIA0154.

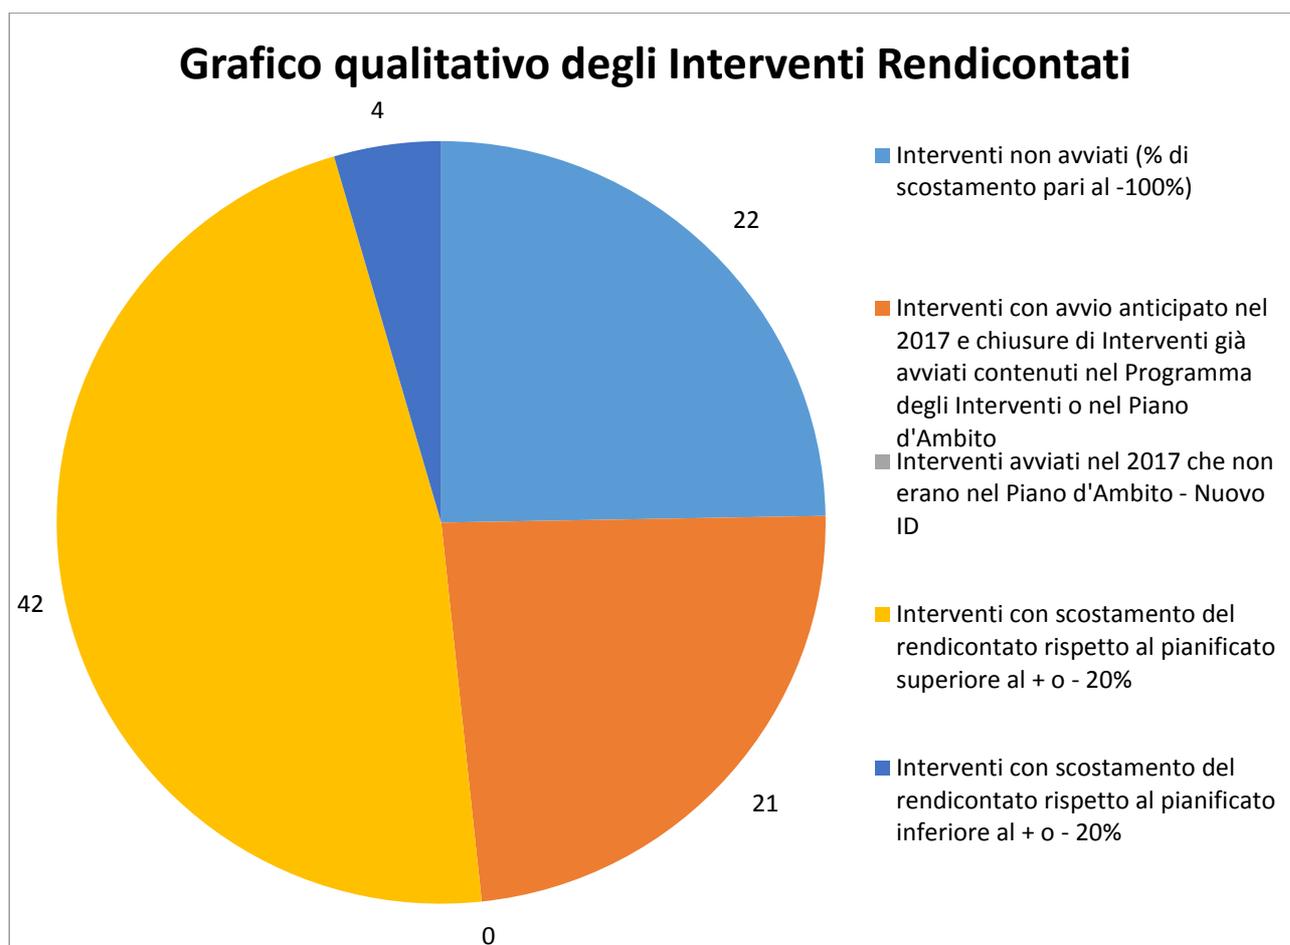


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2017
Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	2.000.000,00	50.000,00 €
Calestano, Felino, Sala Baganza	2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	2.500.000,00	20.000,00 €
Corniglio	2014PRIA0009	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	70.000,00	70.000,00 €
Neviano degli Arduini	2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	70.000,00	70.000,00 €
Noceto	2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	30.000,00	30.000,00 €
Parma	2014PRIA0066	47IAG - Manutenzione straordinaria nuovo sollevamento Depuratore Parma OVEST	120.000,00	50.000,00 €
Parma	2014PRIA0076	57IAG - via Gastaldi e via Colorno, estendimento fognature	220.000,00	20.000,00 €
Opere Pluricomunali	2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	1.321.043,06	200.000,00 €
Opere pluricomunali	2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua	2.249.845,00	265.000,00 €
Langhirano, Felino	2016PRIA0108	Impianto trattamento acqua gallerie Braia/pozzi Fabiola	500.000,00	20.000,00 €
Parma	2016PRIA0110	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7)	100.000,00	80.000,00 €
Parma	2016PRIA0113	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	50.000,00	50.000,00 €
Parma	2016PRIA0116	Interventi di sistemazione strutturale rete fognaria Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	100.000,00	60.000,00 €
Parma	2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	100.000,00	80.000,00 €
Sorbolo	2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	1.500.000,00	20.000,00 €
Palanzano	2016PRIA0136	Realizzazione nuovi impianti di clorazione per consolidare corretto mantenimento dei parametri allegato 1 parte A D.Lgs 31/01	195.000,00	60.000,00 €
Palanzano	2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	20.000,00	20.000,00 €
Palanzano	2016PRIA0141	Messa a norma serbatoio Caneto	80.000,00	10.000,00 €
Palanzano	2016PRIA0142	Opere di protezione prese Lalatta	100.000,00	90.000,00 €
Parma	2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	70.000,00	60.000,00 €
Parma	2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	70.000,00	60.000,00 €
Parma	2016PRIA0154	Interventi di manutenzione straordinaria via Trieste via Montello	50.000,00	50.000,00 €

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)







ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	ACQUEDOTTO	Monchio delle Corti	40.000 €	0 €	0 €	0 €	680 €	0 €	680 €	100%	Rimandato per necessità di riprogettazione condotta adduttrice.
2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto	DEPURAZIONE	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	11.705.079 €	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	390.747 €	0 €	390.747 €	-72%	Nel corso del 2017 acquisito terreno e terminato progetto definitivo. Ritardi come da giustificativo 2016
2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Rimandato al 2018 per problemi spostamento fossa imhoff con proprietà
2014PRIA0044	28IAG - Sistema depurativo Lodrignano Cabina	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0045	29IAG - Sistema depurativo Magrignano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0046	30IAG - Sistema depurativo Montezebio	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	50.000 €	0 €	0 €	0 €	7.783 €	0 €	7.783 €	100%	Opera anticipata per urgenze gestionali
2014PRIA0047	31IAG - Sistema depurativo Mozzano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	50.000 €	0 €	0 €	0 €	16.315 €	0 €	16.315 €	100%	Opera realizzata nel 2017 - vedi giustificazioni 2016
2014PRIA0048	32IAG - Sistema depurativo Sella Di Lodrignano	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	150.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	25.969 €	0 €	25.969 €	-74%	Attesa autorizzazione proprietario terreno per spostamento fossa imhoff
2014PRIA0050	76EN - Nuovo serbatoio di accumulo in località Mendigola a Neviano	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	66.998 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	660.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	61.728 €	0 €	61.728 €	-79%	Predisposto progetto preliminare e in corso trattativa acquisizione terreno



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	3.081 €	0 €	3.081 €	-93%	In corso progettazione definitiva
2014PRIA0066	47IAG - Manutenzione straordinaria nuovo sollevamento Depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	120.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Ultimato anni precedenti
2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	425.138 €	300.000 €	0 €	300.000 €	633 €	0 €	633 €	-99%	In attesa ottenimento permesso Ferrovie dello Stato
2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio	ACQUEDOTTO	Parma	470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0069	50IAG - Rifacimento condotta acquedotto via Trento DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	55.010 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0070	51IAG - Sistemazione rete fognaria Vigatto zona via Donatori Sangue (priorità 1 Comune di Parma)	FOGNATURA	Parma	220.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	FOGNATURA	Parma	2.000.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	1.010.115 €	0 €	1.010.115 €	152%	Anticipazione lavori anni successivi per opportunità di cantiere e limitazione disagio concordate con Amministrazione comunale
2014PRIA0072	53IAG - Viale Villetta, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	110.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0073	54IAG - via Rezzonico, sistemazione fognature	FOGNATURA	Parma	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	400.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	71.057 €	0 €	71.057 €	-79%	Tempistiche intervento concordate con il comune di Parma
2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0076	57IAG - via Gastaldi e via Colorno, estendimento fognature	FOGNATURA	Parma	220.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Intervento da eliminare dal piano - non più necessario - lavanderia Torino
2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	470.000 €	0 €	0 €	0 €	12.788 €	0 €	12.788 €	100%	Effettuate spese progettuali

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	1.000.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	36.751 €	0 €	36.751 €	-63%	Ritardo fornitura materiali per realizzazione rete fognaria
2014PRIA0079	60IAG - Zona San Pancrazio, via Madonna dell'Aiuto e strada del Cristo - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0080	61IAG - Ripristino serbatoio pensile Antognano	ACQUEDOTTO	Parma	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0081	62IAG - Impermeabilizzazione vasche contenimento siero latte. Dep PR Ovest	DEPURAZIONE	Parma	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0082	63IAG - Rifacimento condotte fognatura via Trento DE 800	FOGNATURA	Parma	105.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0083	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	ACQUEDOTTO	Parma	985.966 €	78.000 €	0 €	78.000 €	400.178 €	0 €	400.178 €	413%	Incentivata distrettualizzazione per riduzione fughe comune di Parma
2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	110.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	129 €	0 €	129 €	-99%	Ritardo per problemi acquisizione terreno.
2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Parma	20.038 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	FOGNATURA	Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto	120.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	366 €	0 €	366 €	-98%	Attivata modellazione su rete fognaria Parma, ritardo dovuto ad elaborazione dati altimetrici rete
2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	ACQUEDOTTO	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180 €	0 €	0 €	0 €	895 €	0 €	895 €	100%	Code anno precedente

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0088	67IAG - Raddoppio impianto denitrificazione Centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma, Montechiarugolo, Noceto	179.541 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0089	68IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma	734.142 €	0 €	0 €	0 €	248.774 €	0 €	248.774 €	100%	Da verifiche funzionali sull'imp. Elettrico ed in particolare sull'imp. di trasformazione di media tensione, si sono riscontrate criticità il cui intervento rivestiva carattere di urgenza e non rimandabile.
2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.620 €	700.000 €	0 €	700.000 €	130.213 €	0 €	130.213 €	-81%	Problemi sul collaudo delle condotte adibite a serbatoio hanno protratto l'inizio dei lavori di completamento dell'opera. E' risultato inoltre necessario presentare variante per integrare il progetto iniziale. In particolare è stata aggiunta una ulteriore camera di manovra dedicata al caricamento del serbatoio ed incrementata la superficie del fabbricato. ( P.D.C richiesto in data 12/04/2016 ed autorizzato in data 21/09/2017).
2014PRIA0092	119EN - Ampliamento depuratore Sorbolo	DEPURAZIONE	Sorbolo	2.204.646 €	0 €	0 €	0 €	386.789 €	0 €	386.789 €	100%	Contenzioso con l'impresa esecutrice in corso per l'ultimazione lavori.
2014PRIA0093	118EN - Opere per realizzazione distretti idrici	ACQUEDOTTO	Sorbolo	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	DEPURAZIONE	Traversetolo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.650.000 €	0 €	2.650.000 €	5.567.574 €	0 €	5.567.574 €	110%	Risolte emergenze ed urgenze non più rimandabili
2014PRIA0096	72IAG - Manutenzioni starordinarie	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		1.240.000 €	0 €	1.240.000 €	2.111.602 €	0 €	2.111.602 €	70%	Risolte emergenze ed urgenze non più rimandabili
2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	21.966.088 €	620.000 €	0 €	620.000 €	2.052.012 €	0 €	2.052.012 €	230%	Si sono risolti diversi problemi evidenziati nel corso dell'anno e negli anni precedenti non più rimandabili

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0098	74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani,	1.063.273 €	100.000 €	0 €	100.000 €	169.524 €	0 €	169.524 €	69%	Attività di integrazione dati finalizzato alla modellazione
2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione, potenziamento condotte idriche al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		620.000 €	0 €	620.000 €	622.832 €	0 €	622.832 €	0%	
2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione, potenziamento condotte fognarie al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	FOGNATURA	Opere pluricomunali		300.000 €	0 €	300.000 €	287.814 €	0 €	287.814 €	-4%	
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	330.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	622 €	0 €	622 €	-98%	Parte dei lavori anticipati nel 2016
2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	DEPURAZIONE	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	1.321.043 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Partiti i lavori riferiti agli impianti di : Felino, Collecchio, Lesignano (opere caricate sui codici assegnati nel POI)
2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo,	505.078 €	130.000 €	0 €	130.000 €	280.646 €	0 €	280.646 €	115%	Nell'esecuzione delle opere di telecontrollo si sono dovuti adeguare completamente alcuni impianti elettrici

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		150.000 €	150.000 €	0 €	76.909 €	49.950 €	26.959 €	-48%	Eseguite le opere richieste da Comuni
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	720.000 €	60.000 €	50.000 €	10.000 €	241.904 €	0 €	241.904 €	303%	Eseguite le opere richieste da Comuni
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.249.845 €	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Causa emergenza idrica del 2017 non è stato possibile effettuare manutenzioni straordinarie ai serbatoi
2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.410.871 €	50.000 €	0 €	50.000 €	37.544 €	0 €	37.544 €	-24%	Causa emergenza idrica del 2017 gli interventi sono stati limitati ai soli casi in cui veniva risolta la crisi idrica
2016PRIA0108	Impianto trattamento acqua gallerie Braia/pozzi Fabiola	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino	500.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Si sta rivedendo l'intero assetto acquedottistico del comune di Langhirano (capoluogo) - verranno inviate richieste ufficiali di modifica del POI
2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0110	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7)	FOGNATURA	Parma	100.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	In attesa di indicazioni da comune di Parma



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Concordato con comune di Parma progettazione al 2018 - termine lavori torrente Baganza
2016PRIA0122	80IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio pensile Ponte Taro	ACQUEDOTTO	Fontevivo	200.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	69.523 €	0 €	69.523 €	247%	In atto verifiche (se possibile messa fuori esercizio impianto ok demolizione altrimenti avviare ristrutturazione)
2016PRIA0123	Sistemazione rete fognaria FONTEVIVO capoluogo area Rio Scagno e Canale Vecchio. Collettamento fognatura con sostituzione canalette con adeguate tubazioni	FOGNATURA	Fontevivo	200.000 €	0 €	0 €	0 €	24.095 €	0 €	24.095 €	100%	Code lavori anno precedente
2016PRIA0124	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo	200.000 €	0 €	0 €	0 €	292.536 €	0 €	292.536 €	100%	La stima progettuale prevista a piano si basava su esperienze precedenti. Vista l'ubicazione particolare del pensile, è stato necessario ricorrere a tecniche di demolizione controllata mai utilizzate, con necessità di realizzazione di apprestamenti importanti a difesa delle abitazioni vicine. Tali evidenze si sono manifestate nello sviluppo della progettazione esecutiva dell'opera.
2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.180.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	263.467 €	0 €	263.467 €	426%	Eseguiti i lavori necessari a salvaguardia della galleria di captazione di Rubbiano
2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo	100.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	1.662 €	0 €	1.662 €	-91%	In attesa ottenimento permesso Ferrovie dello Stato
2016PRIA0128	71IAG - Sostituzione rete Via Cavatorta lo. Giarreto	ACQUEDOTTO	Langhirano	50.000 €	0 €	0 €	0 €	63.667 €	0 €	63.667 €	100%	In accordo con amministrazione comunale, l'intervento è stato posticipato dal 2016 al 2017 ed ha comportato spese leggermente superiori a quelle preventivate.
2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	1.500.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Verifiche in corso su reti e opere da realizzare



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016PRIA0139	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	ACQUEDOTTO	Palanzano	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Posticipato per emergenza idrica
2016PRIA0141	Messa a norma serbatoio Caneto	ACQUEDOTTO	Palanzano	80.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Lavoro terminato 2017 e finito in manut. Straord. 2014PRIA0095
2016PRIA0142	Opere di protezione prese Lalatta	ACQUEDOTTO	Palanzano	100.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	Posticipato per emergenza idrica
2016PRIA0143	Rifacimento imhoff Vaestano	DEPURAZIONE	Palanzano	30.000 €	0 €	0 €	0 €	4.628 €	0 €	4.628 €	100%	Code fine lavori anno precedente
2016PRIA0144	Rifacimento imhoff Selvanizza A	DEPURAZIONE	Palanzano	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogropo	DEPURAZIONE	Palanzano	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	In attesa di risposte e verifiche sull'opera da parte del Comune
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	-100%	In attesa di risposte e verifiche sull'opera da parte del Comune



				PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm$ 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2018PRIA0159	"Contributi Progetto sperimentazione autolettura contatori - comune di Parma (rif. 2014PRIA0095	ACQUEDOTTO	Parma		0 €	0 €	0 €	0 €	14.299 €	-14.299 €	0%	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>					16.978.500 €	820.000 €	16.158.500 €	17.890.732 €	182.431 €	17.708.301 €		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 7 del 6.03.2019

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Iren S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 6 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma  
F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante  
F.to Fausta Pizzaghi

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 3 giugno 2019
