



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2024
GESTORE: ARCA SRL
BACINO DI: REGGIO-EMILIA



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio-Emilia n.2 del 4 Aprile 2024, che il gestore ARCA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	20.048.813 €	28.266.577 €	8.217.765 €	41%
FONDO PERDUTO	2.420.140 €	2.031.811 €	-388.329 €	-16%
TOTALE	22.468.953 €	30.298.388 €	7.829.436 €	35%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 non sono ancora stati rendicontati definitivamente. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore ARCA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti significativamente superiori rispetto al pianificato.

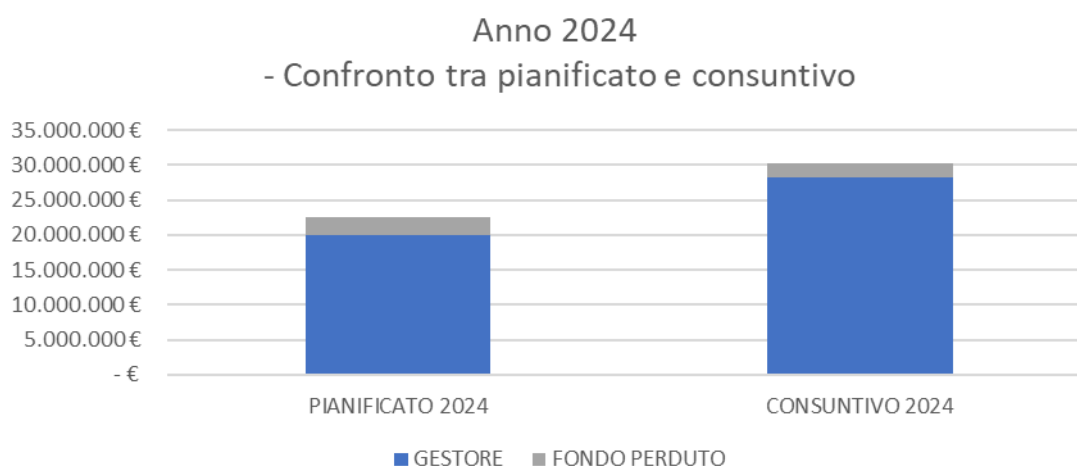


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

L'anno 2024 è il primo anno del POI 2024-2029 e della gestione Arca Srl; nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura nell'ultimo quinquennio.



	2020	2021	2022	2023	2024
PIANIFICATO	22.761.163 €	23.800.485 €	22.807.343 €	19.085.113 €	22.468.953 €
CONSUNTIVO	30.408.788 €	36.883.418 €	31.188.322 €	30.445.591 €	30.298.388 €
DIFFERENZA	7.647.625 €	13.082.933 €	8.380.979 €	11.360.478 €	7.829.435 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nella quale si notano investimenti non significativamente discosti da quelli programmati.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	10.837.229 €	16.705.190 €	5.867.961 €	54%
DEPURAZIONE	6.902.130 €	7.035.026 €	132.896 €	2%
FOGNATURA	4.255.594 €	6.266.660 €	2.011.066 €	47%
ACQUE BIANCHE	20.000 €	39.253 €	19.253 €	96%
TUTTI	454.000 €	252.259 €	-201.741 €	-44%
TOTALE	22.468.953 €	30.298.388 €	7.829.435 €	35%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

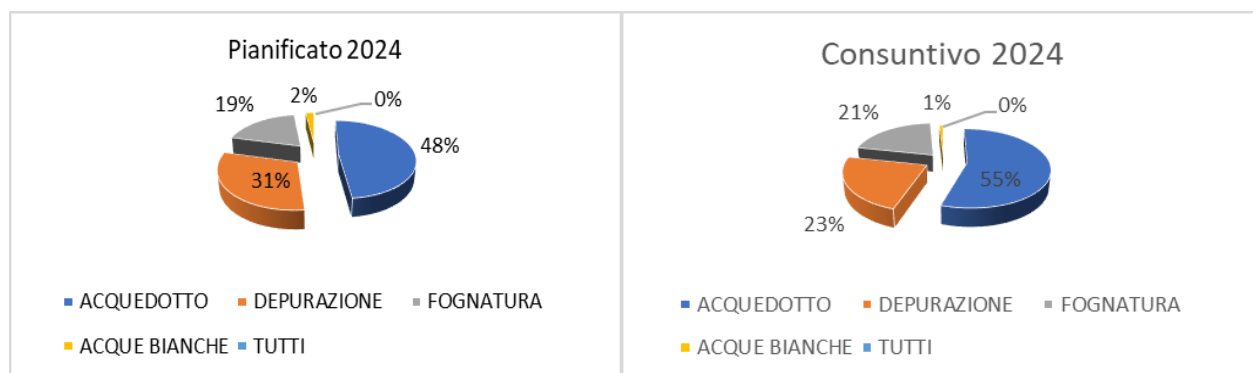


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.



	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	2.557.000	10.031.776	7.474.776	292%
DEPURAZIONE	2.285.300	3.599.963	1.314.663	58%
FOGNATURA	1.158.140	2.631.696	1.473.556	127%
ACQUE BIANCHE	454.000	252.259	-201.741	-44%
TOTALE	6.454.440	16.515.693	10.061.253	156%

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comune	2024	POI 2020-2023
Albinea	266.620 €	720.928 €
Bagnolo in Piano	134.930 €	715.623 €
Baiso	213.479 €	603.801 €
Bibbiano	192.000 €	618.760 €
Boretto	130.676 €	369.696 €
Brescello	149.643 €	605.748 €
Cadelbosco di Sopra	219.384 €	696.328 €
Campagnola	75.599 €	286.734 €
Campegine	145.089 €	586.211 €
Canossa	400.627 €	478.801 €
Carpineti	203.455 €	751.670 €
Casalgrande	771.533 €	2.101.584 €
Casina	106.992 €	448.953 €
Castellarano	687.176 €	2.149.626 €
Castelnovo di Sotto	210.760 €	593.672 €
Castelnovo Monti	482.249 €	1.708.480 €
Cavriago	341.336 €	1.284.578 €
Correggio	457.153 €	2.197.671 €
Fabbrico	64.804 €	291.594 €
Gattatico	66.633 €	267.236 €
Gualtieri	197.427 €	471.930 €
Guastalla	235.809 €	494.638 €
Luzzara	89.492 €	483.956 €
Montecchio	400.494 €	719.032 €
Novellara	218.744 €	784.406 €
Poviglio	111.817 €	498.781 €
Quattro Castella	556.012 €	1.082.056 €
Reggio Emilia	6.315.067 €	9.597.242 €
Reggiolo	190.736 €	313.629 €
Rio Saliceto	117.634 €	355.090 €
Rolo	154.163 €	201.280 €
Rubiera	535.574 €	884.497 €
San Martino in Rio	418.358 €	589.835 €
San Polo d'Enza	112.297 €	562.854 €
Sant'Ilario d'Enza	116.074 €	414.165 €
Scandiano	959.693 €	2.074.945 €
Ventasso	564.723 €	1.883.875 €
Vetto d'enza	280.495 €	435.304 €

Comune	2024	POI 2020-2023
Vezzano sul Crostolo	137.122 €	424.800 €
Viano	108.608 €	448.157 €
Villaminuzzo	233.870 €	1.379.323 €
Totale complessivo	17.374.349 €	41.577.489 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	63	3.295.784 €	3.674.387 €	378.604 €	11%
500.000-1.000.000 €	19	2.538.500 €	1.940.987 €	-597.513 €	-24%
1.000.000-2.000.000 €	8	2.070.000 €	2.078.274 €	8.274 €	0%
2.000.000-5.000.000 €	6	2.383.264 €	1.004.251 €	-1.379.013 €	-58%
Oltre 5.000.000 €	6	6.206.965 €	3.753.357 €	-2.453.608 €	-40%
Manutenzioni	11	5.854.440 €	16.508.031 €	10.653.591 €	182%
Altri cumulativi	5	120.000 €	1.339.101 €	1.219.101 €	1016%
TOTALE	118	22.468.953	30.298.388	7.829.435	35%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
M1 - Perdite idriche	14.387.863 €
M2 - Interruzione del servizio	87.380 €
M3 – Qualità dell'acqua erogata	1.893.512 €
M4 – Adeguatezza del sistema fognario	5.991.391 €
M5 – Smaltimento fanghi	773.469 €
M6 – Qualità dell'acqua depurata	6.663.184 €
Altro	501.588 €
TOTALE	30.298.388 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

DD 18/12/2025
P. - R.
Finanziamento
e
Idrica
4
Servizi
i Servizi
6
a per
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

INTERVENTI NON AVVIATI

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo pianificato 2024	Note giustificative
2023REIA0327	Spostamento rete acqua adduttrice Villa Carandine (DN 300fuchs)	ACQUEDOTTO	Casalgrande	20.000	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato fattibile in area interclusa tra diverse proprietà e Rio demaniale
2023REIA0325	Nuovo pozzo Sant'Ilario	ACQUEDOTTO	Sant'Ilario d'Enza	20.000	In corso valutazioni preliminari, si prevede l'avvio della progettazione per il secondo semestre 2025
2024REAR0003	Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	79.000	Importo disponibile per cofinanziamento al 50% di estensioni fognarie fuori agglomerato: nel corso del 2024 non sono pervenute richieste
2023REIA0320	Spostamento Dn 500 Acciaio Terminaccio presso ditta Zannoni Petroli 650 ml	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	20.000	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato fattibile in area interclusa tra diverse proprietà in zona artigianale
2023REIA0331	Potenziamento condotta adduttrice Via Val d'Enza Sud	ACQUEDOTTO	Canossa	150.000	Intervento da realizzare in concomitanza a lavori del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: programmato per il 2025
2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	100.000	Progettazione in ritardo per valutazioni sulla fattibilità del tracciato lungo arteria principale della città che provocherebbe notevole impatto sul traffico. In corso valutazioni su microtunnelling
2021REIA0291	Ristrutturazione edile e adeguamento sismico Centrale idrica Via Gorizia	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	300.000	Intervento posticipato in quanto concomitante con altri interventi di manutenzione straordinaria
2023REIA0298	Alluvione 2023 - Posa tubazione definitiva rete idrica Via Lugara causa frana loc. Levizzano	ACQUEDOTTO	Baiso	200.000	Avvio del cantiere posticipato causa maltempo, programmato per la primavera 2025
2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	ACQUEDOTTO	Carpineti, Casina	20.000	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
2021REIA0278	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Dante Alighieri, Via della Pace	FOGNATURA	Castellarano	100.000	Progettazione conclusa: in attesa di formalizzazione accordi tra il Comune e proprietari delle aree da attraversare con il collettore fognario
2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	ACQUEDOTTO	Canossa	20.000	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
2024REAR0022	Studi per la realizzazione impianti di produzione di energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per autoconsumo	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000	Nessuno studio al momento in corso
2023REIA0319	Spostamento tubazioni Dn 500 Gh e Dn 450 Acciaio in zona Pavoni a Castelnuovo Monti 500+500 ml	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	50.000	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
2023REIA0333	Depuratore di Roncocesi - Rinnovo e potenziamento comparto disidratazione fanghi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	50.000	Predisposta la gara per l'acquisto delle apparecchiature di cui si prevede la consegna ad inizio 2025
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	20.000	Intervento sospeso: il Comune di Vezzano ha chiesto un nuovo intervento in Vicolo Siberia
TOTALE				1.199.075	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N. 2 del 4 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
1	2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva "il Poggio"	FOGNATURA	Albinea	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2023REIA0313	Realizzazione nuovo scolmatore in Via XXV Aprile	FOGNATURA	Albinea	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2016REIA0105	Estendimento rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	130.166,00 €	- €	- €	- €	41,34€	- €	41,34€	41,34€	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
4	2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	500.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	64.057,55 €	- €	64.057,55 €	- 135.942,45 €	-67	Progettazione in corso: Il Comune ha chiesto di sostituire questo intervento con lo Spostamento del ramo scolmatore di Via Grand
5	2023REIA0328	Sostituzione rete acqua adduttrice Bagnolo Parco Europa - Novellara dn 400 circa 1km dn 400 fuchs	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	FOGNATURA	Baiso	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2023REIA0298	Alluvione 2023 - Posa tubazione definitiva rete idrica Via Lugara causa frana loc. Levizzano	ACQUEDOTTO	Baiso	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	-100	Avvio del cantiere posticipato causa maltempo, programmato per la primavera 2025
9	2023REIA0300	Alluvione 2023 - Lavori di messa in sicurezza e sostituzione del tratto di rete fognaria scalzato da esondazione del Rio Gaviz	FOGNATURA	Baiso	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.491,00 €	- 15.490,93 €	- €	0	
10	2017REIA0156	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	900.000,00 €	- €	- €	- €	82,68€	- €	82,68€	82,68 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2026-2027
11	2018REIA0181	Estendimento rete acqua in Via Marches	ACQUEDOTTO	Boretto	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in fragio all'abitato di Via Ghizzardi	FOGNATURA	Boretto	120.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	8.141,12 €	- €	8.141,12 €	- 11.858,88 €	-59	FRANCHIGIA 20.000→ se scostamento < 100
13	2018REIA0183	Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto-Poviglio	ACQUEDOTTO	Boretto	600.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	73.265,61 €	- €	73.265,61 €	- 126.734,39 €	-63	Acquistate le tubazioni, in attesa di perfezionamento autorizzazione per attraversamento area di proprietà AIPC
14	2014REIA0007	Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	2.151.000,00 €	- €	- €	- €	14.545,80 €	- €	14.545,80 €	14.545,80 €	100	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nelle annualità 2026-2027-2028
15	2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	500.000,00 €	- €	- €	- €	33.684,61 €	- €	33.684,61 €	33.684,61 €	100	Anticipata la progettazione di intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2027-2028
16	2021REIA0288	Realizzazione collegamento fognario in Via Bacch	FOGNATURA	Brescello	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2023REIA0307	Interconnessione S.Illario-Caprra (T.1.3	ACQUEDOTTO	Campegine	741.840,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2023REIA0326	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Zappellazzo 2° stralcio (Caprra-Via Torre)	ACQUEDOTTO	Campegine	600.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	128.860,31 €	- €	128.860,31 €	108.860,31 €	544	Progettazione esecutiva ultimata ed anticipata la sostituzione di un tratto soggetto a frequenti rotture in proprietà private
19	2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	ACQUEDOTTO	Canossa	200.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
20	2023REIA0331	Potenziamento condotta adduttrice Val Val d'Enza Sud	ACQUEDOTTO	Canossa	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	-100	Intervento da realizzare in concomitanza a lavori del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: programmato per il 2025
21	2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2^ linea	DEPURAZIONE	Carpineti	1.100.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	580.933,10 €	- €	580.933,10 €	530.933,10 €	1061	Cantiere in corso: si prevede la fine dei lavori entro la metà del 2025. L'aumento di importo è dovuto principalmente all'aumento prezzi dei materiali da costruzione e delle forniture delle componenti elettromeccaniche
22	2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	FOGNATURA	Carpineti	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2023REIA0296	Alluvione 2023 - Ripristino e messa in sicurezza del ponte di accesso al depuratore di Cigarell	DEPURAZIONE	Carpineti	100.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	75.014,84 €	- €	75.014,84 €	- 14.985,16 €	-16	
24	2023REIA0321	Spostamento Dn 250 Acciaio zona sportiva Carpineti (1° step dell'interconnessione Gabellina Salvaterra	ACQUEDOTTO	Carpineti	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2024REAR0023	Intervento urgente di ricostituzione di una porzione della scarpata in erosione del fiume Secchia che minaccia infrastrutture a rete fossa Imhoff e fognatura a servizio dell'abitato di Colombaia	DEPURAZIONE	Carpineti	86.829,74 €	86.829,74 €	50.000,00 €	36.829,74 €	- €	- €	- €	- 86.829,74 €	-100	Lavorazione eseguita, importo speso → 86.829, erroneamente imputato su codice ARSI 2023REIA0295 (WBS C1711-E025-05-0003)
26	2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	ACQUEDOTTO	Carpineti, Casina	325.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
27	2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnini	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000,00 €	- €	- €	- €	5.744,83 €	- €	5.744,83 €	5.744,83 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
28	2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	500.000,00 €	- €	- €	- €	120.417,17 €	- €	120.417,17 €	120.417,17 €	100	Erroneamente rendicontata su questo ID l'intervento 2023REIA0341 - Realizzazione collettore fognario in Via Bellavista
29	2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	Casalgrande	150.000,00 €	- €	- €	- €	0,01€	- €	0,01€	0,01 €	100	ERRORE
30	2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchie	ACQUEDOTTO	Casalgrande	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	29.811,80 €	- €	29.811,80 €	- 270.188,20 €	-90	Ottenute le servitù di passaggio, intervento riprogrammato per il 2025
31	2018REIA0195	Potenziamento impianto di San Valentino "Le Ville" e dismissione impianto san Valentino "Castello"	DEPURAZIONE	Casalgrande	400.000,00 €	- €	- €	- €	289,38 €	- €	289,38 €	289,38 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2026-2027
32	2021REIA0279	Piano Fognario - Collettamento Agglomerato Cà Guidetti (ARE0856)	FOGNATURA	Casalgrande	490.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	240.499,85 €	- €	240.499,85 €	140.499,85 €	140	Cantiere in corso: si prevede l'ultimazione nel corso del 2025
33	2022REIA0293	Realizzazione di Impianto fotovoltaico in copertura da 126 kWp in autoconsumo presso la Centrale Idrica di Salvaterra	ACQUEDOTTO	Casalgrande	175.000,00 €	- €	- €	- €	940,31 €	- €	940,31 €	940,31 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
34	2023REIA0327	Spostamento rete acqua adduttrice Villa Carandine (DN 300fuchs)	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato fattibile in area interclusa tra diverse proprietà e Rio demaniale
35	2023REIA0341	Realizzazione collettore fognario in loc. Bellavista	FOGNATURA	Casalgrande	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Intervento concluso: erroneamente rendicontato su ID 2016 REIA0114 - Collettore Villaggio Macina
36	2024REAR0001	Interconnessione Gabellina-Salaterra (T.1.3	ACQUEDOTTO	Casalgrande, Castellarano	2.758.280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina	ACQUEDOTTO	Casina	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	7.388,17 €	- €	7.388,17 €	7.388,17 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
38	2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	490.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	34.793,62 €	- €	34.793,62 €	- 15.206,38 €	-30	FRANCHIGIA 20.000→ se scostamento < 100
39	2018REIA0196	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno - La Stella	ACQUEDOTTO	Casina	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	16.009,47 €	- €	16.009,47 €	- 283.990,53 €	-94	Ottenute le servitù di passaggio, in corso verifiche geologiche
40	2023REIA0299	Alluvione 2023 - Messa in sicurezza e sostituzione tratto di rete fognaria scalzato da movimento franoso in lo. Boccc	FOGNATURA	Casina	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	49.681,00 €	- 49.681,16 €	- €	0	
41	2023REIA0318	Rifacimento condotta fognaria in località Glandeto (verificare possibilità di collegamento alla Imhoff di Cà Bonini	FOGNATURA	Casina	100.000,00 €	- €	- €	- €	3.555,36 €	- €	3.555,36 €	3.555,36 €	100	Progettazione in corso: anticipo spese di progettazione di intervento pianificato nelle annualità 2025-2026
42	2023REIA0322	Spostamento Dn 300 Acciaio Madè Cortogno comune di Casina 1550 ml	ACQUEDOTTO	Casina	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
43	2023REIA0324	Spostamento Dn 400 Ghisa Ansagna Monte Tane 700 m	ACQUEDOTTO	Casina	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2023REIA0339	Sistemazione fossa Imhoff Banzola Est	DEPURAZIONE	Casina	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa Imhoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano	150.000,00 €	- €	- €	- €	11.067,17 €	- €	11.067,17 €	11.067,17 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
46	2021REIA0278	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Dante Alighieri, Via della Pace	FOGNATURA	Castellarano	400.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Progettazione conclusa: in attesa di formalizzazione accordi tra il Comune e proprietari delle aree da attraversare con il collettore fognario
47	2014REIA0025	Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	700.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	48.068,87 €	- €	48.068,87 €	- 251.931,13 €	-83	Cantiere in corso: inizio lavori posticipato all'autunno per difficoltà organizzative dell'appaltatore. Si prevede la fine dei lavori entro il 2025
48	2014REIA0026	Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	650.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	182.289,60 €	- €	182.289,60 €	132.289,60 €	264	Cantiere in corso: a causa del riattarsi di un movimento franoso quiescente si è resa necessaria la realizzazione di una palificata a sostegno della vasca Imhoff realizzata e di alcuni inclinometri per il monitoraggio dei movimenti del versante. A verifiche geologiche e geotecniche concluse verranno definite le opere necessarie per il completamento dell'impianto

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N. 2 del 4 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
49	2017REIA0152	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	FOGNATURA	Castelnovo Monti	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2021REIA0286	Realizzazione collegamento fognario in Via Bosch	FOGNATURA	Castelnovo Monti	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2021REIA0287	Rifacimento condotto scolmatore in Via Roma	FOGNATURA	Castelnovo Monti	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2023REIA0295	Alluvione 2023 - Fossa Imhoff Gatta: sistemazione tubazione in uscita e ripristino antiorosione nell'alveo del Rio Spirola	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	25.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	113.600,19 €	24.685,00 €	88.915,59 €	93.600,19 €	468	Sul codice ARSI è stato erroneamente imputato oltre all'intervento sistemazione fosse Imhoff Gatta (importo speso 31.767,76 €, WBS C1711-E025-005-0002), anche "Intervento urgente di ricostituzione di una porzione della scarpata in erosione del fiume Secchia che minaccia infrastrutture a rete fossa Imhoff e fognatura a servizio dell'abitato di Colombaia" (importo speso 86.829 €, WBS C1711-E025-005-0003)
53	2023REIA0297	Alluvione 2023 - Depuratore di Cà Perizzi: ripristino funzionalità biorulli 3 e 4 a seguito di allagamentc	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2023REIA0319	Spostamento tubazioni Dn 500 Gh e Dn 450 Acciaio in zona Pavoni a Castelnuovo Monti 500+500 ml	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	350.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato stabile in un contesto di forte dissesto idrogeologico
55	2023REIA0320	Spostamento Dn 500 Acciaio Terminaccio presso ditta Zannoni Petroli 650 ml	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	250.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari per l'individuazione di un tracciato fattibile in area interclusa tra diverse proprietà in zona artigianale
56	2023REIA0323	Spostamento del Dn 500 Ghisa da Montegufò Felina a Frombolara in 500 Acciaio 4000 ml	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
57	2014REIA0030	Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	3.810.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	24.063,29 €	- €	24.063,29 €	- 525.936,71 €	-95	Intervento in sospenso in attesa del rinnovo del permesso di costruire. Non urgente in quanto le prime due linee già realizzate trattano in modo adeguato il carico in ingresso grazie anche alla progressiva eliminazione delle prese di magra esistenti lungo il collettore Caprara-Meletole. Ciò a consentito di ridurre significativamente le acque parassite in ingresso all'impianto
58	2014REIA0031	Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	154.710,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	95.555,34 €	- €	95.555,34 €	75.555,34 €	377	Cantiere in corso: anticipato l'inizio dei lavori rispetto alla pianificazione, si prevede la conclusione nel 2025
59	2018REIA0198	PNRR - Fognatura e depurazione - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	1.200.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	- €	1.009.833,51 €	366.000,00 €	643.833,51 €	- 210.166,49 €	-17	
60	2021REIA0290	Sostituzione rete di di distribuzione acqua in Via Gorganza e Via dell'Industria	ACQUEDOTTO	Cavriago	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	135.446,18 €	- €	135.446,18 €	- 214.553,82 €	-61	Cantiere in corso: ultimata Via dell'Industria, in corso Via Gorganza. Si prevede la conclusione dei lavori nel 2025
61	2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	200.000,00 €	- €	- €	- €	41,34 €	- €	41,34 €	41,34 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
62	2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	700.000,00 €	- €	- €	- €	41,34 €	- €	41,34 €	41,34 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
63	2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 A€	DEPURAZIONE	Correggio	600.000,00 €	- €	- €	- €	214,48 €	- €	214,48 €	214,48 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2026-2027
64	2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale I Agosto	FOGNATURA	Correggio	300.000,00 €	- €	- €	- €	21.316,90 €	- €	21.316,90 €	21.316,90 €	100	Anticipate spese di progettazione per intervento di cui il Comune di Correggio chiede l'anticipazione al 2025 (Collettore fognario Via per San Martino)
65	2018REIA0207	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	ACQUEDOTTO	Gattatico	250.000,00 €	- €	- €	- €	59.002,97 €	- €	59.002,97 €	59.002,97 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
66	2023REIA0338	Depuratore di Praticello - adeguamento impianto elettrico e comparto biologico	DEPURAZIONE	Gattatico	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
67	2017REIA0153	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	1.300.000,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	171.475,46 €	- €	171.475,46 €	- 228.524,54 €	-57	Cantiere in corso: si prevede la fine dei lavori entro il 2025
68	2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000,00 €	- €	- €	- €	1.605,97 €	- €	1.605,97 €	1.605,97 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nell'annualità 2026
69	2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000,00 €	- €	- €	- €	815,39 €	- €	815,39 €	815,39 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nell'annualità 2027
70	2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri Valle	FOGNATURA	Montecchio	150.000,00 €	- €	- €	- €	28.612,91 €	- €	28.612,91 €	28.612,91 €	100	Intervento concluso: realizzati i ripristini definitivi
71	2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa Parri	FOGNATURA	Montecchio	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
72	2014REIA0049	Completamento centrale idrica di Via Sturlone	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	82,68 €	- €	82,68 €	- 49.917,32 €	-99	Intervento in ritardo per il perfezionamento della partica edilizi
73	2016REIA0126	FSC - Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolinc	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2018REIA0215	Sostituzione adduttrice in Via Levata	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000,00 €	- €	- €	- €	176.916,73 €	- €	176.916,73 €	176.916,73 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
75	2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	481.079,68 €	- €	481.079,68 €	131.079,68 €	37	Intervento concluso: maggiori spese sostenute per attività di re-lining ed attraversamento del canale di Bonifica in sub-alveo
76	2021REIA0282	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Costa	FOGNATURA	Novellara	770.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	785.399,63 €	- €	785.399,63 €	585.399,63 €	292	Cantiere in corso: si prevede l'ultimazione nel corso del 2025
77	2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.881.209,00 €	- €	- €	- €	318.400,27 €	- €	318.400,27 €	318.400,27 €	100	Da considerare unitamente a ID 2024REAR0018
78	2023REIA0294	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	42.957,54 €	- €	42.957,54 €	42.957,54 €	100	Realizzato l'intervento di Estensione della rete di acquedotto in Via Cantonazzo in Comune di Rolo e la progettazione dell'intervento di Estensione della rete acqua in Via Spianzagna in Comune di Baiso
79	2024REAR0002	Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	248.358,19 €	- €	248.358,19 €	248.358,19 €	100	Rendicontati interventi di Piano fognario non codificati con ID specifico (Realizzazione collettore fognario in Via Bassa Comune di Canossa e progettazione nuovo collettore e fossa Imhoff in loc. Bedogno Comune di Quattro Castella)
80	2024REAR0003	Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	406.286,00 €	79.000,00 €	- €	79.000,00 €	- €	- €	- €	- 79.000,00 €	-100	Importo disponibile per cofinanziamento al 50% di estensioni fognarie fuori agglomerato: nel corso del 2024 non sono pervenute richieste
81	2024REAR0004	Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.946.816,00 €	2.135.305,00 €	- €	2.135.305,00 €	10.031.776,33 €	- €	10.031.776,33 €	7.896.471,33 €	369	Nel 2024 aumentate rispetto al 2023 le rotture di prese del 10% e le rotture di rete del 6%; importo complessivo per manutenzione Reti Potabili 7.100.000 €. Su Impianti Potabili, oltre a riparazioni a guasto, tra le manutenzioni principali sono state eseguite: lo spostamento Tubazione Adduttrice DN 600 in corrispondenza di un cantiere del Comune di Reggio Emilia, manutenzione straordinaria Serbatoio Pensile Montecchio, manutenzione straordinaria Impianto di Filtrazione di Fellegara - Scandiano, Manutenzione Straordinaria Serbatoio Dongara-Vetto.
82	2024REAR0005	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.1 Rinnovamento Reti per la riduzione delle perdite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	4.701.360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
83	2024REAR0006	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.2 Riduzione delle perdite di rete (distrettualizzazione e monitoraggio)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	6.804.000,00 €	298.620,00 €	- €	298.620,00 €	- €	- €	- €	- 298.620,00 €	-100	Nel 2024 sono stati realizzati interventi per ~ 237.000 per errore rendicontati sull'ID 2024RERA0004 - Manutenzioni straordinarie acque
84	2024REAR0007	Manutenzioni straordinarie acqua - T.1.4 Riduzione consumi elettrici	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.555.000,00 €	73.075,00 €	- €	73.075,00 €	- €	- €	- €	- 73.075,00 €	-100	Effettuato ordine su attività "Rinnovo imp.pomp.solli. CI via Gorizia-RE" imputata su codice ARSI di manutenzione straordinaria acqua, pompe in consegna tra fine 2025 e inizio 2026
85	2024REAR0008	Installazione contatori su allacciamenti ad uso antincendio Del. CLRE/2018/7 del 30/11/2018	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Costi imputati su attività di manutenzione straordinaria depurazione - C1712-E022-01-0146 6048 ~ Studio logiche ottimizzazione Dep Salvaterra, C1712-E022-01-0199 42619,17 ~ 2024 Sostituzione soffiante Depuratore Rubiera, C1712-E022-01-0200 ~ 28155 Controller Depuratore Guastalla Nord
86	2024REAR0009	Cartografia numerica acqua/fognature	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.830.000,00 €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	292.537,33 €	- €	292.537,33 €	- 37.462,67 €	-11	
87	2024REAR0010	Estendimento reti a carico di privati	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	1.008.531,78 €	130.732,00 €	877.799,87 €	1.008.531,78 €	100	Reti realizzate con finanziamento al 100% a carico privati (spostamenti, potenziamenti, risoluzione interferenze..
88	2024REAR0011	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	7.505.000,00 €	1.738.000,00 €	- €	1.738.000,00 €	2.898.025,73 €	- €	2.898.025,73 €	1.160.025,73 €	66	Rendicontati diversi interventi di rinnovamento reti di distribuzione. L'aumento dei costi rispetto al pianificato è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi delle materie prime
89	2024REAR0012	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	11.857.871,00 €	1.408.965,00 €	- €	1.408.965,00 €	325.496,83 €	- €	325.496,83 €	- 1.083.468,17 €	-76	Nel corso del 2024 si sono riscontrati pesanti ritardi delle forniture di contatori a magazzino. Inoltre si è rilevata la frequente assenza delle valvole a monte del contatore, che ha reso necessari preventivi interventi di manutenzione per la modifica dell'impianto e consentire l'installazione del nuovo misuratore

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N. 2 del 4 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
136	2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
137	2018REIA0238	Depuratore di Reggiolo nuovo: adeguamento, ripristino e collaudo linea fanghi	DEPURAZIONE	Reggiolo	850.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	466.919,94 €	- €	466.919,94 €	366.919,94 €	366	Cantiere in corso: avanzamento lavori in anticipo rispetto alla pianificazione	
138	2014REIA0066	Piano Fognario - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo	FOGNATURA	Rio Saliceto	258.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
139	2016REIA0134	PNIISSI - Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	2.890.000,00 €	874.500,00 €	- €	874.500,00 €	2.741,24 €	- €	2.741,24 €	- 871.758,76 €	-99	Progetto esecutivo concluso, in corso di ottenimento Permesso di Costruire	
140	2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	1.330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
141	2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex-AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	82,60 €	- €	82,60 €	- 199.917,40 €	-99	Progettazione conclusa. Si potrà passare alla fase esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà completato il collegamento del serbatoio pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione esistente. Si prevede l'inizio dei lavori a fine 2025	
142	2018REIA0176	FSC - Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
143	2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	635.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	13.699,23 €	- €	13.699,23 €	- 186.300,77 €	-93	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nell'annualità 2026	
144	2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	50.000,00 €	- €	- €	- €	43.012,42 €	- €	43.012,42 €	43.012,42 €	100	Cantiere in corso, si prevede l'ultimazione nella primavera 2025	
145	2017REIA0160	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Illario d'Enza	150.000,00 €	- €	- €	- €	75.520,44 €	- €	75.520,44 €	75.520,44 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità; realizzata nuova strada di accesso all'impianto	
146	2023REIA0325	Nuovo pozzo Sant'Illario	ACQUEDOTTO	Sant'Illario d'Enza	300.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In corso valutazioni preliminari, si prevede l'avvio della progettazione per il secondo semestre 2025	
147	2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	755.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	211.028,82 €	- €	211.028,82 €	161.028,82 €	322	Cantiere in corso: si prevede la fine dei lavori entro il 2025	
148	2017REIA0167	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000,00 €	- €	- €	- €	28.935,86 €	- €	28.935,86 €	28.935,86 €	100	Intervento concluso: realizzati i ripristini definitivi	
149	2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	FOGNATURA	Scandiano	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
150	2014REIA0034	Cereto Alpi: 400 AE	DEPURAZIONE	Ventasso	535.000,00 €	- €	- €	- €	9.233,42 €	- €	9.233,42 €	9.233,42 €	100	Spese di progettazione per intervento pianificato nel 2025	
151	2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	325.000,00 €	- €	- €	- €	412,17 €	- €	412,17 €	412,17 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2026-2027	
152	2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggi	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	3.205,96 €	- €	3.205,96 €	- 16.794,04 €	-83	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100	
153	2018REIA0175	FSC - Sostituzione rete adduttrice Ca di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	370.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
154	2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	DEPURAZIONE	Ventasso	200.000,00 €	- €	- €	- €	124,03 €	- €	124,03 €	124,03 €	100	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nelle annualità 2026-2027	
155	2021REIA0281	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Papa Giovanni XXII	FOGNATURA	Ventasso	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	87.435,75 €	- €	87.435,75 €	27.435,75 €	45	Cantiere ultimato: maggiori spese dovute a lavorazioni aggiuntive necessarie per la regimazione delle acque meteoriche	
156	2018REIA0249	Piano Fognario - Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	845.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
157	2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	355.000,00 €	- €	- €	- €	94.736,75 €	- €	94.736,75 €	94.736,75 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità	
158	2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	Intervento sospeso: il Comune di Vezzano ha chiesto un nuovo intervento in Vicolo Siberia	
159	2014REIA0079	Potenziamento impianto Viano (5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento)	DEPURAZIONE	Viano	900.000,00 €	- €	- €	- €	7.772,91 €	- €	7.772,91 €	7.772,91 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2026-2029 nelle annualità 2026-2027	
160	2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000,00 €	- €	- €	- €	95.195,86 €	- €	95.195,86 €	95.195,86 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità	
161	2023REIA0340	Adeguamento depuratore loc. Castello di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
162	2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminozzo	370.000,00 €	- €	- €	- €	1.812,35 €	- €	1.812,35 €	1.812,35 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità	
163	2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminozzo	700.000,00 €	318.500,00 €	- €	318.500,00 €	7.614,03 €	- €	7.614,03 €	- 310.885,97 €	-97	In corso l'ottenimento delle servitù di passaggio su proprietà private	
164	2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: collettamento a rete depurata di parte della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminozzo	250.000,00 €	- €	- €	- €	117.666,68 €	- €	117.666,68 €	117.666,68 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità	
165	2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo (ARE0181-ARE0152)	DEPURAZIONE	Villaminozzo	150.000,00 €	- €	- €	- €	4.956,42 €	- €	4.956,42 €	4.956,42 €	100	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nelle annualità 2026-2027	
166	2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	ACQUEDOTTO	Villaminozzo	180.000,00 €	- €	- €	- €	1.809,83 €	- €	1.809,83 €	1.809,83 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità	
167	2021REIA0277	Piano Fognario - Realizzazione collegamento fognario tra Corso Prampa e Via della Vittoria	FOGNATURA	Villaminozzo	280.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	212.616,40 €	- €	212.616,40 €	132.616,40 €	165	Cantiere in corso: finanziato PNRR M2C4 I2a - Alluvioni	
168	2022REIA0292	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Villa Minozzo per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Villaminozzo	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
	Totale					24.429.355,74 €	2.420.140,00 €	22.009.215,74 €	30.856.067,21 €	2.031.811,00 €	28.824.256,56 €	6.426.711,47 €			
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura			
Importo Totale						24.429.355,74 €	2.420.140,00 €	22.009.215,74 €	30.856.067,21 €	2.031.811,00 €	28.824.256,56 €				
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						22.468.952,74 €	2.420.140,00 €	20.048.812,74 €	30.298.388,00 €	2.031.811,00 €	28.266.577,35 €	134,8%			
