



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: FERRARA**

Febbraio 2026



La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.2 del 20 marzo 2024, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	14.127.753,29 €	13.574.989,88 €	- 552.763,41 €	-4%
FONDO PERDUTO	3.478.650,00 €	3.053.522,00 €	- 425.128,00 €	-12%
TERZI	- €	- €	- €	0%
TOTALE	17.606.403,29 €	16.628.511,88 €	- 977.891,41 €	-6%

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 ammontano a 3.008.009,30 euro, mentre il massimo valore riconoscibile è 1.148.814,00 euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2024.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti leggermente inferiori rispetto al pianificato per circa il 6%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi all’Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio. I maggiori investimenti sono nel comparto acquedottistico, oltre il 60% del totale. Anche se complessivamente lo scostamento non è rilevante, si registrano diversi interventi con scostamenti rilevanti rispetto al pianificato (tra il -90% e il -100%); tuttavia si tratta per la maggior parte di scostamenti derivanti da interventi di risoluzione di interferenze su progetti di soggetti terzi, alcune ripianificazioni per mutate necessità del gestore, approfondimenti ulteriori in fase di progettazione.

Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	11.034.403,29 €	11.031.713,85 €	- 2.689,44 €	0,0%
FOGNATURA	3.777.000,00 €	2.381.651,21 €	- 1.395.348,79 €	-36,9%
DEPURAZIONE	2.565.000,00 €	3.089.745,55 €	524.745,55 €	20,5%
ACQUE BIANCHE	230.000,00 €	125.400,81 €	- 104.599,19 €	-45,5%
Totale	17.606.403,29 €	16.628.511,42 €	- 977.891,87 €	-5,6%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

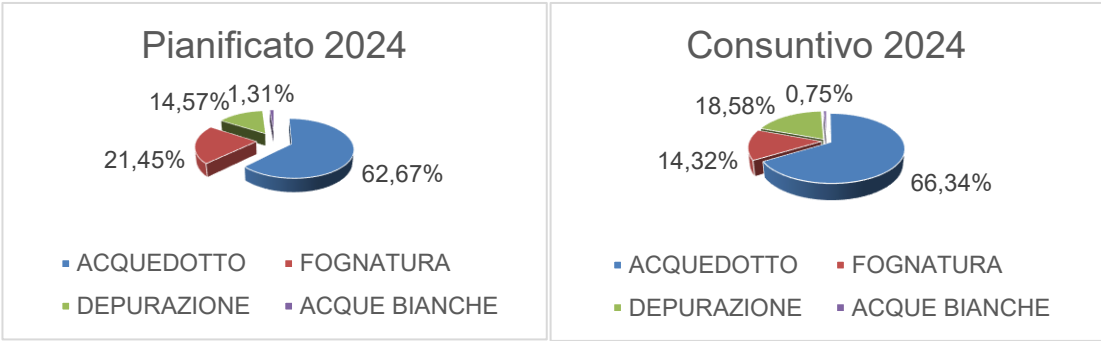


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie.

Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	6.584.657,57 €	6.455.232,30 €	- 129.425,27 €	-2%
FOGNATURA	1.200.000,00 €	935.112,80 €	- 264.887,20 €	-22%
DEPURAZIONE	1.000.000,00 €	1.314.840,76 €	314.840,76 €	31%
ACQUE BIANCHE	230.000,00 €	125.400,81 €	- 104.599,19 €	-45%
Totale	9.014.657,57 €	8.830.586,67 €	- 184.070,90 €	-2%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate puntualmente nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie cumulative; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

Per quanto attiene i microinterventi la tabella 5 riporta gli importi spesi (479 interventi) nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie e altri interventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti negli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

COMUNE	NUMERO	Consuntivo 2024
Argenta	46	683.835,96
Bondeno	46	869.399,02
Cento	37	787.554,04
Ferrara	260	7.605.035,84
Masi Torello	7	111.528,81
Poggio Renatico	16	347.686,70
Portomaggiore	20	358.031,96
Terre del Reno	20	378.826,07
Vigarano Mainarda	12	227.155,29
Voghiera	15	345.405,14
Totale complessivo	479	11.714.458,83

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).



Classe d'importo	Numero	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	14	1.219.011,43 €	1.764.307,66 €	545.296,23 €	45%
500.000-1.000.000 €	11	910.000,00 €	2.017.856,13 €	1.107.856,13 €	122%
1.000.000-2.000.000 €	7	694.734,29 €	549.096,39 €	- 145.637,90 €	-21%
2.000.000-5.000.000 €	4	793.000,00 €	83.788,91 €	- 709.211,09 €	-89%
Oltre 5.000.000 €	3	1.612.000,00 €	627.725,70 €	- 984.274,30 €	-61%
Manutenzioni	16	9.014.657,57 €	8.830.586,67 €	- 184.070,90 €	-2%
Altri cumulativi	14	3.363.000,00 €	2.755.149,96 €	- 607.850,04 €	-18%
Totale	69	17.606.403,29 €	16.628.511,42 €	- 977.891,87 €	-6%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

Macroindicatore	Consuntivo 2024
M0	48.392,90 €
M1	5.932.758,35 €
M2	- €
M3	2.366.155,73 €
M4a	1.148.159,42 €
M4b	25.314,48 €
M5	494.929,17 €
M6	2.343.035,92 €
Altro	4.269.765,45 €
Totale	16.628.511,42 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Importo di progetto
1	2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	€ 440.000,00
2	2024FEHA0008	SPOSTAMENTO RETI ACQUA INTERFERENTI CON PONTE BAILEY SANTA BIANCA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	€ 131.000,00
3	2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	€ 750.000,00
4	2022FEHA0009	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 âRISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	€ 1.215.532,00
5	2022FEHA0010	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 âRISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	€ 269.587,00
6	2024FEHA0004	INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 6 - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	€ 1.168.542,00

