



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024**

**GESTORE: AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
BACINO DI GESTIONE: COMUNE MONTECOPIOLO**

Febbraio 2026



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella seguente riporta la sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 9 del 18 aprile 2024, che il gestore AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	137.000,00 €	61.674,43 €	- 75.325,57 €	-55%
FONDO PERDUTO	- €	- €	- €	0%
TERZI	- €	- €	- €	0%
TOTALE	137.000,00 €	61.674,43 €	- 75.325,57 €	-55%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi i costi di struttura

Dai dati sopra riportati si nota come il gestore AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 55%.

Si specifica che nella tabella soprastante sono esclusi gli importi degli investimenti di struttura. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario di tali tipologie di intervento, si rinvia alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022 e n.51 del 17/11/2025.

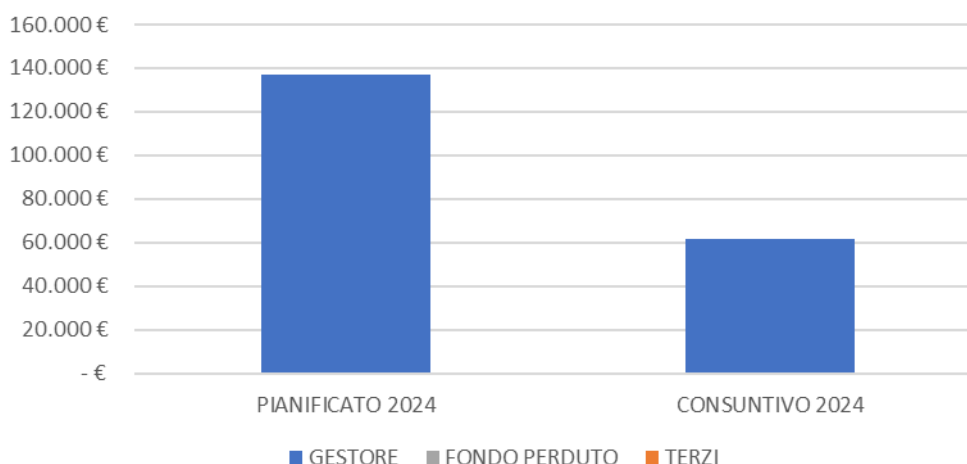


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024



2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Dall'analisi dei dati consuntivi, si registrano scostamenti rilevanti rispetto al pianificato nei tre i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, che sono stati motivati nelle note indicate in Allegato 1.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'intervento di adeguamento degli scarichi, l'affidamento della progettazione preliminare è avvenuto nel 2024, e la relazione è stata conclusa a marzo 2025.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	97.000,00 €	44.366,73 €	- 52.633,27 €	-54%
FOGNATURA	- €	11.067,70 €	11.067,70 €	N.C.
DEPURAZIONE	40.000,00 €	6.240,00 €	- 33.760,00 €	-84%
ACQUE BIANCHE	- €	- €	- €	N.C.
TOTALE	137.000,00 €	61.674,43 €	- 75.325,57 €	-55%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024, suddivisi per servizio, sono stati rappresentati anche graficamente, come segue. Nei grafici viene evidenziata l'incidenza degli importi dei servizi sul totale pianificato e sul totale consuntivato.

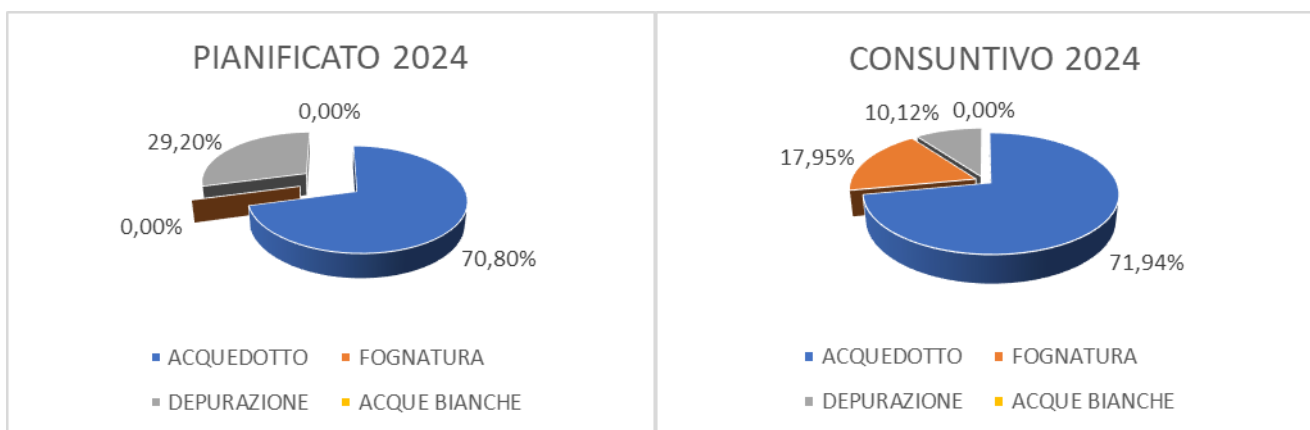


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati relativi alle manutenzioni straordinarie.

Gli investimenti di manutenzione straordinaria sono costituiti sia da opere individuate puntualmente nel programma degli investimenti sia da interventi cumulativi pluricomunali.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	68.000,00 €	37.707,53 €	- 30.292,47 €	-45%
FOGNATURA	- €	11.067,70 €	11.067,70 €	0%
DEPURAZIONE	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	-100%
ACQUE BIANCHE	- €	- €	- €	0%
TOTALE	78.000,00 €	48.775,23 €	- 29.224,77 €	-37%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riportano in TAB.4 gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale.

CLASSE D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	4	48.000,00 €	6.240,00 €	- 41.760,00 €	-87%
500.000-1.000.000 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.000.000-2.000.000 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.000.000-5.000.000 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Oltre 5.000.000 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TITOLI CUMULATIVI	4	72.000,00 €	55.434,43 €	- 16.565,57 €	-23%
ANNULLATI	2	17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	-
TERMINATI	0	- €	- €	- €	-
TOTALE	10	137.000,00 €	61.674,43 €	- 75.325,57 €	-55%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Per quanto attiene agli interventi cumulativi, la successiva TAB.5 riporta la distinta degli interventi consuntivati nei titoli cumulativi presenti nella programmazione.



Numero	Rif. ID ATERSIR	Codice	Descrizione	Consuntivo 2024
1	2024RNCR0001	1	ACQUISTO CONTATORI ACQUA	790,20
2	2024RNCR0005	1	MANUT SERBATOI STOCCAGGIO E RINVIO	16.042,00
3	2024RNCR0005	2	LAVORI DI RIPRISTINO CAPTAZIONI	7.729,90
4	2024RNCR0005	3	LOC VILLAGGIO DEL LAGO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO	902,50
5	2024RNCR0005	4	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO LOC.EREMO	8.114,08
6	2024RNCR0005	5	LAVORI DI DRENAGGIO SCARICO SORGENTE	3.749,05
7	2024RNCR0005	6	ACQUISTO CLORATORI	1.170,00
8	2024RNCR0007	1	MANUTENZIONE SORGENTI PUNTI DI PRESA	1.042,00
9	2024RNCR0007	2	NUOVO ALLACCIO E RIP. ACQUEDOTTO	1.612,00
10	2024RNCR0007	3	LINEA ACQUEDOTTO LOC. PUGLIANO	3.215,00
11	2024RNCR0008	1	LOC.VILLAGRANDE RIPARAZIONE FOGNE	6.402,20
12	2024RNCR0008	2	ACQUISTO MATERIALE FOGNATURA	557,00
13	2024RNCR0009	3	LOC.MONTEROTTO E CAVALCANESE RIPARAZIONE FOGNE	2.853,50
14	2024RNCR0008	4	LOC. CAMPODARCO RIPARAZIONE FOGNE	1.255,00
TOTALE				55.434,43

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per ID cumulativo

L'ARERA, con deliberazione n. 917/2017, ha introdotto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, definendo livelli minimi di servizio e obiettivi di qualità tecnica, mediante l'introduzione di indicatori e macro-indicatori.

I macro-indicatori di qualità tecnica del SII sono elencati nella tabella seguente.

SERVIZIO	MACROINDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguate qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)

FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua

TAB.6 – Macro-indicatori ARERA

La TAB.7 riporta gli investimenti realizzati nel 2024 suddivisi per il macro-indicatore ARERA di riferimento.

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
M0	- €
M1	6.659,20 €
M2	37.707,53 €
M3	- €
M4a	11.067,70 €
M4b	- €
M5	- €
M6	6.240,00 €
Altro	- €
Totale	61.674,43 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA


Infine, viene riportato l'elenco degli interventi, con la relativa motivazione, che, pur avendo un importo pianificato nell'annualità 2024, non hanno visto importi rendicontati nel 2024.



	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Note giustificative	Somma di Importo lordo pianificato 2024
1	2024RNCR0009	Depurazione: Manutenzione straordinaria area depuratore, depuratore capoluogo, altri impianti tecnici di depurazione	DEPURAZIONE	Montecopiolo	Gestore	IL VALORE ECONOMICO PREVISIONALE INCLUDEVA IN FASE INIZIALE PARTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CHE SARANNO REALIZZATI DURANTE LA MESSA A NORMA DEGLI SCARICHI DEGLI AGGLOMERATI; NELLA FASE PROGETTUALE 2026-2029 SARA' MANTENUTA QUESTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO CON IMPORTI CONSONI (RIDOTTI)	10.000,00
2	2024RNCR0004	Sorgenti: interventi su punti di presa sorgenti ove sono stati accertati episodi franosi (Piantata)	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	QUESTO INTERVENTO SARÀ ELIMINATO DALL'AGGIORNAMENTO DEL POI 2026-2029 E SOSTITUITO DA SINGOLE VALUTAZIONI GEOLOGICHE DI VERIFICA DEL DISSESTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PAI, DA EFFETTUARSI NEGLI AGGLOMERATI INTERESSATI DA SITUAZIONI DI FRANA ATTIVE O QUIESCENTI.	17.000,00
3	2024RNCR0006	Sorgenti: Manutenzione straordinaria aree di protezione sorgenti (reti di recinzione e piante).	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	IN FASE DI AGGIORNAMENTO POI 2026-2029 LE CIFRE SARANNO RIVISTE PER DESTINARE PIU' FONDI POSSIBILI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA DEGLI AGGLOMERATI DI SCARICO.	8.000,00
							35.000,00

TAB.8 – Interventi pianificati non rendicontati nel 2024





							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 9 del 18 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
1	2024RNCR0001	Sorgenti: sostituzione e incremento strumenti di misura alle sorgenti e serbatoi per misurazione e rilevazione di perdite della rete.	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	7.831,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	790,20 €	- €	- €	790,20 €	- 11.209,80 €	-93	
2	2024RNCR0002	Rete Idrica: sostituzione 500 mt di rete idrica in arrivo da sorgenti Monte Carpegna e Monteboaggine (direzione capoluogo).	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	44.061,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2024RNCR0003	Sorgente Pescaie: interventi di prevenzione rischio frane	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
4	2024RNCR0004	Sorgenti: interventi su punti di presa sorgenti ove sono stati accertati episodi franosi (Plantata)	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	52.710,00 €	17.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 17.000,00 €	-100	
5	2024RNCR0005	Acquedotto: manutenzione straordinaria impianti, strutture e opere di presa	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	77.729,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	37.707,53 €	- €	- €	37.707,53 €	- 22.292,47 €	-37	LO SCOSTAMENTO È RIFERITO AL PAGAMENTO EFFETTUATO NEL 2025 PER IL RESTAURO DI UN MANUFATTO SITO IN LOCALITÀ EREMO, DELL'IMPORTO DI EURO 29.719,36. I LAVORI, CONCLUSI A FINE 2024, SONO STATI SALDATI NELL'ANNO SUCCESSIVO
6	2024RNCR0006	Sorgenti: Manutenzione straordinaria aree di protezione sorgenti (reti di recinzione e piante).	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	5.523,00 €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 8.000,00 €	-100	
7	2024RNCR0007	Rete idrica: sostituzione reti singole frazioni	ACQUEDOTTO	Montecopiolo	Gestore	9.505,00 €	- €	- €	- €	- €	5.869,00 €	- €	- €	5.869,00 €	5.869,00 €	100	
8	2024RNCR0008	Fognatura: manutenzione straordinaria reti singole frazioni	FOGNATURA	Montecopiolo	Gestore	40.138,70 €	- €	- €	- €	- €	11.067,70 €	- €	- €	11.067,70 €	11.067,70 €	100	ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO RETI IN LOCALITÀ DIVERSE; IN FASE PROGETTUALE 2026-2029 SARA' PREVISTA UNA VOCE SPECIFICA DI MICROINTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER LA RETE FOGNARIA.
9	2024RNCR0009	Depurazione: Manutenzione straordinaria area depuratore, depuratore capoluogo, altri impianti tecnici di depurazione	DEPURAZIONE	Montecopiolo	Gestore	20.952,73 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	IL VALORE ECONOMICO PREVISIONALE INCLUDEVA IN FASE INIZIALE PARTE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CHE SARANNO REALIZZATI DURANTE LA MESSA A NORMA DEGLI SCARICHI DEGLI AGGLOMERATI; NELLA FASE PROGETTUALE 2026-2029 SARA' MANTENUTA QUESTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO CON IMPORTI CONSONI (RIDOTTI)
10	2024RNCR0010	Depurazione - Santa Rita Nord_Petrono: Adeguamenti impianti depurazione scarichi come da prescrizioni ARPAE (AUA) a seguito cambio Regione.	DEPURAZIONE	Montecopiolo	Gestore	140.632,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	6.240,00 €	- €	- €	6.240,00 €	- 23.760,00 €	-79	L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA DEI PUNTI DI SCARICO DEGLI AGGLOMERATI È AVVENUTO NEL 2024. LA RELAZIONE È STATA CONCLUSA A MARZO 2025, CON PAGAMENTO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025.
							Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							137.000,00 €	- €	- €	137.000,00 €	61.674,43 €	- €	- €	61.674,43 €	45%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							137.000,00 €	- €	- €	137.000,00 €	61.674,43 €	- €	- €	61.674,43 €			
