



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2024  
GESTORE: HERA S.P.A.  
BACINO DI GESTIONE DI: RAVENNA**

Febbraio 2026



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella seguente riporta la sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024, considerato anche il nulla osta tecnico rilasciato da ATERSIR con prot. n. 23/12/2024.0013148.U e relativo all'anticipo delle attività correlate all'intervento previsto nell'ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n.35/2024 con codice ER-UBIS-000082 (ID ATERSIR 2024RAHA0078), che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	<b>PIANIFICATO 2024</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF %</b>
<b>GESTORE</b>	17.487.199,99 €	17.688.882,05 €	201.682,06 €	1%
<b>FONDO PERDUTO</b>	9.741.650,01 €	12.462.205,50 €	2.720.555,49 €	28%
<b>SOGGETTI TERZI</b>	13.259.999,00 €	11.877.509,64 €	- 1.382.489,36 €	-10%
<b>TOTALE</b>	<b>40.488.849,00 €</b>	<b>42.028.597,19 €</b>	<b>1.539.748,19 €</b>	<b>4%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi i costi di struttura

Dai dati sopra riportati si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 4%.

Si specifica che nella tabella soprastante sono esclusi gli importi degli investimenti di struttura. Per l'anno 2024 il Gestore ha rendicontato un importo di investimenti di struttura pari a 3.734.590,41 euro, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile in tariffa è pari a 1.778.829,00 euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario di tali tipologie di intervento, si rinvia alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022 e n.51 del 17/11/2025.



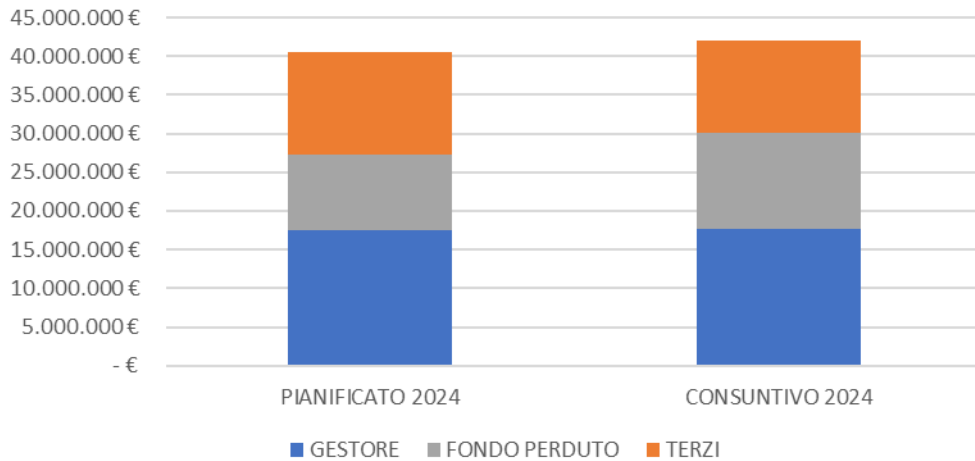


Fig. 1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

Dall'analisi dei dati consuntivi, si registrano gli scostamenti più rilevanti rispetto al pianificato: in aumento nel servizio depurazione, e in diminuzione nel servizio acquedotto.

La maggior parte degli scostamenti sono dovuti a: differenti esigenze di manutenzioni straordinarie rispetto a quanto pianificato, risoluzione di interferenze, necessità di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste, ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune priorità, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	23.580.850,00 €	20.633.056,75 €	- 2.947.793,25 €	-13%
FOGNATURA	6.948.999,00 €	7.083.905,14 €	134.906,14 €	2%
DEPURAZIONE	9.458.000,00 €	13.665.068,01 €	4.207.068,01 €	44%
ACQUE BIANCHE	501.000,00 €	646.567,29 €	145.567,29 €	29%
<b>TOTALE</b>	<b>40.488.849,00 €</b>	<b>42.028.597,19 €</b>	<b>1.539.748,19 €</b>	<b>4%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024, suddivisi per servizio, sono stati rappresentati anche graficamente come segue:



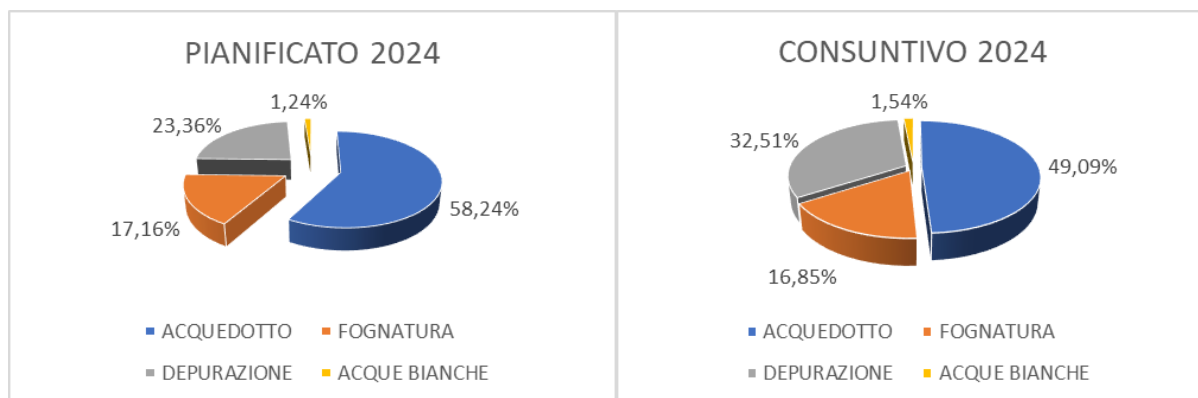


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati relativi alle manutenzioni straordinarie, specificando che gli investimenti di manutenzione straordinaria sono costituiti sia da opere individuate puntualmente nel programma degli investimenti sia da interventi cumulativi pluricomunali.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	9.346.634,65 €	10.077.945,36 €	731.310,71 €	8%
<b>FOGNATURA</b>	3.303.999,00 €	4.556.843,76 €	1.252.844,76 €	38%
<b>DEPURAZIONE</b>	2.968.000,00 €	4.410.812,60 €	1.442.812,60 €	49%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	501.000,00 €	646.567,29 €	145.567,29 €	29%
<b>TOTALE</b>	<b>16.119.633,65 €</b>	<b>19.692.169,01 €</b>	<b>3.572.535,36 €</b>	<b>22%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Per quanto attiene agli interventi cumulativi, la successiva tabella 4 riporta la distinta degli importi (importo totale complessivo 23.998.354,11 euro) e del numero di microinterventi (totale microinterventi: 814) suddivisi per comune.

Si tratta sia di piccoli interventi di manutenzione straordinaria sia di altri microinterventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti nei titoli cumulativi presenti nella programmazione annuale.



COMUNI	CONSUNTIVO 2024	NUMERO
Alfonsine	605.376,71	28
Bagnacavallo	723.695,93	36
Bagnara di Romagna	182.393,69	10
Brisighella	454.876,36	30
Casola Valsenio	148.851,52	29
Castel Bolognese	314.068,39	22
Cervia	3.129.133,49	88
Conselice	1.133.372,72	23
Cotignola	185.313,20	19
Faenza	3.544.622,72	115
Fusignano	562.261,32	18
Lugo	1.888.973,17	71
Massa Lombarda	612.953,34	31
Ravenna	8.942.527,97	208
Riolo Terme	477.571,05	31
Russi	659.488,25	26
Sant'Agata sul Santerno	128.231,81	12
Solarolo	260.926,00	13
Pozzi Bazzino	43.716,47	4
<b>Totale complessivo</b>	<b>23.998.354,11</b>	<b>814</b>


TAB.4 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale (sono esclusi i 2 investimenti di struttura).

Si specifica che l'incidenza dell'importo dei titoli cumulativi nell'annualità 2024 è da mettere in correlazione con la necessità di interventi a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e con il finanziamento PNRR per la riduzione delle perdite idriche.

CLASSE D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	61	1.922.000,00 €	590.124,68 €	-1.331.875,32 €	-69%
500.000-1.000.000 €	34	1.695.000,00 €	947.792,81 €	- 747.207,19 €	-44%
1.000.000-2.000.000 €	15	3.464.000,00 €	2.025.116,79 €	-1.438.883,21 €	-42%
2.000.000-5.000.000 €	22	1.749.000,00 €	2.503.142,65 €	754.142,65 €	43%
Oltre 5.000.000 €	21	10.307.000,00 €	11.964.066,15 €	1.657.066,15 €	16%
TITOLI CUMULATIVI	45	21.351.849,00 €	23.998.354,11 €	2.646.505,11 €	12%
ANNULLATI	1	- €	- €	- €	-
<b>TOTALE</b>	<b>199</b>	<b>40.488.849,00 €</b>	<b>42.028.597,19 €</b>	<b>1.539.748,19 €</b>	<b>4%</b>

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi



Con la deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 (e successivi aggiornamenti l'ARERA ha introdotto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, definendo livelli minimi di servizio e obiettivi di qualità tecnica, mediante l'introduzione di indicatori e macro-indicatori.

I macro-indicatori di qualità tecnica del SII sono elencati nella tabella seguente.

SERVIZIO	MACROINDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO
<b>ACQUEDOTTO</b>	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguata qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)
<b>FOGNATURA</b>	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)
<b>DEPURAZIONE</b>	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua

TAB.6 – Macro-indicatori ARERA

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati nel 2024 suddivisi per il macro-indicatore ARERA di riferimento.

Si denota una preminenza di investimenti orientati alla riduzione delle perdite idriche



lineari e percentuali (M1) e alla qualità dell'acqua depurata (M6).

Si specifica che all'indicatore "Altro" sono riferiti, ad esempio, gli interventi di risanamento degli scarichi, di adeguamento fognario o le estensioni acquedottistiche.

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
<b>M0</b>	2.444.791,80 €
<b>M1</b>	13.546.271,18 €
<b>M2</b>	386.795,53 €
<b>M3</b>	1.083.437,13 €
<b>M4a</b>	5.805.407,41 €
<b>M4b</b>	136.806,35 €
<b>M5</b>	376.432,66 €
<b>M6</b>	11.273.010,41 €
<b>Altro</b>	6.975.644,72 €
<b>Totale</b>	<b>42.028.597,19 €</b>

TAB.7 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA

Infine, viene riportato l'elenco degli interventi, con la relativa motivazione, che, pur avendo un importo pianificato nell'annualità 2024, non hanno visto importi rendicontati nel 2024.



	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Note giustificative	Somma di Importo lordo pianificato 2024
1	2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	Bagnacavallo	Gestore	ID STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A TEAM (ID 2024RAHA0007 E 2024RAHA0008). PRIMO STRALCIO IN ESECUZIONE, SECONDO STRALCIO DA PROGETTARE A PARTIRE DAL 2026	-
2	2024RAHA0035	RINNOVO RETE IDRICA CASOLA VALSENIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE È STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	57.000,00
3	2024RAHA0037	RINNOVO POTABILIZZATORE CASOLA VALSENIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE È STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	100.000,00
4	2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	Cervia	Gestore	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO	60.000,00
5	2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA	FOGNATURA	Conselice	Gestore	IL COMUNE NON HA ANCORA SOTTOSCRITTO ACCORDI CON IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. L'ATTUALE RETE FOGNARIA RISULTA FUNZIONANTE E NON PRESENTA CRITICITA'	80.000,00
6	2024RAHA0064	STUDIO SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO DI CONSELICE	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO ANNULLATO E RICOMPRESO NEL NUOVO ID 2025RAHA0012 "PNRR ALL. SISTEMAZIONE POTABILIZZATORE DI CONSELICE"	15.000,00
7	2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Cotignola	Gestore	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LO STUDIO E' STATO POSTICIPATO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	5.000,00
8	2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	Romagna Acque	INTERVENTO IN AUTORIZZAZIONE RFI. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A NON FATTURAZIONE AD ATERSIR PERCHE' L'INTERVENTO DEVE ESSERE STRALCIATO DALLA CONVENZIONE ATTUALE	14.000,00
9	2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	Faenza	Gestore	LO SCOSTAMENTO 2024 È LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO	50.000,00
10	2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Massa Lombarda	CONAMI	SCOSTAMENTO LEGATO A FATTURAZIONE BLOCCATA PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DEFINITI ALL'AGGIORNAMENTO DALL'ACCORDO ATTUATIVO IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO	216.000,00
11	2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RA-ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022RAHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO (RIQUALIFICAZIONE AREA	3.000,00



						PENSILE S.AGATA, PENSILE CASTEL BOLOGNESE, PENSILE SOLAROLO E PENSILE S.ALBERTO)	
12	2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	14.000,00
13	2022RAHA0025	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - RA-ATO 7 - TEAM	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	TEAM	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.	140.999,50
14	2024RAHA0034	POTENZIAMENTO BUBANO II STRALCIO E DISMISSIONE MASSA LOMBARDA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	L'INTERVENTO È STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON RISULTA PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.	15.000,00
15	2019RAHA0043	POTENZIAMENTO DEP.RAVENNA II STRALCIO - II LOTTO	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	INTERVENTO IN FASE AUTORIZZAZIONE PAUR. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO	36.000,00
16	2024RAHA0048	STUDIO PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE DEL DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	STUDIO RIPIANIFICATO AL 2025/2026 IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DEL PFTE SUL PROGETTO "POTENZIAMENTO DEP.RAVENNA 2°STR - 1° LOTTO" (ID 2024RAHA0046)	25.000,00
17	2024RAHA0077	ESTENSIONE RETE ACQUA IN VIA ARGINE DESTRO MONTONE LOCALITÀ RONCALCECI	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI. AVVIATA PROGETTAZIONE A FINE 2024 CON COSTI CHE VERRANNO CONSUNTIVATI NEL 2025.	5.000,00
18	2024RAHA0045	MESSA IN SICUREZZA PENSILE S. AGATA SUL SANTERNO	ACQUEDOTTO	Sant'Agata sul Santerno	Gestore	INTERVENTO RIPIANIFICATO, ATTUALMENTE ADOTTATA SOLUZIONE TEMPORANEA, GESTITA SU ID CUMULATIVO. IL PENSILE RISULTA ANCORA IN FUNZIONE.	150.000,00
							<b>985.999,50</b>

TAB.8 – Interventi pianificati non rendicontati nel 2024



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
1	2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Alfonsine	Gestore	3.099.885,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
2	2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	Alfonsine	TEAM	3.099.801,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
3	2024RAHA0023	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE TAGLIO CORELLI - ALFONSINE	DEPURAZIONE	Alfonsine	Gestore	304.550,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
4	2024RAHA0042	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA II STRALCIO - LONGASTRINO	FOGNATURA	Alfonsine	Gestore	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
5	2024RAHA0043	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA III STRALCIO - LONGASTRINO	FOGNATURA	Alfonsine	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
6	2014RAHA0009	POTENZIAMENTO RETE BONCELLINO - II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Bagnacavallo	Romagna Acque	461.047,98 €	- €	- €	- €	- €	54.175,52 €	- €	54.175,52 €	- €	54.175,52 €	100	0	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
7	2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	Bagnacavallo	Gestore	552.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.460,18 €	- €	- €	81.460,18 €	-81.460,18 €	-100	0	ID STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A TEAM (ID 2024RAHA0007 E 2024RAHA0008). PRIMO STRALCIO IN ESECUZIONE. SECONDO STRALCIO DA PROGETTARE A PARTIRE DAL 2026
8	2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLO	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	Gestore	1.200.522,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
9	2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	Gestore	802.284,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
10	2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	FOGNATURA	Bagnacavallo	Gestore	3.960,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
11	2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	FOGNATURA	Bagnacavallo	TEAM	1.100.000,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
12	2024RAHA0007	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SU SCOLO REDINO - I STRALCIO	FOGNATURA	Bagnacavallo	TEAM	680.888,19 €	453.000,00 €	- €	453.000,00 €	- €	360.749,03 €	- €	360.749,03 €	- €	92.250,97 €	-20	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2024 PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
13	2024RAHA0008	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SU SCOLO REDINO - II STRALCIO	FOGNATURA	Bagnacavallo	TEAM	567.694,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
14	2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITA' IDRAULICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	FOGNATURA	Bagnara di Romagna	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
15	2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	FOGNATURA	Brisighella	CONAMI	855.070,02 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	102.037,75 €	- €	102.037,75 €	- €	97.962,25 €	-48	0	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO ALLO SLITTAMENTO AL 2025 DI RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
16	2024RAHA0050	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	DEPURAZIONE	Brisighella	Gestore	479.768,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
17	2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	555.058,62 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	95.645,09 €	- €	- €	95.645,09 €	-24.354,91 €	-20	0	INTERVENTO CONCLUSO, MANCA INCASSO DEL CONTRIBUTO
18	2019RAHA0014	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA CHIESUOLA A MONTE BATTAGLIA NELLA PARTE ALTA DELLE VALLE DEL CESTINA PER 18 - 20 UTENZE	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
19	2019RAHA0015	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELL'ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 UTENZE	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
20	2024RAHA0016	ADEG. AGGLOMERATO ZATTAGLIA RINNOVO RETE IDRICA CASOLA	FOGNATURA	Casola Valsenio	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
21	2024RAHA0035	VALSENIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	93.480,00 €	57.000,00 €	45.600,00 €	- €	- €	11.400,00 €	- €	- €	- €	57.000,00 €	-100	0	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
22	2024RAHA0037	RINNOVO POTABILIZZATORE CASOLA VALSENIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	150.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	0	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
23	2024RAHA0051	RIORDINO BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	350.341,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
24	2024RAHA0052	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	227.210,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
25	2025RAHA0013	PNRR AII. RIPRISTINO DELLA CAP LAGHI CESTINA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
26	2024RAHA0024	INTERFERENZE VARIANTE SS 9 CASTELBOLOGNESE - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Castel Bolognese	Gestore	642.316,89 €	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	38.298,92 €	38.298,92 €	- €	- €	2.298,92 €	6	0	
27	2024RAHA0025	INTERFERENZE VARIANTE SS9 CASTELBOLOGNESE - FOGNATURA - C.CLIENTE	FOGNATURA	Castel Bolognese	Gestore	263.444,57 €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	- €	17.031,51 €	17.031,51 €	- €	- €	6.968,49 €	-29	0	
28	2024RAHA0053	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	FOGNATURA	Castel Bolognese	Gestore	2.811.199,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
29	2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNATURA	Cervia	Gestore	4.899.992,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
30	2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	Cervia	Gestore	508.420,63 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	-100	0	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
31	2019RAHA0018	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	ACQUEDOTTO	Cervia	Gestore	467.332,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
32	2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA	DEPURAZIONE	Cervia	Ravenna Holding	10.551.467,00 €	506.000,00 €	- €	506.000,00 €	- €	242.232,67 €	- €	242.232,67 €	- €	263.767,33 €	-52	0	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROLUNGARSI DELLA FASE DI GARA D'APPALTO CHE NON HA PERMESSO L'INIZIO LAVORI NEL 2024
33	2022RAHA0019	OTTIMIZZAZIONE F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	Cervia	Gestore	3.468.296,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
34	2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	1.232.003,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
35	2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Conselice	CONAMI	211.061,42 €	- €	- €	- €	- €	3.014,62 €	- €	3.014,62 €	- €	3.014,62 €	100	0	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
36	2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA	FOGNATURA	Conselice	Gestore	100.495,36 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	0	IL COMUNE NON HA ANCORA SOTTOSCRITTO ACCORDI CON IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. L'ATTUALE RETE FOGNARIA RISULTA FUNZIONANTE E NON PRESENTA CRITICITA'
37	2022RAHA0017	REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORRECCHIO	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	544.719,16 €	77.000,00 €	- €	- €	77.000,00 €	11.762,11 €	- €	- €	11.762,11 €	65.237,89 €	-84	0	INTERVENTO DI ESTENSIONE CASE SPARSE. POSTICIPO AVVIO LAVORI PER PROTRARSI DEI TEMPI DI APPROVAZIONE PROGETTO, A CAUSA DI DIFFICOLTA' CON ENTI E PRIVATI PER LA VALIDAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA
38	2024RAHA0041	ADEGUAMENTI RETI FOGNARIE CONSELICE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Conselice	Gestore	228.329,63 €	400.000,00 €	320.000,00 €	- €	80.000,00 €	228.329,63 €	228.329,63 €	- €	- €	171.670,37 €	-42	0	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
39	2024RAHA0054	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	DEPURAZIONE	Conselice	Gestore	499.696,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
40	2024RAHA0055	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	FOGNATURA	Conselice	Gestore	649.999,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
41	2024RAHA0056	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVEZZOLA	FOGNATURA	Conselice	Gestore	900.958,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
42	2024RAHA0064	STUDIO SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO DI CONSELICE	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO ANNULLATO E RICOMPRESO NEL NUOVO ID 2025RAHA0012 "PNRR ALL. SISTEMAZIONE POTABILIZZATORE DI CONSELICE"	
43	2025RAHA0012	PNRR All. Sistemazione potabilizzatore di Conselice	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
44	2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA	ACQUEDOTTO	Cotignola	Gestore	467.332,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
45	2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Cotignola	Gestore	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LO STUDIO E' STATO POSTICIPATO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	
46	2022RAHA0007	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO CONSORTILE BRIGNANI MORTO	FOGNATURA	Cotignola	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
47	2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART. VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	Romagna Acque	457.562,21 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	-100	INTERVENTO IN AUTORIZZAZIONE RFI. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A NON FATTURAZIONE AD ATERSIR PERCHE' L'INTERVENTO DEVE ESSERE STRALCIATO DALLA CONVENZIONE ATTUALE	
48	2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	Faenza	Gestore	2.642.860,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
49	2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	Faenza	Gestore	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO. IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO	
50	2022RAHA0020	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	Gestore	8.370.484,66 €	- €	- €	- €	- €	17.165,60 €	- €	- €	17.165,60 €	17.165,60 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'OPPORTUNITA' DI ESEGUIRE RILIEVI ED INDAGINI IN CONCOMITANZA CON LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOLLEVAMENTO BAMBOLE	
51	2024RAHA0027	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO FAENZA Priorità 1 (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	788.715,62 €	91.000,00 €	72.800,00 €	- €	18.200,00 €	4.478,62 €	- €	- €	4.478,62 €	86.521,38 €	-95	RIPERIMETRAZIONE INTERVENTO ED EFFORT PROGETTUALE FOCALIZZATO SUL PROGETTO "IDROVORE MOBILI/TEMPORANEE" E ADEGUAMENTI FOGNARI PER INCREMENTO SICUREZZA IDRAULICA RETE DI DRENAGGIO FAENZA (RA) STRALCIO DI VIA FIRENZE FINANZIATO PNRR M2C4I2.1.A. (CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000070) - ID ATERSIR 2025RAHA0011	
52	2024RAHA0028	IMPIANTO IDROVORO LAPI IP 6 (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	6.163.426,32 €	137.000,00 €	109.600,00 €	- €	27.400,00 €	10.258,86 €	- €	- €	10.258,86 €	126.741,14 €	-92	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN FUNZIONE DELLE PRIORITA' E DELLE CRITICITA' DEL TERRITORIO	
53	2024RAHA0029	IMPIANTO IDROVORO BANDIERA (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	3.658.909,99 €	27.000,00 €	21.600,00 €	- €	5.400,00 €	7.932,38 €	- €	- €	7.932,38 €	19.067,62 €	-70	0	
54	2024RAHA0030	IMPIANTO IDROVORO DE GASPERI (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	8.407.405,84 €	- €	- €	- €	- €	1.298,70 €	- €	- €	1.298,70 €	1.298,70 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'OPPORTUNITA' DI ESEGUIRE RILIEVI IN CONCOMITANZA CON LO SVILUPPO DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAPI 6	
55	2024RAHA0031	IMPIANTO IDROVORO PIAZZA (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	8.219.039,01 €	- €	- €	- €	- €	1.298,70 €	- €	- €	1.298,70 €	1.298,70 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'OPPORTUNITA' DI ESEGUIRE RILIEVI IN CONCOMITANZA CON LO SVILUPPO DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAPI 6	
56	2024RAHA0032	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO FAENZA Priorità 2 (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	913.576,54 €	- €	- €	- €	- €	3.626,59 €	- €	- €	3.626,59 €	3.626,59 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALI PER STUDIO PRELIMINARE INTERVENTO	
57	2024RAHA0033	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO FAENZA Priorità 3 (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	469.734,28 €	- €	- €	- €	- €	3.626,59 €	- €	- €	3.626,59 €	3.626,59 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALI PER STUDIO PRELIMINARE INTERVENTO	
58	2024RAHA0038	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA - II STRALCIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Faenza	Gestore	2.671.801,18 €	201.000,00 €	160.800,00 €	- €	40.200,00 €	240.522,84 €	240.522,84 €	- €	- €	39.522,84 €	19	0	
59	2024RAHA0039	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA - III STRALCIO	DEPURAZIONE	Faenza	Gestore	20.029.411,36 €	600.000,00 €	480.000,00 €	- €	120.000,00 €	104.184,79 €	- €	- €	104.184,79 €	495.815,21 €	-82	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROLUNGARSI DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE STRALCIO I E II IN QUANTO PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DELLA SOLUZIONE PREVISTA PER LO STRALCIO III	
60	2024RAHA0040	REALIZZAZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO BAMBOLE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	6.518.309,21 €	483.000,00 €	386.400,00 €	- €	96.600,00 €	285.153,95 €	445.285,79 €	- €	- €	160.131,84 €	-40	INTERVENTO IN FASE DI AUTORIZZAZIONE (CONFERENZA DEI SERVIZI IN CORSO).	
61	2024RAHA0044	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO FAENZA Priorità 4 (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	3.738.657,00 €	- €	- €	- €	- €	2.424,44 €	- €	- €	2.424,44 €	2.424,44 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALI PER STUDIO PRELIMINARE INTERVENTO	
62	2024RAHA0049	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA - I STRALCIO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Faenza	Gestore	4.070.762,31 €	928.000,00 €	742.400,00 €	- €	185.600,00 €	1.529.101,40 €	1.551.921,52 €	- €	- €	22.820,12 €	64	INTERVENTO IN FASE DI AUTORIZZAZIONE (CDS IN CORSO).	
63	2024RAHA0057	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	ACQUEDOTTO	Faenza	Gestore	3.500.000,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
64	2024RAHA0058	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	FOGNATURA	Faenza	Gestore	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
65	2024RAHA0078	PNRR All. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI LAMONE	FOGNATURA	Faenza	Gestore	500.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	110.884,88 €	- €	- €	110.884,88 €	4.115,12 €	-3	0	
66	2025RAHA0011	PNRR All. IDROVORE MOBILI FAENZA	FOGNATURA	Faenza	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	262.645,42 €	- €	- €	262.645,42 €	262.645,42 €	100	0	
67	2014RAHA0066	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORDINA	FOGNATURA	Fusignano	Gestore	537.185,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
68	2014RAHA0067	STUDIO ALIMENTAZIONE RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	ACQUEDOTTO	Lugo	Gestore	61.391,82 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	19.426,73 €	- €	- €	19.426,73 €	30.573,27 €	-61	E' STATO REDATTO IL PFTE A VALLE DEL QUALE, ANALIZZANDO LE LOGICHE DI SERVIZIO, SI E' VALUTATO DI NON AVVIARE L'INTERVENTO, MA DI ATTENDERE LO SVILUPPO DEL COLLEGAMENTO AL POTABILIZZATORE DI BUBANO	
69	2014RAHA0071	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	5.954.263,15 €	1.643.000,00 €	- €	- €	1.643.000,00 €	2.196.759,20 €	- €	- €	2.196.759,20 €	553.759,20 €	33	INTERVENTO IN ESECUZIONE SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO PREZZI (DM AIUTI)	
70	2014RAHA0077	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - III STRALCIO (S. Martina)	FOGNATURA	Lugo	Gestore	675.360,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
71	2014RAHA0078	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - II STRALCIO (V. Villa)	FOGNATURA	Lugo	Gestore	379.897,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
72	2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	529.760,76 €	- €	- €	- €	- €	15.953,60 €	- €	- €	15.953,60 €	15.953,60 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI	
73	2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	Romagna Acque	5.200.224,00 €	1.595.000,00 €	- €	1.595.000,00 €	- €	1.726.552,83 €	- €	1.726.552,83 €	- €	131.552,83 €	8	0	
74	2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	Lugo	Gestore	172.967,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
75	2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	63.619,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
76	2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	TEAM	5.932.437,27 €	156.000,00 €	- €	156.000,00 €	- €	20.593,99 €	- €	20.593,99 €	- €	135.406,01 €	-86	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESECUZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI LUGO
77	2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	342.987,38 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	6.947,99 €	- €	- €	6.947,99 €	58.052,01 €	-89	L'ATTIVITA' DI MODELLAZIONE E' SLITTATA AL 2025 PER LA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNA IMPORTANTE CAMPAGNA DI RILIEVI IN CAMPO, CON ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
78	2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	475.942,55 €	101.000,00 €	- €	- €	101.000,00 €	43.095,19 €	- €	- €	43.095,19 €	57.904,81 €	-57	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESECUZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI LUGO.
79	2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	TEAM	60.000,00 €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	7.191,57 €	- €	7.191,57 €	- €	34.808,43 €	-82	NEL 2024 E' STATO SVILUPPATO IL PROGETTO ESECUTIVO, ATTUALMENTE SONO STATI RICHIESTI ED OTTENUTI I PERMESSI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE, REALIZZAZIONE PREVISTA NEL 2025
80	2024RAHA0012	STUDIO SISTEMA FOGNARIO LUGO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	163.444,94 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	80.332,38 €	- €	- €	80.332,38 €	19.667,62 €	-19	0
81	2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Massa Lombarda	CONAMI	2.173.230,01 €	216.000,00 €	- €	216.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	216.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO A FATTURAZIONE BLOCCATA PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DEFINITI ALL'AGGIORNAMENTO DALL'ACCORDO ATTUATIVO IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO
82	2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTI/SAFFI	FOGNATURA	Massa Lombarda	Gestore	1.188,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
83	2024RAHA0022	POTENZIAMENTO ADDUZIONE IDRICA RETE MASSA L. S.AGATA	ACQUEDOTTO	Massa Lombarda	Gestore	305.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
84	2024RAHA0059	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	FOGNATURA	Massa Lombarda	Gestore	3.300.283,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
85	2014RAHA0090	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA-ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	925.700,00 €	- €	- €	925.700,00 €	861.128,83 €	- €	- €	861.128,83 €	64.571,17 €	-6	0
86	2014RAHA0091	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.397.000,00 €	- €	- €	1.397.000,00 €	2.079.391,71 €	- €	- €	2.079.391,71 €	682.391,71 €	48	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
87	2014RAHA0092	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RA-ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	23.131,24 €	- €	- €	23.131,24 €	36.868,76 €	-61	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
88	2014RAHA0093	RINNOVO RETI/ALLACCI ACQUA DA PI - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.859.000,00 €	- €	- €	2.859.000,00 €	3.229.660,42 €	- €	- €	3.229.660,42 €	370.660,42 €	12	0
89	2014RAHA0094	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.083.000,00 €	- €	- €	1.083.000,00 €	2.102.954,67 €	- €	- €	2.102.954,67 €	1.019.954,67 €	94	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
90	2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	CONAMI	20.660.000,01 €	3.729.000,00 €	- €	3.729.000,00 €	- €	2.444.791,80 €	- €	2.444.791,80 €	- €	1.284.208,20 €	-34	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RALLENTAMENTO NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI COSTRUTTIVI NECESSARI A REALIZZARE L'OPERA E INERZIA DELL'IMPRESA NELLA PRESENTAZIONE DEI SUBAPPALTI
91	2014RAHA0102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	583.000,00 €	- €	- €	583.000,00 €	1.542.226,42 €	- €	- €	1.542.226,42 €	959.226,42 €	164	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
92	2014RAHA0105	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	333.000,00 €	- €	- €	333.000,00 €	885.193,25 €	- €	- €	885.193,25 €	552.193,25 €	165	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
93	2014RAHA0106	RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA-ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	366.000,00 €	- €	- €	366.000,00 €	482.251,17 €	- €	- €	482.251,17 €	116.251,17 €	31	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
94	2014RAHA0107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	112.000,00 €	- €	- €	112.000,00 €	223.063,21 €	- €	- €	223.063,21 €	111.063,21 €	99	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
95	2014RAHA0173	SOST. CTR PARI CALIBRO - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.362.918,26 €	- €	- €	1.362.918,26 €	369.003,86 €	- €	- €	369.003,86 €	993.914,40 €	-72	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
96	2014RAHA0177	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-RA-ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	136.980,53 €	- €	- €	136.980,53 €	36.980,53 €	36	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
97	2014RAHA0178	RINNOVO RETI/ALLACCI FOG. DA PI - RA-ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	565.000,00 €	- €	- €	565.000,00 €	1.096.301,37 €	- €	- €	1.096.301,37 €	531.301,37 €	94	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
98	2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RA-ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.591.215,97 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	-100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022RAHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO (RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE S.AGATA, PENSILE CASTEL BOLOGNESE, PENSILE SOLAROLO E PENSILE S.ALBERTO)
99	2015RAHA0018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - RA - ATO 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	234.302,30 €	- €	- €	234.302,30 €	154.302,30 €	192	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
100	2015RAHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - RA-ATO7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	11.674,62 €	- €	- €	11.674,62 €	98.325,38 €	-89	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
101	2015RAHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - RA-ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €	45.054,75 €	- €	- €	45.054,75 €	3.945,25 €	-8	0
102	2018RAHA0010	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.676.728,00 €	- €	- €	1.676.728,00 €	3.704.458,80 €	- €	- €	3.704.458,80 €	2.027.730,80 €	120	0
103	2018RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	357.000,00 €	- €	- €	357.000,00 €	447.850,54 €	- €	- €	447.850,54 €	90.850,54 €	25	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
104	2018RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	144.000,00 €	- €	- €	144.000,00 €	198.716,75 €	- €	- €	198.716,75 €	54.716,75 €	37	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
105	2018RAHA0013	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICS e TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	30.131,61 €	- €	- €	30.131,61 €	30.131,61 €	100	0
106	2019RAHA0035	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.054.739,45 €	1.303.772,57 €	- €	- €	249.033,12 €	-12	0
107	2019RAHA0038	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 7 RA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	275.956,78 €	362.229,30 €	- €	- €	86.272,52 €	-44	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
108	2022RAHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €	119.640,75 €	- €	- €	119.640,75 €	100.640,75 €	529	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILIEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
109	2022RAHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	66.000,00 €	- €	- €	66.000,00 €	19.189,70 €	- €	- €	19.189,70 €	46.810,30 €	-70	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
110	2022RAHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	187.646,15 €	- €	- €	187.646,15 €	187.646,15 €	100	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 7. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2024 IL DELTA E' DOVUTO AD UN ANTICIPO DELLE ATTIVITA'.
111	2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
112	2022RAHA0005	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
113	2022RAHA0014	STUDIO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PERIMETRO CONAMI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	168.380,23 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	46.783,55 €	- €	- €	46.783,55 €	- 3.216,45 €	-6	0	
114	2022RAHA0018	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	2.190.000,00 €	- €	2.190.000,00 €	- €	2.013.752,74 €	- €	2.013.752,74 €	- €	- 176.247,26 €	-8	0	
115	2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	1.130.961,85 €	- €	1.130.961,85 €	- €	530.961,85 €	88		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
116	2022RAHA0022	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	239.999,50 €	- €	239.999,50 €	- €	87.763,23 €	- €	87.763,23 €	- €	- 152.236,27 €	-63		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
117	2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	127.451,08 €	- €	127.451,08 €	- €	27.451,08 €	27		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
118	2022RAHA0024	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA-ATO7 - TEAM	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
119	2022RAHA0025	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7 - TEAM	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	TEAM	- €	140.999,50 €	- €	140.999,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 140.999,50 €	-100		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
120	2022RAHA0026	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA-ATO7 - RAVENNA HOLDING	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
121	2022RAHA0027	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	209.422,69 €	- €	209.422,69 €	- €	59.422,69 €	39		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA RAVENNA HOLDING SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
122	2022RAHA0028	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	288.008,84 €	- €	288.008,84 €	- €	188.008,84 €	188		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA RAVENNA HOLDING SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
123	2022RAHA0029	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - RAVENNA HOLDING	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	417.492,72 €	- €	417.492,72 €	- €	- 82.507,28 €	-16	0	
124	2024RAHA0001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	544.482,75 €	180.000,00 €	144.000,00 €	- €	36.000,00 €	222.308,30 €	430.356,98 €	- €	208.048,68 €	42.308,30 €	23		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
125	2024RAHA0002	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	711.292,22 €	460.000,00 €	368.000,00 €	- €	92.000,00 €	38.885,91 €	108.928,43 €	- €	70.042,52 €	- 421.114,09 €	-91		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
126	2024RAHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARIE - ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	1.447.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	- €	40.000,00 €	576.918,92 €	1.185.617,23 €	- €	608.698,31 €	376.918,92 €	188		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
127	2024RAHA0004	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI - ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	628.087,73 €	120.000,00 €	96.000,00 €	- €	24.000,00 €	302.137,21 €	623.084,07 €	- €	320.946,86 €	182.137,21 €	151		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
128	2024RAHA0005	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	802.908,88 €	440.000,00 €	352.000,00 €	- €	88.000,00 €	189.642,86 €	804.477,19 €	- €	614.834,33 €	- 250.357,14 €	-56		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
129	2024RAHA0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	355.838,67 €	- €	- €	355.838,67 €	205.838,67 €	137		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA FANGHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
130	2024RAHA0034	POTENZIAMENTO BUBANO II STRALCIO E DISMISSIONE MASSA LOMBARDA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 15.000,00 €	-100	0	L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON RISULTA PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.
131	2024RAHA0071	PNRR Rinnovi Rete Acquedotto ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.490.000,43 €	457.934,65 €	949.298,53 €	- €	491.363,88 €	406.210,51 €	949.298,53 €	- €	543.088,02 €	- 51.724,14 €	-11	0	
132	2024RAHA0072	PNRR Distrettualizzazione ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	540.500,29 €	151.331,43 €	136.198,29 €	- €	15.133,14 €	45.413,16 €	136.198,29 €	- €	90.785,13 €	- 105.918,27 €	-69	0	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
133	2024RAHA0073	PNRR Ricerca perdite ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	0	0	
134	2024RAHA0074	PNRR Sensoristica Qualità ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	100.000,29 €	56.019,00 €	58.887,09 €	- €	2.868,09 €	80.778,01 €	58.887,08 €	- €	21.890,93 €	24.759,01 €	44		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI SENSORISTICA SULLE RETI IDRICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
135	2024RAHA0075	PNRR Smart Meter ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.380.000,00 €	2.829.946,66 €	975.621,00 €	- €	1.854.325,66 €	1.879.308,94 €	975.866,10 €	- €	903.442,84 €	- 950.637,72 €	-33	0	ID CUMULATIVO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE E POSA DI CONTATORI SMART VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE. INTERVENTO FINANZIATO PNRR NELLA MISURA M2C4.
136	2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE "CORSO NORD" - III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	594.433,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
137	2014RAHA0120	COMPL.COND.IDRICA RAV NORD CASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	Ravenna	Romagna Acque	2.658.092,00 €	46.000,00 €	- €	46.000,00 €	- €	94.877,85 €	- €	94.877,85 €	- €	48.877,85 €	106		SCOSTAMENTO 2024 PER ANTICIPO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. OTTENUTO TITOLO ABILITATIVO (GC DEL 17/6/2025)
138	2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	5.401.728,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
139	2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	974.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
140	2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	15.657.944,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
141	2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	21.106.557,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
142	2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	580.541,42 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	6.062,66 €	- €	- €	6.062,66 €	53.937,34 €	-89	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
143	2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	6.320.468,53 €	- €	- €	- €	- €	238.915,24 €	- €	- €	238.915,24 €	238.915,24 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AD INTERVENTO INTEGRATIVO (DEMOLIZIONE IDROVORA PIRANO) NON PREVISTO NEL PROGETTO ORIGINALE
144	2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	2.432.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
145	2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° stralcio	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.084.644,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
146	2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° stralcio	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.059.708,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
147	2018RAHA0005	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - 1° STRALCIO (collettori+potenziamento idrovora Sapir)	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	3.956.525,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
148	2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Ravenna Holding	905.622,52 €	384.000,00 €	- €	384.000,00 €	- €	209.398,94 €	- €	209.398,94 €	- €	174.601,06 €	-45	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLE TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE A RAVENNA HOLDING
149	2019RAHA0043	POTENZIAMENTO DEP.RAVENNA II STRALCIO - II LOTTO	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	28.822.513,35 €	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE AUTORIZZAZIONE PAUR. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
150	2019RAHA0044	DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	3.888.191,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
151	2019RAHA0047	DARSENIA CITTÀ 2° STR.PREMENTE VIA ROMEA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	655.000,00 €	39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- €	60.036,12 €	- €	60.036,12 €	- €	21.036,12 €	53	SCOSTAMENTO DOVUTO A MAGGIORI ONERI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA; INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE.
152	2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREA PORTUALE- POLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
153	2019RAHA0050	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI - NUOVA RETE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.199.184,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
154	2019RAHA0051	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	999.999,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
155	2019RAHA0052	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MARINA RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	2.400.142,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
156	2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	151.582,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
157	2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	412.761,52 €	112.000,00 €	- €	112.000,00 €	- €	10.802,72 €	- €	10.802,72 €	- €	101.197,28 €	-90	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A MINORI LAVORAZIONI (MANCATA RIMOZIONE/SMALTIMENTO DELLA TUBAZIONE ESISTENTE POICHE' SOLUZIONE TECNICA RISULTATA NON PRATICABILE PER INTERFERENZA LINEA ELETTRICA)
158	2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	1.383.059,53 €	212.000,00 €	- €	212.000,00 €	- €	34.334,23 €	- €	34.334,23 €	- €	177.665,77 €	-83	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
159	2022RAHA0009	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPIR 3-SAPIR 1	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	234.893,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
160	2022RAHA0010	SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	409.097,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
161	2022RAHA0012	ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - ACQUEDOTTO S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	1.652.932,80 €	1.211.000,00 €	- €	- €	1.211.000,00 €	18.305,06 €	- €	- €	- €	18.305,06 €	-98	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROLUNGARSI DELLA TEMPISTICA DI RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI RAVENNA (RICHIESTA PROT. 16544 DEL 21/02/2024)
162	2022RAHA0013	ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - FOGNATURA S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	435.324,24 €	342.000,00 €	- €	- €	342.000,00 €	40,00 €	- €	- €	40,00 €	341.960,00 €	-99	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROLUNGARSI DELLA TEMPISTICA DI RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI RAVENNA (RICHIESTA PROT. 115577-51761 DEL 02/01/2024)
163	2022RAHA0030	VARIANTE SS 16 RAVENNA - ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	1.205.406,15 €	293.000,00 €	- €	- €	293.000,00 €	50.530,99 €	- €	- €	50.530,99 €	242.469,01 €	-82	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI: PRIMO STRALCIO COMPLETATO, SECONDO STRALCIO IN CORSO DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
164	2022RAHA0031	VARIANTE SS 16 RAVENNA - FOGNATURA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.209.067,63 €	527.000,00 €	- €	- €	527.000,00 €	603,37 €	- €	- €	603,37 €	526.396,63 €	-99	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
165	2024RAHA0009	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	500.708,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
166	2024RAHA0010	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	912.000,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
167	2024RAHA0011	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAVENNA NORD-CASALBORSETTI II STR	ACQUEDOTTO	Ravenna	Ravenna Holding	2.967.600,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
168	2024RAHA0013	RADDOPPIO LINEA SAPIR 1-TORRINO MARCEGAGLIA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	509.025,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
169	2024RAHA0014	RADDOPPIO ATTRAVERSAM. CANALE CANDIANO	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	888.817,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
170	2024RAHA0015	ULTERIORI INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI VERSATI BACINO PIRANO	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	7.434.892,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
171	2024RAHA0020	ULTERIORI INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI VERSATI BACINO NORD CITTÀ	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	35.036.158,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
172	2024RAHA0021	ULTERIORI INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI VERSATI BACINO BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	28.604.257,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
173	2024RAHA0026	COMPLETAMENTO CONDOTTA IDRICA RAVENNA NORD CASALBORSETTI -III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Romagna Acque	2.285.709,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
174	2024RAHA0046	POTENZIAMENTO DEP RAVENNA 2°STR - 1° LOTTO	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	37.074.624,86 €	68.000,00 €	- €	- €	68.000,00 €	1.793.765,56 €	- €	- €	1.793.765,56 €	1.725.765,56 €	2537	SCOSTAMENTO LEGATO AD ACCORPAMENTO ID A SEGUITO DEL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE
175	2024RAHA0047	POTENZIAMENTO DEP RAVENNA 2°STR - 2° LOTTO	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
176	2024RAHA0048	STUDIO PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE DEL DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	50.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	-100	STUDIO RIPIANIFICATO AL 2025/2026 IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DEL PFTE SUL PROGETTO "POTENZIAMENTO DEP.RAVENNA 2°STR - 1° LOTTO" (ID 2024RAHA0046)
177	2024RAHA0063	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	2.432.056,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0
178	2024RAHA0065	PNRR - POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 1°STR.	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	8.504.746,01 €	1.354.000,00 €	1.354.000,00 €	- €	- €	2.881.094,26 €	2.215.160,42 €	- €	665.933,84 €	1.527.094,26 €	112	INTERVENTO RIPIANIFICATO PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE (INDISPONIBILITA' ATTREZZATURE) ED ACCELERAZIONE FASI DI LAVORO CON MAGGIORE PRODUZIONE
179	2024RAHA0067	SPOSTAMENTO RETE ACQUA V.BONIFICA	ACQUEDOTTO	Ravenna	Ravenna Holding	1.748.092,01 €	1.168.000,00 €	- €	1.168.000,00 €	- €	1.603.583,11 €	- €	1.603.583,11 €	- €	435.583,11 €	37	ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE DAL 2025 AL 2024. INTERVENTO CONCLUSO
180	2024RAHA0068	SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA V.BONIFICA	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	2.367.651,49 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	- €	628.283,74 €	- €	628.283,74 €	- €	297.283,74 €	89	ANTICIPO ATTIVITA' PRELIMINARI DI CANTIERE QUALI AD ESEMPIO ACQUISTO DI MATERIALE
181	2024RAHA0069	POTENZIAMENTO RETE IDRICA V.REALE E V.BAGARINA (I STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	491.368,46 €	29.000,00 €	20.000,00 €	- €	9.000,00 €	8.916,49 €	- €	- €	8.916,49 €	20.083,51 €	-69	RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE

Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 9 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		Note giustificative	
							Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%		
182	2024RAHA0070	POTENZIAMENTO RETE IDRICA V.REALE E V.BAGARINA (II STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	80.671,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
183	2024RAHA0076	PNRR - COMPLETAMENTO CONDOTTA RAVENNA NORD-CASALBORSETTI II STR	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	1.639.999,00 €	50.000,00 €	592.145,10 €	- €	542.145,10 €	55.114,61 €	591.900,00 €	- €	536.785,39 €	5.114,61 €	10	0	
184	2024RAHA0077	ESTENSIONE RETE ACQUA IN VIA ARGINE DESTRO MONTONE LOCALITÀ RONCALCECI	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	106.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	-100	SCOSTAMENTO 2024 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI. AVVIATA PROGETTAZIONE A FINE 2024 CON COSTI CHE VERRANNO CONSUNTIVATI NEL 2025.	
185	2024RAHA0036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE DI RIOLO TERME (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Riolo Terme	Gestore	129.039,11 €	66.000,00 €	52.800,00 €	- €	13.200,00 €	8.536,61 €	129.039,10 €	- €	120.502,49 €	57.463,39 €	-87	-87	INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO E' RELATIVO AL FATTO CHE LA REALIZZAZIONE SI E' SVILUPPATA IN PRATICA TUTTA NEL 2023, IN ANTICIPO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI.
186	2024RAHA0060	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V.MASSARENTI	FOGNATURA	Riolo Terme	Gestore	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
187	2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	FOGNATURA	Russi	Romagna Acque	580.981,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
188	2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	Russi	Gestore	583.090,03 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	10.318,68 €	- €	- €	10.318,68 €	49.681,32 €	-82	-82	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO. IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
189	2019RAHA0059	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR-ACQ	ACQUEDOTTO	Russi	Gestore	480.265,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
190	2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR-FOG	FOGNATURA	Russi	Romagna Acque	477.505,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
191	2019RAHA0061	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	Russi	Gestore	2.605.000,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
192	2024RAHA0066	ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO GODO PER MONALDINA 3° STRALCIO	FOGNATURA	Russi	Gestore	244.450,49 €	- €	- €	- €	- €	8.813,09 €	- €	- €	8.813,09 €	8.813,09 €	100	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AD ANTICIPO PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTO RFI, INTERVENTO IN AUTORIZZAZIONE.
193	2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITÀ DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBALDI	FOGNATURA	Sant'Agata sul Santerno	Gestore	3.608,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
194	2024RAHA0017	ADEG. AGGLOMERATO SANT'AGATA SUL SANTERNO - VIA ERBOSA	FOGNATURA	Sant'Agata sul Santerno	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
195	2024RAHA0045	MESSA IN SICUREZZA PENSILE S. AGATA SUL SANTERNO	ACQUEDOTTO	Sant'Agata sul Santerno	Gestore	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	-100	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO, ATTUALMENTE ADOTTATA SOLUZIONE TEMPORANEA, GESTITA SU ID CUMULATIVO. IL PENSILE RISULTA ANCORA IN FUNZIONE.
196	2017RAHA0016	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE-ISTRALCIO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	385.606,88 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	43.060,49 €	- €	- €	43.060,49 €	18.060,49 €	72	72	
197	2022RAHA0008	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA SCOLO CONSORTILE RIO BARBIANO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
198	2024RAHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO SOLAROLO - VIA MOLINELLO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	763.436,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
199	2024RAHA0019	ADEG. AGGLOMERATO CASERMONE SAN BARTOLO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
200	2024RAHA0061	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	1.178.930,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
201	2024RAHA0062	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	

	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	42.165.577,00 €	9.741.650,01 €	13.259.999,00 €	19.163.927,99 €	45.763.187,60 €	12.462.205,50 €	11.877.509,64 €	21.423.472,46 €	<b>104%</b>
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	40.488.849,00 €	9.741.650,01 €	13.259.999,00 €	17.487.199,99 €	42.028.597,19 €	12.462.205,50 €	11.877.509,64 €	17.688.882,05 €	

