



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO DI GESTIONE DI: FORLÌ-CESENA**

Febbraio 2026



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella seguente riporta la sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 6 del 30 aprile 2024, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	18.520.400,68 €	16.034.911,87 €	-2.485.488,81 €	-13%
FONDO PERDUTO	8.916.825,00 €	9.882.373,16 €	965.548,16 €	11%
TERZI	4.741.223,02 €	3.552.914,29 €	-1.188.308,73 €	-25%
TOTALE	32.178.448,70 €	29.470.199,32 €	-2.708.249,38 €	-8%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi i costi di struttura

Dai dati sopra riportati si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa l'8%.

Si specifica che nella tabella soprastante sono esclusi gli importi degli investimenti di struttura. Per l'anno 2024 il Gestore ha rendicontato un importo di investimenti di struttura pari a 3.819.941 euro, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile in tariffa è pari a 1.570.288 euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario di tali tipologie di intervento, si rinvia alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022 e n.51 del 17/11/2025.

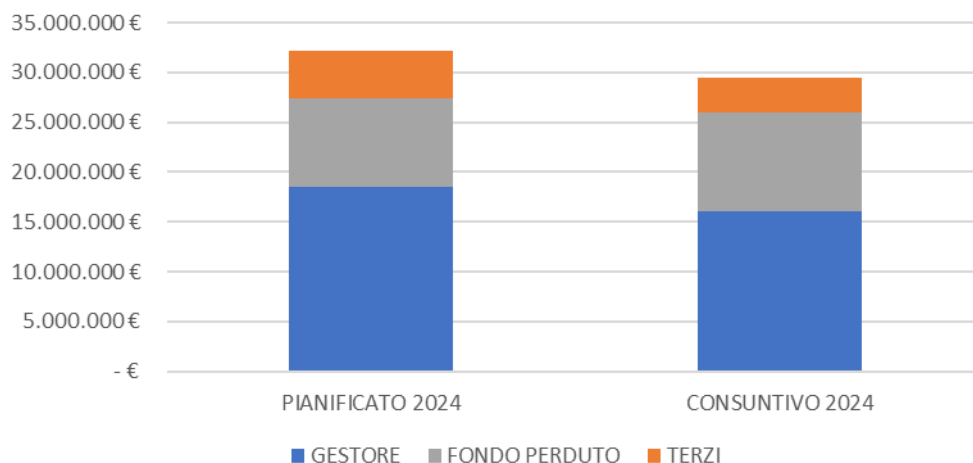


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024



Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

Dall'analisi dei dati consuntivi, si registrano gli scostamenti più rilevanti rispetto al pianificato nel servizio depurazione.

La maggior parte degli scostamenti sono dovuti a: gara d'appalto andata deserta con conseguente necessità di indire un'ulteriore gara (si vedano, ad esempio gli interventi di installazione centrifughe e silos fanghi presso i depuratori di Cesena e Forlì), risoluzione di interferenze, necessità di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste, ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune priorità, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	19.241.825,68 €	17.728.190,10 €	-1.513.635,58 €	-8%
FOGNATURA	7.571.981,02 €	7.467.837,73 €	-104.143,29 €	-1%
DEPURAZIONE	5.364.642,00 €	4.274.171,49 €	-1.090.470,51 €	-20%
ACQUE BIANCHE	- €	- €	- €	-
TOTALE	32.178.448,70 €	29.470.199,32 €	-2.708.249,38 €	-8%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024, suddivisi per servizio, sono stati rappresentati anche graficamente come segue:

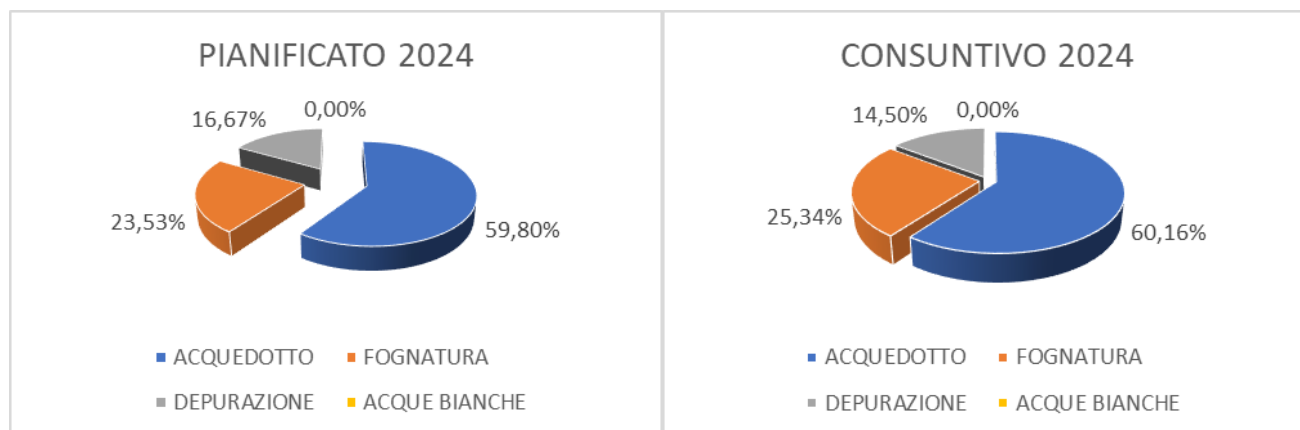


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio



Si specifica che il servizio di gestione delle acque meteoriche è stato avviato nel bacino di gestione di Forlì-Cesena nell'annualità 2025.

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati relativi alle manutenzioni straordinarie.

Gli investimenti di manutenzione straordinaria sono costituiti sia da opere individuate puntualmente nel programma degli investimenti sia da interventi cumulativi pluricomunali.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	11.615.341,00 €	11.839.785,05 €	224.444,05 €	2%
FOGNATURA	4.163.000,00 €	4.209.891,90 €	46.891,90 €	1%
DEPURAZIONE	2.030.000,00 €	2.847.485,23 €	817.485,23 €	40%
ACQUE BIANCHE	- €	- €	- €	-
TOTALE	17.808.341,00 €	18.897.162,18 €	1.088.821,18 €	6%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Per quanto attiene agli interventi cumulativi, la successiva tabella 4 riporta la distinta degli importi (importo totale complessivo: 24.254.021,32 euro) e del numero di microinterventi (totale microinterventi: 993) suddivisi per comune. Si tratta sia di piccoli interventi di manutenzione straordinaria sia di altri microinterventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti nei titoli cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Si specifica che la grande incidenza dell'importo dei titoli cumulativi nell'annualità 2024 è da mettere in correlazione con la necessità di interventi a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e al finanziamento PNRR per la riduzione delle perdite idriche.

COMUNI	CONSUNTIVO 2024	NUMERO
Bagno di Romagna	542.818,55 €	17
Bertinoro	631.703,07 €	26
Borghi	598.842,09 €	17
Castrocaro Terra Sole	143.942,01 €	18
Cesena	5.400.999,29 €	147
Cesenatico	1.411.872,89 €	89
Civitella di Romagna	339.280,59 €	25
Dovadola	133.437,75 €	17
Forlì	6.694.174,96 €	139
Forlimpopoli	197.875,74 €	15



Galeata	309.292,85 €	18
Gambettola	243.763,58 €	14
Gatteo	305.356,00 €	19
Longiano	186.727,00 €	15
Meldola	884.655,38 €	46
Mercato Saraceno	785.405,97 €	35
Modigliana	793.619,24 €	43
Montiano	81.534,82 €	8
Portico e San Benedetto	273.634,84 €	13
Predappio	519.719,97 €	43
Premilcuore	373.376,63 €	16
Rocca San Casciano	276.488,17 €	13
Roncofreddo	162.660,69 €	20
San Mauro Pascoli	272.496,79 €	15
Santa Sofia	259.766,36 €	15
Sarsina	657.883,51 €	34
Savignano sul Rubicone	1.166.796,04 €	71
Sogliano al Rubicone	427.064,97 €	28
Tredozio	65.993,03 €	7
Verghereto	112.838,54 €	10
Totale complessivo	24.254.021,32 €	993

TAB.4 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale (sono esclusi i 2 investimenti di struttura).

CLASSE D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	54	1.129.000,00 €	672.674,42 €	-456.325,58 €	-40%
500.000-1.000.000 €	18	1.545.400,00 €	991.906,65 €	-553.493,35 €	-36%
1.000.000-2.000.000 €	12	932.000,00 €	567.774,07 €	-364.225,93 €	-39%
2.000.000-5.000.000 €	14	3.572.223,02 €	1.708.316,82 €	-1.863.906,20 €	-52%
Oltre 5.000.000 €	6	652.000,00 €	1.275.506,02 €	623.506,02 €	96%
TITOLI CUMULATIVI	40	24.347.825,68 €	24.254.021,32 €	-93.804,36 €	0%
ANNULLATI	5	- €	0,02 €	0,02 €	-
TERMINATI	7	- €	- €	- €	-
TOTALE	156	32.178.448,70 €	29.470.199,32 €	-2.708.249,38 €	-8%

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi



Con la deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 (e successivi aggiornamenti l'ARERA ha introdotto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, definendo livelli minimi di servizio e obiettivi di qualità tecnica, mediante l'introduzione di indicatori e macro-indicatori.

I macro-indicatori di qualità tecnica del SII sono elencati nella tabella seguente.

SERVIZIO	MACROINDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguatezza qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua

TAB.6 – Macro-indicatori ARERA

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati nel 2024 suddivisi per il macro-indicatore ARERA di riferimento.



Si denota una preminenza di investimenti orientati alla riduzione delle perdite idriche lineari e percentuali (M1) e all'adeguatezza del sistema fognario (M4a e M4b).

Si specifica che all'indicatore "Altro" sono riferiti, ad esempio, gli interventi di risanamento degli scarichi, di adeguamento fognario o le estensioni acquedottistiche; per quanto riguarda l'assenza di interventi afferenti all'indicatore "M0", si specifica che il gestore HERA S.p.A. non gestisce il segmento di approvvigionamento idrico nella provincia di Forlì-Cesena.

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
M0	- €
M1	13.814.108,37 €
M2	160.558,46 €
M3	2.185.688,79 €
M4a	4.003.246,56 €
M4b	143.918,31 €
M5	1.511.231,34 €
M6	2.374.467,83 €
Altro	5.276.979,66 €
Totale	29.470.199,32 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA


Infine, viene riportato l'elenco degli interventi, con la relativa motivazione, che, pur avendo un importo pianificato nell'annualità 2024, non hanno visto importi rendicontati nel 2024.




	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Note giustificative	Somma di Importo lordo pianificato 2024
1	2022FCHA0014	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	Gestore	INTERVENTO CONCLUSO A MENO DEGLI ASFALTI (MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO), PREVISTA ESECUZIONE ENTRO LA FINE DEL 2025.	98.000,00
2	2014FCHA0012	POTEN.RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	INTERVENTO CONCLUSO.	16.000,00
3	2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE PARTI, PRIMA PARTE GIA' REALIZZATA LA SECONDA DA PROGETTARE. RIPIANIFICAZIONE INIZIO PROGETTAZIONE SECONDO STRALCIO PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE.	20.000,00
4	2022FCHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	9.000,00
5	2022FCHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 - UNICA RETI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Unica Reti	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA UNICA RETI SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.	250.000,00
6	2024FCHA0013	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	INTERVENTO PROPOSTO IN OCCASIONE DELL'ISTANZA DI PROROGA. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI 2024 DI QUESTO ID SONO STATI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI BONIFICA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO E RENDICONTATI NELL' ID 2014FCHA0084.	3.700.000,00
7	2024FCHA0028	RINNOVO RETE IDRICA VIA ZOLI E VIE LIMITROFE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Predappio	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE È STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	80.000,00
8	2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA FATTURAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO	917.642,00
							5.090.642,00

TAB.8 – Interventi pianificati non rendicontati nel 2024


							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 6 del 30 aprile 2024 - annualità 2024					Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento				
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative			
1	2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	203.589,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
2	2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	271.149,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
3	2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
4	2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONE	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	224.521,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
5	2015FCHA0003	RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	399.472,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
6	2015FCHA0005	RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	133.235,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
7	2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Unica Reti	2.941.000,00 €	299.581,02 €	- €	299.581,02 €	- €	2.530,00 €	- €	2.530,00 €	- €	-	297.051,02 €	-99	INTERVENTO CONCLUSO A MENO DEGLI ASFALTI (MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO), PREVISTA ESECUZIONE ENTRO LA FINE DEL 2025.		
8	2019FCHA0001	COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO VAL GIMIGLI	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	Gestore	251.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0			
9	2022FCHA0014	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	Gestore	1.378.386,74 €	98.000,00 €	- €	- €	98.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	98.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO A MENO DEGLI ASFALTI (MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO), PREVISTA ESECUZIONE ENTRO LA FINE DEL 2025.		
10	2014FCHA0012	POTEN RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	596.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO.		
11	2014FCHA0016	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	265.872,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
12	2015FCHA0009	RISANAMENTO SC.37-38 COLLINELLO	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	738.554,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
13	2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Unica Reti	619.475,03 €	160.000,00 €	- €	160.000,00 €	- €	60.677,57 €	- €	60.677,57 €	- €	-	99.322,43 €	-62	INTERVENTO CONCLUSO, I CONSUNTIVI 2024 RAPPRESENTANO I COSTI RELATIVI ALLA CHIUSURA CONTABILE DELLA COMMESSA.		
14	2019FCHA0005	AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA "CAPOCOLLE"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
15	2019FCHA0007	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "CROROMANO"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
16	2019FCHA0008	RISANAMENTO SCARICO 36 POLENTA BERTINORO	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	339.999,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
17	2019FCHA0009	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	Unica Reti	1.217.589,69 €	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	61.231,22 €	- €	61.231,22 €	- €	- €	10.231,22 €	20	0		
18	2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Borghi	Romagna Acque	1.148.733,13 €	- €	- €	- €	- €	118.307,05 €	- €	118.307,05 €	- €	- €	118.307,05 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, I CONSUNTIVI 2024 RAPPRESENTANO I COSTI RELATIVI ALLA CHIUSURA CONTABILE DELLA COMMESSA.		
19	2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Borghi	Romagna Acque	595.496,77 €	- €	- €	- €	- €	66.862,87 €	- €	66.862,87 €	- €	- €	66.862,87 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, I CONSUNTIVI 2024 RAPPRESENTANO I COSTI RELATIVI ALLA CHIUSURA CONTABILE DELLA COMMESSA.		
20	2024FCHA0010	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO TRIBOLA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Borghi	Gestore	419.537,31 €	389.000,00 €	311.600,00 €	- €	77.400,00 €	414.506,86 €	- €	- €	414.506,86 €	25.506,86 €	6	0			
21	2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	2.238.674,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
22	2014FCHA0033	RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	FOGNATURA	Cesena	Gestore	278.360,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
23	2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	27.145.427,64 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	670.503,64 €	- €	- €	670.503,64 €	470.503,64 €	235	INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A FRONTE DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO LAVORI DETERMINATO DALL'ESITO DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E PROGETTAZIONE CORRELATA			
24	2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL. LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	3.633.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
25	2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	735.831,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
26	2015FCHA0011	RISANANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	FOGNATURA	Cesena	Gestore	837.511,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
27	2019FCHA0010	REVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Unica Reti	6.827.880,80 €	313.000,00 €	- €	313.000,00 €	- €	392.745,21 €	- €	392.745,21 €	- €	- €	79.745,21 €	25	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE CHE HA PORTATO AD UN AUMENTO DEI COSTI DI PROGETTAZIONE		
28	2022FCHA0007	RADDOPPIO VASCA OSSIDAZIONE DEPURATORE CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	NON DEFINITO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
29	2022FCHA0016	COLLETTAMENTO VIA DISMANO E VIA LERICI	FOGNATURA	Cesena	Gestore	552.768,26 €	192.400,00 €	45.400,00 €	- €	147.000,00 €	33.690,11 €	- €	- €	33.690,11 €	-	158.709,89 €	-82	LAVORI IN CORSO, SCOSTAMENTO 2024 E' STATO CAUSATO DAL POSTICIPO DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI DOVUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA		
30	2022FCHA0018	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	2.813.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0,01 €	- €	- €	- €	0,01 €	0,01 €	100	0		
31	2023FCHA0001	MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA TORRENTE CESUOLA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	965.821,96 €	575.000,00 €	- €	- €	575.000,00 €	321.325,74 €	- €	- €	- €	321.325,74 €	-	253.674,26 €	-44	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO STRALCIO DI UNA PARTE DEL TRACCIATO IN QUANTO IL COMUNE HA RINVENUTO DOCUMENTAZIONE ESISTENTE CHE NE ATTESTAVA IL RINFORZO IN EPOCA RECENTE	
32	2024FCHA0004	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Unica Reti	3.439.440,67 €	925.000,00 €	- €	925.000,00 €	- €	193.176,49 €	- €	193.176,49 €	- €	- €	731.823,51 €	-79	SCOSTAMENTO DOVUTO A GARA D'APPALTO ANDATA DESERTA CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI INDIRIZIONE UN'ULTERIORE GARA E SLITTAMENTO DELL'AVVIO DEI LAVORI		
33	2024FCHA0019	RISANAMENTO SCARICO 98 TREBBO-V.TAIBO - ROVERSAO	FOGNATURA	Cesena	Gestore	224.967,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
34	2024FCHA0035	ESTENSIONE RETE ACQUA A SERVIZIO DEI CIVICI DI VIA TOMBA O CASETTO E DI VIA TOMBA O BACCARETO IN LOC. ROVERSAO	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	426.141,45 €	50.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	32.156,27 €	- €	- €	- €	32.156,27 €	-	17.843,73 €	-35	0	
35	2019FCHA0012	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSINO NERI	FOGNATURA	Cesenatico	Gestore	425.908,26 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	55.690,06 €	- €	- €	- €	55.690,06 €	15.690,06 €	39	0		
36	2024FCHA0009	REALIZZAZIONE IMPIANTO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PODERE BELLARIA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	940.000,00 €	51.000,00 €	40.000,00 €	- €	11.000,00 €	9.506,92 €	9.506,92 €	- €	- €	- €	41.493,08 €	-81	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (SVILUPPO PFTE).		
37	2014FCHA0047	RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	99.999,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
38	2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA, 2°ST	FOGNATURA	Dovadola	Unica Reti	596.000,00 €	208.000,00 €	- €	208.000,00 €	- €	182.107,87 €	- €	182.107,87 €	- €	- €	25.892,13 €	-12	0		
39	2024FCHA0021	RISANAMENTO SCARICO 9 P.LE ZANGHERI - LOCALITA' PANTERA	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	101.531,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
40	2014FCHA0054	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CARPENI-VIA REDEFOSSE 6A	FOGNATURA	Forlì	Gestore	493.121,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
41	2014FCHA0058	RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO - VIA B. DA DURAZZO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	457.605,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
42	2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO -VIA MONDO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	339.689,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
43	2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	FOGNATURA	Forlì	Gestore	1.722.413,26 €	21.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €	40.253,84 €	- €	- €	- €	40.253,84 €	19.253,84 €	91	0		
44	2014FCHA0065	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITA' BORGO SISA	FOGNATURA	Forlì	Romagna Acque	747.614,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
45	2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	4.305.316,89 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	20.778,48 €	- €	- €	- €	20.778,48 €	15.778,48 €	315	0		
46	2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	Forlì	Gestore	2.509.712,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
47	2019FCHA0014	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO RONCO LIDO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	299.995,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
48	2019FCHA0015	RAVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	4.223.900,00 €	276.000,00 €	- €	- €	276.000,00 €	268.132,48 €	- €	- €	- €	268.132,48 €	7.867,52 €	-2	0		
49	2022FCHA0008	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE FORLI'	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	4.545.485,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
50	2022FCHA0011	ADEGUAMENTO SISTEMA TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE FORLI'	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	6.524.708,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
51	2022FCHA0013	COPERTURA SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE FORLI'	DEPURAZIONE	Forlì</																



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 6 del 30 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento				
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative		
52	2022FCHA0017	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	1.050.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0,01 €	- €	- €	0,01 €	0,01 €	100	0		
53	2024FCHA0003	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	Unica Reti	1.500.360,26 €	489.000,00 €	- €	489.000,00 €	- €	170.780,51 €	- €	170.780,51 €	- €	-	318.219,49 €	-65	SCOSTAMENTO DOVUTO A GARA D'APPALTO ANDATA DESERTA CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI INDIRE UN'ULTERIORE GARA E SLITTAMENTO DELL'AVVIO DEI LAVORI	
54	2024FCHA0006	INTERFERENZE CON PROLUNGAMENTO TANGENZIALE FORLÌ-ACQ.-C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Forlì	Gestore	524.391,88 €	181.000,00 €	181.000,00 €	- €	- €	188.339,33 €	174.165,23 €	- €	14.174,10 €	7.339,33 €	4	0		
55	2024FCHA0007	INTERFERENZE CON PROLUNGAMENTO TANGENZIALE FORLÌ - FOG - C.CLIENTE	FOGNATURA	Forlì	Gestore	3.429.744,99 €	431.000,00 €	431.000,00 €	- €	- €	755.582,09 €	663.335,42 €	- €	92.246,67 €	324.582,09 €	75		CONSUNTIVI 2024 SUPERIORI AL PIANIFICATO PER AUMENTO IMPORTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO	
56	2024FCHA0018	RISANAMENTO SCARICO 139 V.SOMALIA - LOCALITA' OSPEDALETTO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	466.712,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
57	2024FCHA0030	RINNOVO RETE VIA NERVESA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Forlì	Gestore	388.282,24 €	180.000,00 €	144.000,00 €	- €	36.000,00 €	2.407,59 €	147.915,70 €	- €	-	145.508,11 €	-98		SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	
58	2025FCHA0005	PNRR ALL. OPERE DI PROTEZIONE SCARICHI PARCO URBANO DI FORLÌ	FOGNATURA	Forlì	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10,62 €	- €	- €	10,62 €	10,62 €	100		AVVIO DELL'INTERVENTO CHE RIENTRA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRESENTATI DA HERA SPA PER LA MISURA PNRR M2C4 - I2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ER-UBIS-000072, N. CUP H62E24000240001). L' INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE SCARICHI PARCO URBANO DI FORLÌ. LA REALIZZAZIONE SI SVILUPPERA' NEL CORSO DEL 2025	
59	2014FCHA0066	REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	Forlimpopoli	Gestore	157.861,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
60	2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	1.130.598,29 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE PARTI, PRIMA PARTE GIA' REALIZZATA LA SECONDA DA PROGETTARE. RIPIANIFICAZIONE INIZIO PROGETTAZIONE SECONDO STRALCIO PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE .	
61	2019FCHA0017	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	1.127.887,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
62	2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI GATTEO MARE	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	103.311,15 €	- €	- €	- €	- €	73.089,75 €	- €	- €	73.089,75 €	73.089,75 €	100		INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI	
63	2022FCHA0015	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA AGGLOMERATO GATTEO MARE - I LOTTO	FOGNATURA	Gatteo	Unica Reti	1.683.768,86 €	113.000,00 €	- €	113.000,00 €	- €	125.800,63 €	- €	125.800,63 €	- €	-	12.800,63 €	11	0	
64	2014FCHA0076	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMHOFF TEODORANO-SC6<200AE	FOGNATURA	Meldola	Gestore	302.661,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
65	2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	Mercato Saraceno	Gestore	382.737,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
66	2024FCHA0005	RIFACIMENTO FOGNUATURA LOCALITA' LINARO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Mercato Saraceno	Gestore	835.000,00 €	117.000,00 €	93.600,00 €	- €	23.400,00 €	87.735,67 €	- €	- €	87.735,67 €	-	29.264,33 €	-25		SCOSTAMENTO DOVUTO A POSTICIPO DI ALCUNI MESI DELL'AVVIO DEI LAVORI PER ORGANIZZAZIONE CANTIERE
67	2025FCHA0001	PNRR ALL. ESTEN ACQ M.SARACENO VERTAGLIA	ACQUEDOTTO	Mercato Saraceno	Gestore	430.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.032,96 €	- €	- €	12.032,96 €	12.032,96 €	100	0		
68	2025FCHA0002	PNRR ALL. ESTEN ACQ M.SARACENO TAIBO-CASTELLO	ACQUEDOTTO	Mercato Saraceno	Gestore	570.000,00 €	- €	- €	- €	- €	21.060,13 €	- €	- €	21.060,13 €	21.060,13 €	100	0		
69	2025FCHA0003	PNRR ALL. ESTEN ACQ M.SARACENO M. DELLA NEVE	ACQUEDOTTO	Mercato Saraceno	Gestore	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.269,38 €	- €	- €	10.269,38 €	10.269,38 €	100	0		
70	2017FCHA0014	NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	774.972,98 €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	20.600,44 €	- €	- €	20.600,44 €	-	24.399,56 €	-54	0	
71	2022FCHA0006	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MODIGLIANA	FOGNATURA	Modigliana	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
72	2024FCHA0027	RINNOVO RETE IDRICA VIA DELLA COSTA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	223.040,00 €	90.000,00 €	72.000,00 €	- €	18.000,00 €	22.541,51 €	22.541,51 €	- €	- €	-	67.458,49 €	-74		SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
73	2024FCHA0034	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MODIGLIANA (SICUREZZA IDRAULICA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Modigliana	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
74	2014FCHA0083	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.070.000,00 €	- €	- €	2.070.000,00 €	2.680.187,35 €	- €	- €	2.680.187,35 €	610.187,35 €	29		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO	
75	2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.050.000,00 €	- €	- €	1.050.000,00 €	3.137.752,71 €	- €	- €	3.137.752,71 €	2.087.752,71 €	198		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
76	2014FCHA0085	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	1.787.794,62 €	- €	- €	1.787.794,62 €	987.794,62 €	123		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
77	2014FCHA0086	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.705.801,49 €	- €	- €	1.705.801,49 €	705.801,49 €	70		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO	
78	2014FCHA0087	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	241.167,18 €	- €	- €	241.167,18 €	91.167,18 €	60		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
79	2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	694.995,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
80	2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FC-ATO 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.380.000,00 €	- €	- €	1.380.000,00 €	2.203.949,45 €	- €	- €	2.203.949,45 €	823.949,45 €	59		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
81	2014FCHA0090	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	243.690,53 €	- €	- €	243.690,53 €	93.690,53 €	62		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
82	2014FCHA0092	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	535.000,00 €	- €	- €	535.000,00 €	1.059.186,33 €	- €	- €	1.059.186,33 €	524.186,33 €	97		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
83	2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	185.000,00 €	- €	- €	185.000,00 €	9.198,74 €	- €	- €	9.198,74 €	-	175.801,26 €	-95		CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
84	2014FCHA0094	MANUT. STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	790.000,00 €	- €	- €	790.000,00 €	926.999,68 €	- €	- €	926.999,68 €	136.999,68 €	17	0		
85	2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	3.830.342,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
86	2014FCHA0123	SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.450.729,00 €	- €	- €	1.450.729,00 €	164.467,87 €	- €	- €	164.467,87 €	-	1.286.261,13 €	-88		CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
87	2014FCHA0126	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.601.785,87 €	- €	- €	- €	- €	590,20 €	- €	- €	590,20 €	-	590,20 €	-100		ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023FCHA0003.
88	2014FCHA0131	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	194.832,26 €	- €	- €	194.832,26 €	44.832,26 €	29		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
89	2014FCHA0132	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	366.956,86 €	- €	- €	366.956,86 €	-	133.043,14 €	-26		CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
90	2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENILI DISMESSI FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.290.823,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0		
91	2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE -FC-ATO8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	144.872,25 €	- €	- €	144.872,25 €	119.872,25 €	479		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
92	2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-FC-ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	20.868,94 €	- €	- €	20.868,94 €	-	4.131,06 €	-16	0	
93	2018FCHA0005	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.480.157,00 €	- €	- €	1.480.157,00 €	3.787.909,80 €	- €	- €	3.787.909,80 €	2.307.752,80 €	155	0		
94	2018FCHA0006	INVESTIMENTI DI STRUTTURA (TICSI E TIBSI)	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	32.031,55 €	- €	- €	32.031,55 €	32.031,55 €	100	0		



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 6 del 30 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
95	2019FCHA0019	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.052.041,75 €	1.072.341,49 €	- €	- 20.299,74 €	147.958,25 €	-12	0	
96	2019FCHA0021	INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	507.881,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
97	2019FCHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI ADDUZIONE CIGNO-CIVORIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	32.810,88 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	11.357,68 €	- €	- €	11.357,68 €	1.357,68 €	13	0	
98	2019FCHA0024	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 8 FC	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	249.776,56 €	405.365,00 €	- €	- 155.588,44 €	250.223,44 €	-50		CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
99	2022FCHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	143.918,31 €	- €	- €	143.918,31 €	113.918,31 €	379		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILIEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
100	2022FCHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	332.260,73 €	- €	- €	332.260,73 €	132.260,73 €	66		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
101	2022FCHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
102	2022FCHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	-100		CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI
103	2022FCHA0019	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC- ATO 8 -UNICA RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	720.000,00 €	- €	720.000,00 €	- €	1.464.938,36 €	- €	1.464.938,36 €	- €	744.938,36 €	103		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA UNICA RETI SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
104	2022FCHA0020	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8 - UNICA RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	367.791,96 €	- €	367.791,96 €	- €	367.791,96 €	100		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA UNICA RETI SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
105	2022FCHA0021	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC- ATO - UNICA RETI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	167.618,56 €	- €	167.618,56 €	- €	167.618,56 €	100		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA UNICA RETI SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
106	2022FCHA0022	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - FC-ATO 8 - UNICA RETI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
107	2022FCHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 - UNICA RETI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	-100		CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA UNICA RETI SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
108	2024FCHA0012	INTERVENTI DI PIANO D'INDIRIZZO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	26.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
109	2024FCHA0013	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.700.000,00 €	- €	- €	3.700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.700.000,00 €	-100		INTERVENTO PROPOSTO IN OCCASIONE DELL'ISTANZA DI PROROGA. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI 2024 DI QUESTO ID SONO STATI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI BONIFICA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO E RENDICONTATI NELL' ID 2014FCHA0084.
110	2024FCHA0022	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	123.275,57 €	33.000,00 €	26.400,00 €	- €	6.600,00 €	4.014,15 €	65.954,76 €	- €	61.940,61 €	28.985,85 €	-87		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
111	2024FCHA0023	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.980.377,43 €	1.458.000,00 €	1.166.400,00 €	- €	291.600,00 €	395.354,51 €	714.485,55 €	- €	319.131,04 €	1.062.645,49 €	-72		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
112	2024FCHA0024	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARIE - ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	3.495.513,22 €	1.125.000,00 €	900.000,00 €	- €	225.000,00 €	945.191,46 €	2.025.286,48 €	- €	1.080.095,02 €	179.808,54 €	-15	0	
113	2024FCHA0025	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI - ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	381.038,35 €	472.000,00 €	377.600,00 €	- €	94.400,00 €	185.718,42 €	176.446,37 €	- €	9.272,05 €	286.281,58 €	-60		ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
114	2024FCHA0026	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	232.795,11 €	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	20.000,00 €	88.226,68 €	23.789,03 €	- €	64.437,65 €	11.773,32 €	-11	0	
115	2024FCHA0032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	311.618,57 €	- €	- €	311.618,57 €	161.618,57 €	107		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA FANGHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
116	2024FCHA0036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 8 FC	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
117	2024FCHA0037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 8 FC	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
118	2024FCHA0038	PNRR RINNOVI RETE ACQUEDOTTO ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.947.750,00 €	1.264.341,00 €	1.615.092,00 €	- €	350.751,00 €	1.719.359,98 €	1.615.092,00 €	- €	104.267,98 €	455.018,98 €	35		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
119	2024FCHA0039	PNRR DISTRETTUALIZZAZIONE ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	455.000,00 €	123.046,00 €	129.198,00 €	- €	6.152,00 €	32.192,20 €	129.198,00 €	- €	97.005,80 €	90.853,80 €	-73		CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
120	2024FCHA0040	PNRR RICERCA PERDITE ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	255.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	0	0	
121	2024FCHA0041	PNRR SENSORISTICA QUALITÀ ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	65.000,00 €	56.109,00 €	58.914,00 €	- €	2.805,00 €	50.344,85 €	58.914,00 €	- €	8.569,15 €	5.764,15 €	-10	0	
122	2024FCHA0042	PNRR SMART METER ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.760.000,00 €	2.696.600,68 €	846.621,00 €	- €	1.849.979,68 €	1.855.928,01 €	846.621,00 €	- €	1.009.307,01 €	840.672,67 €	-31		ID CUMULATIVO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE E POSA DI CONTATORI SMART VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE. INTERVENTO FINANZIATO PNRR NELLA MISURA M2C4.
123	2015FCHA0021	FSC - POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO	ACQUEDOTTO	Portico e San Benedetto	Gestore	1.725.555,75 €	- €	- €	- €	- €	2.910,66 €	- €	- €	2.910,66 €	2.910,66 €	100		INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
124	2022FCHA0010	AMPLIAMENTO VASCA DEL SERBATOIO DI PARATAI	ACQUEDOTTO	Predappio	Unica Reti	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
125	2024FCHA0028	RINNOVO RETE IDRICA VIA ZOLI E VIE LIMITROFE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Predappio	Gestore	205.000,00 €	80.000,00 €	64.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100		SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
126	2024FCHA0029	RINNOVO RETE IDRICA LOCALITA' MOLINO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Predappio	Gestore	287.000,00 €	110.000,00 €	88.000,00 €	- €	22.000,00 €	7.324,68 €	7.324,68 €	- €	- €	102.675,32 €	-93		SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
127	2025FCHA0006	PNRR ALL. FOSSE IMHOFF PREDAPPPIO	FOGNATURA	Predappio	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	28,32 €	- €	- €	28,32 €	28,32 €	100		L'INTERVENTO RIENTRA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRESENTATI DA HERA SPA PER LA MISURA PNRR M2C4 - I2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ER-UBIS-000072, N. CUP H62E24000240001). L' INTERVENTO, CONSISTENTE NELLO SPOSTAMENTO E PROTEZIONE FOSSE IMHOFF IN GOLENA, E' IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
128	2024FCHA0002	RIFACIMENTO COLLETTORE PREMILCUORE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Premilcuore	Gestore	2.600.000,00 €	55.000,00 €	44.000,00 €	- €	11.000,00 €	53.570,47 €	- €	- €	53.570,47 €	1.429,53 €	-2	0	



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 6 del 30 aprile 2024 - annualità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
129	2024FCHA0008	NUOVO DEPURATORE PREMILCUORE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Premilcuore	Gestore	2.850.000,00 €	127.000,00 €	102.000,00 €	- €	25.000,00 €	61.422,76 €	- €	- €	61.422,76 €	-	65.577,24 €	-51	SCOSTAMENTO LEGATO ALLE DIFFICOLTA' DI INTERLOCUZIONE CON I PRIVATI PER L'ACCESSO ALLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO, CHE HANNO DI FATTO CAUSATO UNO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
130	2019FCHA0026	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER SAN CASCIANO	ACQUEDOTTO	Rocca San Casciano	Gestore	235.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
131	2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V (VIA DEL ZOTTO AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE)	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	241.200,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
132	2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOMERATO	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	208.749,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
133	2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	2.587.493,00 €	279.000,00 €	- €	279.000,00 €	- €	178.345,99 €	- €	178.345,99 €	- €	-	100.654,01 €	-36	INTERVENTO CONCLUSO A MENO DEGLI ASFALTI (MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO).
134	2022FCHA0012	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOAVNNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	140.589,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
135	2024FCHA0020	RISANAMENTO SCARICO 19 SP. MONTELEONE-LOCALITA' MONTELEO	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	100.013,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
136	2019FCHA0027	RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO (AGGLOMERATI < 200 ABITANTI EQUIVALENTI)	FOGNATURA	Santa Sofia	Gestore	405.523,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
137	2024FCHA0011	ADEGUAMENTO DEPURATORE SPINELLO	DEPURAZIONE	Santa Sofia	Gestore	499.982,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
138	2024FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO (14) 17-24 LOCALITA' LAGO CORNIOLO	FOGNATURA	Santa Sofia	Gestore	200.306,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
139	2024FCHA0033	NUOVA CENTRALE SOLLEVAMENTO LOCALITA' TRE FONTI	ACQUEDOTTO	Santa Sofia	Gestore	166.088,06 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	26.088,06 €	- €	- €	26.088,06 €	-	123.911,94 €	-82	LO SCOSTAMENTO 2024 E' DOVUTO ALL' ITER DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TERMINATO NEL 2025. SONO IN CORSO VERIFICHE CON L'ESERCITO PER L'EVENTUALE RIMOZIONE DI ORDIGNI BELLICI NELL'AREA SULLA QUALE REALIZZARE L'IMPIANTO. SI PREVEDE DI CONCLUDERE L'OPERA ENTRO IL 2025
140	2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.529,36 €	- €	- €	2.529,36 €	-	2.529,36 €	100	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
141	2017FCHA0026	PNRR - POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	1.100.000,00 €	40.000,00 €	300.000,00 €	- €	-	260.000,00 €	48.180,54 €	300.000,00 €	- €	-	8.180,54 €	20	0
142	2019FCHA0028	POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO SERBATOIO SARSINA	ACQUEDOTTO	Sarsina	Romagna Acque	581.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
143	2019FCHA0031	COLLETTAMENTO DEL DEPURATORE DI SARSINA AL DEPURATORE DI BACCIOLOINO	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	1.000.899,82 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	899,82 €	- €	- €	899,82 €	-	99.100,18 €	-99	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, IL RITARDO E' LEGATO AL FATTO CHE E' STATA DATA PRIORITA' AD INTERVENTI CON PROBLEMATICHE CONTINGENTI LEGATI ALL'ALLUVIONE. I LAVORI VERRANNO AVVIATI NEL 2026.
144	2024FCHA0031	RINNOVO RETE IDRICA LOC. SAN MARTINO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	287.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	- €	6.000,00 €	2.641,32 €	2.641,32 €	- €	- €	-	27.358,68 €	-91	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
145	2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT- COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	4.849.211,00 €	917.642,00 €	- €	917.642,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	917.642,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA FATTURAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO
146	2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Gestore	2.227.200,92 €	257.000,00 €	- €	- €	257.000,00 €	174.778,06 €	- €	- €	174.778,06 €	-	82.221,94 €	-31	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE APPROFONDIMENTI ED INDAGINI SUI DIGESTORI ESISTENTI CHE HA COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
147	2019FCHA0035	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE DELLA LIBERTA'	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
148	2022FCHA0009	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Gestore	3.102.796,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
149	2024FCHA0001	BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I STRALCIO)	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	Gestore	5.174.544,12 €	- €	- €	- €	- €	53.779,91 €	- €	- €	53.779,91 €	-	53.779,91 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE TEMPISTICHE AVVIO PROGETTAZIONE A CAUSA DELLA CRITICITA' DELL'INTERVENTO.
150	2024FCHA0014	SOLLEVAMENTO S. ROCCO:SLACCIO MANDATA SOLLEVAMENTO EX MATTATOIO E COLLEGAMENTO IN V. N.SAURO	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
151	2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	Sogliano al Rubicone	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
152	2014FCHA0121	PNRR-RISANAMENTO SCARICO 7-33 IN LOCALITA' ALFERO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	7.300.000,00 €	139.000,00 €	- €	- €	139.000,00 €	158.477,26 €	1.370.448,70 €	- €	-	1.211.971,44 €	19.477,26 €	14	0
153	2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	881.602,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
154	2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	242.976,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
155	2019FCHA0036	RISANAMENTO SCARICHI 1-15-16 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
156	2019FCHA0037	RISANAMENTO SCARICO 17 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	319.999,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
157	2024FCHA0016	RISANAMENTO SCARICO 31 V.MOLINI PARA - FRAZIONE MAZZI	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	100.182,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0
158	2024FCHA0017	RISANAMENTO SCARICO 12 - FRAZIONE CAPANNE	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	100.159,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	0

	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura	
Importo Totale	33.658.605,70 €	8.916.825,00 €	4.741.223,02 €	20.000.557,68 €	33.290.140,67 €	9.882.373,16 €	3.552.914,29 €	19.854.853,22 €	92%	
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	32.178.448,70 €	8.916.825,00 €	4.741.223,02 €	18.520.400,68 €	29.470.199,32 €	9.882.373,16 €	3.552.914,29 €	16.034.911,87 €		
