



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO DI GESTIONE DI: RIMINI**

Gennaio 2026



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella seguente riporta la sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.8 del 18 aprile 2024, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	21.295.544,00 €	18.147.247,65 €	- 3.148.296,35 €	-15%
FONDO PERDUTO	7.824.600,00 €	5.489.192,68 €	- 2.335.407,32 €	-30%
TERZI	10.826.000,00 €	6.584.289,34 €	- 4.241.710,66 €	-39%
TOTALE	39.946.144,00 €	30.220.729,67 €	- 9.725.414,33 €	-24%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi i costi di struttura

Dai dati sopra riportati si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 24%.

Si specifica che nella tabella soprastante sono esclusi gli importi degli investimenti di struttura. Per l'anno 2024 il Gestore ha rendicontato un importo di investimenti di struttura pari a 4.315.357,97 euro, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile in tariffa è pari a 1.782.548. euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario di tali tipologie di intervento, si rinvia alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022 e n.51 del 17/11/2025.

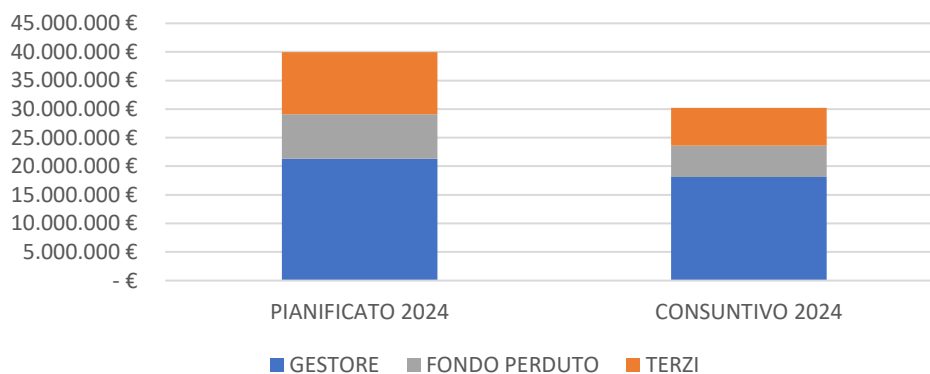


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

Dall'analisi dei dati consuntivi, si registrano scostamenti rilevanti rispetto al pianificato nei tre i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. A livello di importi, lo scostamento assume particolare rilevanza nel servizio fognatura. Tale scostamento è dovuto, per oltre il 90%, a tre interventi specifici: il 2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA e il 2024RNHA0016 PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD (FINANZIAMENTO RASDF) a causa della mancata fatturazione verso il Soggetto terzo finanziatore in attesa di accordo di finanziamento, e il 2014RNHA0073 PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA, il cui scostamento è dovuto al posticipo dell'avvio dei lavori a seguito dei ritardi per l'ottenimento della permessi e del riaffido dei lavori ad altra società esecutrice.

La maggior parte degli altri scostamenti sono dovuti a: risoluzione di interferenze, necessità di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste, ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune priorità, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	14.889.144,00 €	13.156.963,48 €	- 1.732.180,52 €	-12%
FOGNATURA	20.694.000,00 €	13.442.324,67 €	- 7.251.675,33 €	-35%
DEPURAZIONE	4.078.000,00 €	3.222.104,85 €	- 855.895,15 €	-21%
ACQUE BIANCHE	285.000,00 €	399.336,67 €	114.336,67 €	40%
TOTALE	39.946.144,00 €	30.220.729,67 €	- 9.725.414,33 €	-24%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024, suddivisi per servizio, sono stati rappresentati anche graficamente come segue:



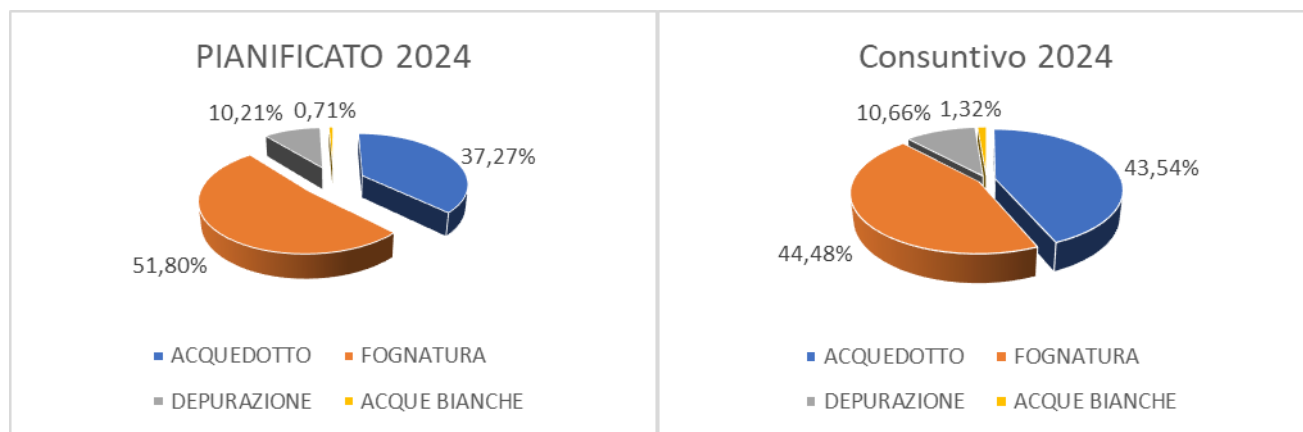


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati relativi alle manutenzioni straordinarie.

Gli investimenti di manutenzione straordinaria sono costituiti sia da opere individuate puntualmente nel programma degli investimenti sia da interventi cumulativi pluricomunali.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	9.254.255,00 €	7.905.986,36 €	- 1.348.268,64 €	-15%
FOGNATURA	1.941.000,00 €	2.769.795,54 €	828.795,54 €	43%
DEPURAZIONE	1.360.000,00 €	2.661.974,14 €	1.301.974,14 €	96%
ACQUE BIANCHE	270.000,00 €	386.290,65 €	116.290,65 €	43%
TOTALE	12.825.255,00 €	13.724.046,69 €	898.791,69 €	7%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Per quanto attiene agli interventi cumulativi, la successiva tabella 4 riporta la distinta degli importi (importo totale complessivo: 18.941.389,35 euro) e del numero di microinterventi (totale microinterventi: 878) suddivisi per comune. Si tratta sia di piccoli interventi di manutenzione straordinaria sia di altri microinterventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti nei titoli cumulativi presenti nella programmazione annuale.



COMUNE	NUMERO	CONSUNTIVO 2024
Bellaria Igea Marina	24	619.542,69
Casteldelci	17	354.746,35
Cattolica	54	1.219.437,92
Coriano	15	322.448,48
Gemmano	8	82.122,49
Misano Adriatico	26	705.917,91
Mondaino	9	70.789,95
Montefiore Conca	12	139.556,93
Montegridolfo	8	36.701,38
Montescudo-Monte Colombo	25	446.151,10
Morciano di Romagna	10	247.179,47
Novafeltria	43	503.873,78
Pennabilli	34	456.343,47
Poggio Torriana	22	256.999,81
Riccione	92	2.322.618,37
Rimini	249	6.472.165,98
Saludecio	21	668.034,30
San Clemente	15	47.123,47
San Giovanni in Marignano	15	114.147,09
San Leo	36	1.110.798,92
Sant'Agata Feltria	34	269.276,93
Santarcangelo di Romagna	38	1.017.370,24
Talamello	19	294.254,98
Verucchio	24	720.799,50
Sassofeltrio	28	442.987,84
Totale complessivo	878	18.941.389,35

TAB.4 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale (sono esclusi i 2 investimenti di struttura).



CLASSE D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	35	1.255.000,00 €	383.189,33 €	- 871.810,67 €	-69%
500.000-1.000.000 €	19	1.374.117,00 €	- 173.689,33 €	-1.547.806,33 €	-113%
1.000.000-2.000.000 €	13	1.035.916,00 €	173.967,38 €	- 861.948,62 €	-83%
2.000.000-5.000.000 €	17	1.096.000,00 €	538.446,99 €	- 557.553,01 €	-51%
Oltre 5.000.000 €	19	17.148.000,00 €	10.357.425,95 €	-6.790.574,05 €	-40%
TITOLI CUMULATIVI	47	17.022.111,00 €	18.941.389,35 €	1.919.278,35 €	11%
ANNULLATI	4	1.015.000,00 €	- €	-1.015.000,00 €	-
TERMINATI	1	- €	- €	- €	-
TOTALE	155	39.946.144,00 €	30.220.729,67 €	-9.725.414,33 €	-24%

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

L'ARERA, con deliberazione n. 917/2017, ha introdotto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, definendo livelli minimi di servizio e obiettivi di qualità tecnica, mediante l'introduzione di indicatori e macro-indicatori.

I macro-indicatori di qualità tecnica del SII sono elencati nella tabella seguente.

SERVIZIO	MACROINDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguate qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)



FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua

TAB.6 – Macro-indicatori ARERA

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati nel 2024 suddivisi per il macro-indicatore ARERA di riferimento.

Si denota una preminenza di investimenti orientati alla riduzione delle perdite idriche lineari e percentuali (M1) e all'adeguatezza del sistema fognario (M4a e M4b).

Si specifica che nell'indicatore "Altro" sono individuati gli interventi del PSBO e altri interventi di efficientamento.

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
M0	271.294,34 €
M1	9.192.741,90 €
M2	149.240,40 €
M3	1.578.581,65 €
M4a	3.858.729,17 €
M4b	3.176.690,09 €
M5	345.852,98 €
M6	2.239.418,40 €
Altro	9.408.180,74 €
Totale	30.220.729,67 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA

Infine, viene riportato l'elenco degli interventi, con la relativa motivazione, che, pur avendo un importo pianificato nell'annualità 2024, non hanno visto importi rendicontati nel 2024.



	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Note giustificative	Somma di Importo lordo pianificato 2024
1	2021RNHA0010	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO	FOGNATURA	Coriano	AMIR	INTERVENTO AUTORIZZATO CON DG N.152 DEL 17/09/2024. AVVIO CANTIERE PREVISTO NEL 2025, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO.	5.000,00
2	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	DEPURAZIONE	Monte Colombo	Gestore	INTERVENTO RIPIANIFICATO. PREVEDE UNA SERIE DI MANUTENZIONI EDILI E MECCANICHE VOLTE A RENDERE MAGGIORMENTE AFFIDABILE IL DEPURATORE, L'INIZIO DELLA FASE REALIZZATIVA E' PREVISTA A FINE 2025	50.000,00
3	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA DEFINIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI HA RICHIESTO PIU' TEMPO DI QUANTO INIZIALMENTE PIANIFICATO. A SEGUIRE SI PROCEDERA' CON LA STESURA DEL PROGETTO. SEGUIRA' L'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PERMESSI E DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE	50.000,00
4	2015RNHA0001	RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE ALCUNE LAVORAZIONI ERANO STATE ANTICIPATE NELLE ANNUALITA' PASSATE	51.000,00
5	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILIEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI	30.000,00
6	2022RNHA0005	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.	400.000,00
7	2024RNHA0001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	50.000,00
8	2024RNHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	50.000,00
9	2024RNHA0005	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023	10.000,00
10	2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	FOGNATURA	Poggio Torriana	Gestore	QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V. CA' MAGRINO" RISULTA COMPLETATO. IL SECONDO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE N. 3" RISULTA DA PROGETTARE. L'AGGLOMERATO E' SOTTO I 50 AE, SERVITO DA FOSSA INHOFF. NON SUSSISTENDO CRITICITA' COGENTI LA PROGETTAZIONE E' STATA POSTICIPATA AL 2025	50.000,00

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2024 GESTORE: HERA S.P.A. BACINO DI GESTIONE DI RIMINI							
11	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI IN ACCORDO CON IL COMUNE CHE HANNO RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVAZIONE DI ALCUNI BYPASS RELATIVI AD ALCUNI IMPIANTI, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULLA BALNEAZIONE. ALLO STATO ATTUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA PREVISTO L'EMISSIONE DI ULTERIORI ORDINANZE	50.000,00
12	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	Riccione	Gestore	INTERVENTO NON URGENTE IN QUANTO SITUAZIONE NON CRITICA. PROSEGUONO GLI STUDI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO	80.000,00
13	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	FOGNATURA	Riccione	Gestore	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO NON E' CONSIDERATO PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO	30.000,00
14	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	Riccione	Gestore	INTERVENTO NON PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO CRITICITA' COGENTI. POSTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE POICHE' DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO	30.000,00
15	2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	FOGNATURA	Rimini	Romagna Acque	SCOSTAMENTO DOVUTO A MANCATA FATTURAZIONE VERSO ROMAGNA ACQUE IN ATTESA DELL'AGGIONAMENTO DELL'ACCORDO ATTUATIVO	2.263.000,00
16	2024RNHA0016	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD (FINANZIAMENTO RASDF)	FOGNATURA	Rimini	Romagna Acque	LAVORI DELLO STRALCIO I REGOLARMENTE PARTITO MA CONTABILIZZATO SOLO SULLA QUOTA DI FINANZAIMENTO HERA IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ATTUATIVO CON RASDF	1.177.000,00
17	2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Romagna Acque	INTERVENTO IN ESECUZIONE NEL 2025 - SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INIZIO DEI LAVORI PER MODIFICHE PROGETTUALI CONDIVISE CON ENTI	425.000,00
	Totale complessivo						4.801.000,00

TAB.8 – Interventi pianificati non rendicontati nel 2024

Rep. DD 23/09/2026.0000074.1.1
Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 aprile 2024 - annuita 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
1	2021RNHA0007	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX DEP. BELLARIA	DEPURAZIONE	Bellaria Igea Marina	Gestore	1.201.740,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
2	2022RNHA0019	RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
3	2025RNHA0001	PNRR ALL. SPOSTAMENTO CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO BELLARIA	ACQUEDOTTO	Bellaria Igea Marina	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.423,47 €	- €	- €	3.423,47 €	3.423,47 €	100	AVVIO DELL' INTERVENTO CHE RIENTRA NELL' AMBITO DEI PROGETTI PRESENTATI DA HERA SPA PER LA MISURA PNRR M2C4 - I2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ER-UBIS-000072, N. CUP H62E24000240001). L' INTERVENTO CONSISTE NELLO SPOSTAMENTO CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO FIUME USO IN PONTE TUBO, LA REALIZZAZIONE SI SVILUPPERA' NEL CORSO DEL 2025	
4	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	644.000,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
5	2018RNHA0004	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19)	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	10.989.542,05 €	1.929.000,00 €	- €	- €	1.929.000,00 €	3.176.690,09 €	- €	- €	3.176.690,09 €	1.247.690,09 €	64	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE, CON ANTICIPO AL 2024 DI PARTE DI LAVORAZIONI ORIGINARIAMENTE PREVISTE NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	
6	2020RNHA0002	DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	1.300.000,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
7	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	FOGNATURA	Cattolica	AMIR	741.886,24 €	107.000,00 €	- €	107.000,00 €	- €	93.622,00 €	- €	93.622,00 €	- €	-	13.378,00 €	-12	
8	2021RNHA0008	REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	979.999,82 €	78.000,00 €	- €	- €	78.000,00 €	6.715,60 €	- €	- €	6.715,60 €	-	71.284,40 €	-91	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI DARE PRIORITA' AD ALTRI INTERVENTI SEMPRE SUL DEPURATORE, NELLO SPECIFICO L' ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI (ID 2021RNHA0011)
9	2021RNHA0011	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	3.581.498,21 €	190.000,00 €	- €	- €	190.000,00 €	60.066,72 €	- €	- €	60.066,72 €	-	129.933,28 €	-68	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE PER LA GARA D'APPALTO (ATTUALMENTE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE) CHE NON HANNO PERMESSO ANCORA L'INIZIO DEI LAVORI
10	2022RNHA0020	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	243.905,49 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	10.728,78 €	- €	- €	10.728,78 €	-	89.271,22 €	-89	L'INTERVENTO IN OGGETTO CONSISTEVA NEL SECONDO STRALCIO DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO. LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE IL COMUNE DI CATTOLICA HA CHIESTO DI SOSPENDERE LA REALIZZAZIONE
11	2022RNHA0021	SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA - ZONA DELLE NAZIONI	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	204.663,00 €	- €	- €	- €	- €	24.996,56 €	- €	- €	24.996,56 €	24.996,56 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI	
12	2022RNHA0023	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI	ACQUEDOTTO	Cattolica	Gestore	169.426,71 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	74.389,22 €	- €	- €	74.389,22 €	69.389,22 €	1387	INTERVENTO CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2024 PER CONCLUSIONE DEI LAVORI SLITTATI DAL 2023.	
13	2022RNHA0024	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE NAZIONI	ACQUEDOTTO	Cattolica	Gestore	165.165,00 €	- €	- €	- €	- €	22.629,12 €	- €	- €	22.629,12 €	22.629,12 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI	
14	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	11.061.587,59 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	77.520,16 €	- €	- €	77.520,16 €	27.520,16 €	55	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO A MAGGIORI COSTI PER APPROFONDIMENTI IN CAMPO E VIDEOISPEZIONI. PRIMO STRALCIO IN CORSO DI PROGETTAZIONE.	
15	2024RNHA0019	STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA	ACQUE BIANCHE	Cattolica	Gestore	18.046,02 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	13.046,02 €	- €	- €	13.046,02 €	-	1.953,98 €	-13	
16	2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)	FOGNATURA	Coriano	Gestore	347.021,00 €	- €	- €	- €	- €	27.940,49 €	- €	- €	27.940,49 €	27.940,49 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2024 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI.	
17	2021RNHA0010	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITA SANT'ANDREA IN BESANIGO	FOGNATURA	Coriano	AMIR	586.794,29 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	5.000,00 €	-100	INTERVENTO AUTORIZZATO CON DG N.152 DEL 17/09/2024. AVVIO CANTIERE PREVISTO NEL 2025, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO.
18	2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.000.207,26 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	48.902,30 €	- €	- €	48.902,30 €	-	51.097,70 €	-51	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AI MINORI COSTI SOSTENUTI PER GLI APPROFONDIMENTI CONDOTTI SU INTERAZIONI TRA RETICOLO FOGNARIO E RETICOLO SUPERFICIALE.
19	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.080.456,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
20	2020RNHA0003	DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO E COLLEGAMENTO CON DEP. CATTOLICA	DEPURAZIONE	Misano Adriatico	Gestore	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
21	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.399.999,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
22	2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO COLLETTAMENTO SCARICO 3 SAN MARCO	FOGNATURA	Monte Colombo	Gestore	798.000,00 €	282.000,00 €	- €	- €	282.000,00 €	22.445,11 €	- €	- €	22.445,11 €	-	259.554,89 €	-92	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI: POSTICIPO AVVIO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO AL 2025 CAUSA RITARDO NELL' OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.
23	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	DEPURAZIONE	Monte Colombo	Gestore	400.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO. PREVEDE UNA SERIE DI MANUTENZIONI EDILI E MECCANICHE VOLTE A RENDERE MAGGIORMENTE AFFIDABILE IL DEPURATORE. L'INIZIO DELLA FASE REALIZZATIVA E' PREVISTA A FINE 2025
24	2024RNHA0020	ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO	ACQUEDOTTO	Montegridolfo	Gestore	639.272,82 €	- €	- €	- €	- €	12.189,18 €	- €	- €	12.189,18 €	12.189,18 €	100	RIPRESA ANTICIPATA DELLA PROGETTAZIONE PER CRITICITA' DELL'INTERVENTO	
25	2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	FOGNATURA	Montescudo	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
26	2018RNHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC	ACQUEDOTTO	Montescudo-Monte Colombo	Gestore	162.297,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
27	2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	FOGNATURA	Montescudo-Monte Colombo	Gestore	425.616,61 €	- €	448.000,00 €	- €	-	448.000,00 €	31.481,42 €	- €	- €	31.481,42 €	31.481,42 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, COMPRESSE ASFALTATURE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
28	2022RNHA0027	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	749.999,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
29	2022RNHA0028	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	599.999,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
30	2022RNHA0029	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	599.999,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
31	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	599.999,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
32	2022RNHA0031	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
33	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	336.849,83 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA DEFINIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI HA RICHIESTO PIU' TEMPO DI QUANTO INIZIALMENTE PIANIFICATO. A SEGUIRE SI PROCEDERA' CON LA STESURA DEL PROGETTO. SEGUIRA' L'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PERMESSI E DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE
34	2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	Novafeltria	Gestore	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.940,28 €	- €	- €	6.940,28 €	6.940,28 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD ATTIVITA' RESIDUE IN CAPO ALL' UFFICIO PATRIMONIO	
35	2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
36	2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - AT09	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.150.000,00 €	- €	- €	2.150.000,00 €	1.684.649,56 €	- €	- €	1.684.649,56 €	-	465.350,44 €	-21	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
37	2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - AT09	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.200.000,00 €	- €	- €	2.200.000,00 €	1.447.594,11 €	- €	- €	1.447.594,11 €	-	752.405,89 €	-34	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALEZIONI DI PRONTO INTERVENTO

Rep. DD 23/09/2026.0000074.1.1
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 aprile 2024 - annuità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
38	2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	650.000,00 €	- €	- €	650.000,00 €	1.000.675,10 €	- €	- €	1.000.675,10 €	350.675,10 €	53	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
39	2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	1.854.292,61 €	- €	- €	1.854.292,61 €	954.292,61 €	106	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
40	2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	16.878,93 €	- €	- €	16.878,93 €	13.121,07 €	-43	
41	2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	244.608,07 €	- €	- €	244.608,07 €	194.608,07 €	389	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
42	2014RNHA0021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 9	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	1.176.681,52 €	- €	- €	1.176.681,52 €	726.681,52 €	161	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
43	2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	738.286,05 €	- €	- €	738.286,05 €	488.286,05 €	195	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
44	2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	1.113.202,14 €	- €	- €	1.113.202,14 €	943.202,14 €	554	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
45	2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €	320.791,43 €	- €	- €	320.791,43 €	100.791,43 €	45	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
46	2014RNHA0081	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	728.298,43 €	- €	- €	728.298,43 €	471.701,57 €	-39	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
47	2014RNHA0084	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	44.282,67 €	- €	- €	44.282,67 €	65.717,33 €	-59	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
48	2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	596.539,60 €	- €	- €	596.539,60 €	296.539,60 €	98	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
49	2015RNHA0001	RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	2.101.336,89 €	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	51.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE ALCUNE LAVORAZIONI ERANO STATE ANTICIPATE NELLE ANNUALITA' PASSATE
50	2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.436.578,83 €	509.000,00 €	- €	- €	509.000,00 €	264.354,06 €	- €	- €	264.354,06 €	244.645,94 €	-48	INTERVENTO SUDDIVISO IN STRALCI, ESEGUITI STRALCIO I E STRALCIO II, RIPIANIFICATA PROGETTAZIONE DELLO STRALCIO III
51	2015RNHA0009	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOG. RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	97.976,67 €	- €	- €	97.976,67 €	7.976,67 €	8	
52	2015RNHA0023	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	46.885,96 €	- €	- €	46.885,96 €	13.114,04 €	-21	
53	2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	304.326,50 €	- €	- €	304.326,50 €	244.326,50 €	407	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
54	2017RNHA0029	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.680.234,00 €	- €	- €	1.680.234,00 €	4.291.837,00 €	- €	- €	4.291.837,00 €	2.611.603,00 €	155	
55	2018RNHA0002	DISMISSIONE DEP.PONTE S.M.MADDALENA E COLL.FOGNARIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	1.010.501,39 €	79.000,00 €	- €	79.000,00 €	- €	17.015,92 €	- €	17.015,92 €	- €	61.984,08 €	-78	INTERVENTO DI COLLETTAMENTO E RICONVERSIONE DEPURATORE COMPLETATO. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO ALLO SLITTAMENTO LAVORI DI VARIANTE PER REALIZZAZIONE DELLA RAMPA ARGINALE IN CORSO DI PROGETTAZIONE
56	2018RNHA0011	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - TICSÌ E TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	23.520,97 €	- €	- €	23.520,97 €	23.520,97 €	100	
57	2020RNHA0007	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	- €	- €	1.563.088,03 €	1.377.115,19 €	- €	- €	185.972,84 €	-13	
58	2020RNHA0008	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - RN - ATO9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	424.516,04 €	489.610,50 €	- €	- €	65.094,46 €	-29	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
59	2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	35.276,75 €	- €	- €	35.276,75 €	64.723,25 €	-64	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 9. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2024 IL DELTA E' DOVUTO A RITARDI NELLE AUTORIZZAZIONI.
60	2021RNHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	23.213,23 €	- €	- €	23.213,23 €	106.786,77 €	-82	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
61	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILIEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
62	2022RNHA0001	RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	1.248.757,51 €	- €	1.248.757,51 €	- €	248.757,51 €	24	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
63	2022RNHA0002	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SIS	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	1.213.254,11 €	- €	1.213.254,11 €	- €	213.254,11 €	21	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
64	2022RNHA0003	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	144.974,49 €	- €	144.974,49 €	- €	44.974,49 €	-44	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
65	2022RNHA0004	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SIS	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	144.916,66 €	- €	144.916,66 €	- €	55.083,34 €	-27	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
66	2022RNHA0005	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
67	2022RNHA0006	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	SIS	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	50.568,19 €	- €	50.568,19 €	- €	349.431,81 €	-87	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
68	2022RNHA0007	MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	97.118,28 €	- €	97.118,28 €	- €	2.881,72 €	-2	
69	2022RNHA0008	MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	SIS	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	105.437,51 €	- €	105.437,51 €	- €	5.437,51 €	5	
70	2022RNHA0009	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	512.392,48 €	- €	512.392,48 €	- €	112.392,48 €	28	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
71	2022RNHA0010	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	SIS	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	492.483,59 €	- €	492.483,59 €	- €	192.483,59 €	64	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEGLI ID RELATIVI AD ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
72	2022RNHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	210.000,00 €	- €	- €	210.000,00 €	81.964,15 €	- €	- €	81.964,15 €	128.035,85 €	-60	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

Rep. DD 23/03/2026.0000074.1.1
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 aprile 2024 - annuità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
73	2022RNHA0035	INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	8.338.175,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2024RNHA0001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	72.500,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	7.382,51 €	- €	- 7.382,51 €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
75	2024RNHA0002	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	227.835,59 €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	64.806,88 €	113.446,26 €	- €	- 48.639,38 €	14.806,88 €	29	
76	2024RNHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
77	2024RNHA0004	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	52.707,44 €	10.000,00 €	8.000,00 €	- €	2.000,00 €	16.162,08 €	18.278,97 €	- €	- 2.116,89 €	6.162,08 €	61	
78	2024RNHA0005	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.400,11 €	- €	- 2.400,11 €	10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
79	2024RNHA0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	235.808,48 €	- €	- €	235.808,48 €	85.808,48 €	57	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA FANGHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
80	2024RNHA0023	PNRR RINNOVI RETE ACQUEDOTTO ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	4.505.383,29 €	445.222,00 €	870.818,00 €	- €	- 425.596,00 €	398.384,51 €	870.817,80 €	- €	- 472.433,29 €	46.837,49 €	-10	
81	2024RNHA0024	PNRR DISTRETTUALIZZAZIONE ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	310.000,00 €	123.046,00 €	129.198,00 €	- €	- 6.152,00 €	116.643,71 €	129.198,00 €	- €	- 12.554,29 €	6.402,29 €	-5	
82	2024RNHA0025	PNRR RICERCA PERDITE ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	195.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	- 51.000,00 €	- €	- €	- €	- 51.000,00 €	- €	0	
83	2024RNHA0026	PNRR SENSORISTICA QUALITÀ ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	91.000,00 €	56.109,00 €	58.914,00 €	- €	- 2.805,00 €	90.348,09 €	58.914,00 €	- €	- 31.434,09 €	34.239,09 €	61	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI SENSORISTICA SULLE RETI IDRICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
84	2024RNHA0027	PNRR SMART METER ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.780.000,00 €	17.734,00 €	414.670,00 €	- €	- 396.936,00 €	25.137,38 €	414.670,20 €	- €	- 389.532,82 €	7.403,38 €	41	
85	2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5	FOGNATURA	Pennabilli	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)- CA'MAGRINO(N.9)	FOGNATURA	Poggio Torriana	Gestore	230.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V. CA' MAGRINO" RISULTA COMPLETATO. IL SECONDO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE N. 3" RISULTA DA PROGETTARE. L'AGGLOMERATO E' SOTTO I 50 AE, SERVITO DA FOSSA INHOFF. NON SUSSISTENDO CRITICITA' COGENTI LA PROGETTAZIONE E' STATA POSTICIPATA AL 2025
87	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	2.825.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI IN ACCORDO CON IL COMUNE CHE HANNO RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVAZIONE DI ALCUNI BYPASS RELATIVI AD ALCUNI IMPIANTI, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULLA BALNEAZIONE. ALLO STATO ATTUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA PREVISTO L'EMISSIONE DI ULTERIORI ORDINANZE
88	2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	804.124,98 €	81.000,00 €	- €	- €	81.000,00 €	13.222,24 €	- €	- €	13.222,24 €	67.777,76 €	-83	SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO. OTTENUTA CONCESSIONE PRATICA N.2023012 DEL 18/10/2024 DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA (RICHIESTA DEL 25/10/2022 E DEL 03/07/2023). LAVORI PREVISTI NEL 2026
89	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	2.116.000,09 €	95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	43.262,18 €	- €	- €	43.262,18 €	51.737,82 €	-54	SCOSTAMENTO LEGATO AD APPROFONDIMENTI TECNICI NECESSARI SULLE STRUTTURE ESISTENTI CHE HANNO PORTATO AD UNO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
90	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VALE VENEZIA)	FOGNATURA	Riccione	Gestore	220.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	INTERVENTO NON URGENTE IN QUANTO SITUAZIONE NON CRITICA. PROSEGUONO GLI STUDI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
91	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	FOGNATURA	Riccione	Gestore	50.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO NON E' CONSIDERATO PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFIACITO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO
92	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	Riccione	Gestore	100.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	INTERVENTO NON PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO CRITICITA' COGENTI. POSTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE POICHE' DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFIACITO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO
93	2020RNHA0009	POTENZIAMENTO VASCHE CONTATTO DEP. RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	3.359.999,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2021RNHA0006	RICOSTRUZIONE PREMENTI SOLL. FUCINI	FOGNATURA	Riccione	Gestore	489.636,11 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	33.588,51 €	- €	- €	33.588,51 €	29.588,51 €	739	SCOSTAMENTO 2024 PER ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALI, INTERVENTO IN AUTORIZZAZIONE (PROT. 19924 DEL 7/3/2025)
96	2022RNHA0014	INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	1.945.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	Rimini	Romagna Acque	3.118.713,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	330.927,13 €	- €	330.927,13 €	- €	230.927,13 €	230	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 PER COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE.
98	2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Romagna Acque	28.041.997,00 €	- €	- €	- €	- €	308.761,36 €	- €	308.761,36 €	- €	308.761,36 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA FATTURAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO
99	2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	252.979,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
100	2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	FOGNATURA	Rimini	Romagna Acque	27.938.000,00 €	2.263.000,00 €	- €	2.263.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.263.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A MANCATA FATTURAZIONE VERSO ROMAGNA ACQUE IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO ATTUATIVO
101	2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+CONDOTTA SOLL. 2B)	FOGNATURA	Rimini	Romagna Acque	12.958.238,39 €	342.000,00 €	- €	342.000,00 €	- €	465.182,23 €	- €	465.182,23 €	- €	123.182,23 €	36	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE.
102	2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I STRALCIO - I LOTTO	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.073.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.760,34 €	- €	- €	5.760,34 €	5.760,34 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI
103	2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II STRALCIO (LOTTI 1-2-4-5-6-7)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	14.258.817,13 €	1.695.000,00 €	- €	- €	1.695.000,00 €	904.077,08 €	- €	- €	904.077,08 €	790.922,92 €	-46	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO DEI VARI LOTTI CHE COMPONGONO QUESTO ID. LOTTI 1-2-4-7 COMPLETATI, LOTTI 5 E 6 IN AGGIUDICATI CON CANTIERE PREVISTO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2025
104	2014RNHA0065	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.443.820,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
105	2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	8.154.536,83 €	942.000,00 €	- €	- €	942.000,00 €	1.193.423,30 €	- €	- €	1.193.423,30 €	251.423,30 €	26	MAGGIORE PRODUZIONE DI CANTIERE DELLE OPERE AGGIUNTIVE LEGATE ALLA SALVAGUARDIA IDRAULICA (SOLLEVAMENTO PRADELLA)
106	2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (PIAZZALE KENNEDY)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	31.564.556,56 €	- €	1.208.000,00 €	- €	- 1.208.000,00 €	- €	1.431.359,14 €	- €	- 1.431.359,14 €	- €	0	
107	2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	FOGNATURA	Rimini	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
108	2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.873.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
109	2014RNHA0073	PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	8.755.491,95 €	3.230.000,00 €	1.547.000,00 €	- €	1.683.000,00 €	62.770,75 €	- €	- €	62.770,75 €	3.167.229,25 €	-98	SCOSTAMENTO DOVUTO A POSTICIPO AVVIO LAVORI A SEGUITO DEI RITARDI PER L'OTTENIMENTO DELLA PERMESSISTICA E DEL RIAFFIDO DEI LAVORI AD ALTRA SOCIETA' ESECUTRICE

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
 Rep. DD 23/09/2026.0000074.I.1

							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 aprile 2024 - annuità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
110	2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	DEPURAZIONE	Rimini	Romagna Acque	7.217.948,00 €	630.000,00 €	- €	630.000,00 €	- €	28.724,00 €	- €	28.724,00 €	- €	601.276,00 €	-95	INTERVENTO COMPLETATO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA FATTURAZIONE. LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' SARANNO CONTABILIZZATE SUL NUOVO ID PER CUI E' STATA RICHIESTA APERTURA NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEI POI
111	2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	FOGNATURA	Rimini	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
112	2017RNHA0021	SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	12.404.140,48 €	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	10.974,85 €	- €	- €	10.974,85 €	589.025,15 €	-98	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO, LEGATO ALLA SOSTITUZIONE ANNUALE DELLE MEMBRANE DELL'IMPIANTO DI S.GIUSTINA. TALE INTERVENTO E' INSERITO A POI CON UN VALORE ANNUALE COSTANTE E POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE GESTIONALI SPECIFICHE DELL'ANNO
113	2018RNHA0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	FOGNATURA	Rimini	Gestore	1.771.318,93 €	- €	- €	- €	- €	6.854,72 €	- €	- €	6.854,72 €	6.854,72 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO AD ULTIME ATTIVITA' RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
114	2019RNHA0001	PSB-SEPARAZIONE RETI FOG-NORD RN-II* STRALCIO (LOTTO3)	FOGNATURA	Rimini	AMIR	5.727.078,00 €	1.647.000,00 €	- €	1.647.000,00 €	- €	1.330.153,88 €	- €	1.330.153,88 €	- €	316.846,12 €	-19	
115	2020RNHA0001	PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II	FOGNATURA	Rimini	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	566.918,08 €	- €	- €	566.918,08 €	566.918,08 €	-100	INTERVENTO CANCELLATO A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI, CON SUDDIVISIONE IN STRALCI ED AVVIO CANTIERE STRALCIO I NEL 2024
116	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	FOGNATURA	Rimini	Gestore	1.037.684,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	FOGNATURA	Rimini	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
118	2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	3.118.870,09 €	- €	- €	- €	- €	32.297,17 €	- €	- €	32.297,17 €	32.297,17 €	100	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AD AVVIO FASE DI PROGETTAZIONE
119	2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.391.551,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
120	2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	290.871,81 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	40.871,81 €	- €	- €	40.871,81 €	59.128,19 €	-59	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON SUSSISTENDO CRITICITA', E' STATO RIPIANIFICATO SECONDO LE ESIGENZE DEL SERVIZIO
121	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	-100	INTERVENTO PASSATO A FINANZIAMENTO ASSET E TRACCIATO SULL' ID 2022RNHA0007 MANUT. STRA.IMP. FOGNATURA - RN - AMIR. OCCORRE ANNULLARE L'ID 2022RNHA0012
122	2022RNHA0013	INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	11.307.551,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
123	2022RNHA0015	RIFACIMENTO PREMENTE 1B	FOGNATURA	Rimini	Gestore	601.420,84 €	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	10.884,84 €	- €	- €	10.884,84 €	115,16 €	-1	
124	2022RNHA0016	POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY	FOGNATURA	Rimini	Gestore	905.743,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2022RNHA0017	ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.516.999,80 €	102.000,00 €	- €	- €	102.000,00 €	48.913,08 €	- €	- €	48.913,08 €	53.086,92 €	-52	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROLUNGARSI DELLA FASE DI GARA D'APPALTO CHE NON HA PERMESSO L'INIZIO LAVORI NEL 2024
126	2022RNHA0018	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTOAROSSA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.358.022,42 €	83.000,00 €	- €	- €	83.000,00 €	17.220,37 €	- €	- €	17.220,37 €	65.779,63 €	-79	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROTRARSI DELL' INTERLOCUZIONE CON IL COMUNE PER LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA AREA DEL SOLLEVAMENTO, ATTUALMENTE IN CORSO REDAZIONE NUOVO PFTE
127	2022RNHA0022	RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	297.480,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
128	2022RNHA0025	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.949.999,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
129	2022RNHA0036	RINN RETI ACQ RN NORD-II STR.(3°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	1.147.927,14 €	575.000,00 €	- €	- €	575.000,00 €	47.166,58 €	- €	- €	47.166,58 €	527.833,42 €	-91	RIPIANIFICAZIONE A SEGUITO DI IMPREVISTI DI CANTIERE. SI REGISTRA COMPLESSITA' NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON RFI E COMUNE
130	2023RNHA0001	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	- €	815.000,00 €	- €	- €	815.000,00 €	- €	- €	- €	- €	815.000,00 €	-100	INTERVENTO NON PIU' DA CONSIDERARSI COME INVESTIMENTO A POI
131	2024RNHA0011	RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	383.496,72 €	515.000,00 €	- €	- €	515.000,00 €	12.387,27 €	- €	- €	12.387,27 €	502.612,73 €	-97	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO A MANCATA FATTURAZIONE IN ATTESA DI STIPULA CONVENZIONE. PREVISTA NEL 2025. SI REGISTRA ALTRESI' UN MINOR IMPORTO COMPLESSIVO PER ECONOMIE DI CANTIERE
132	2024RNHA0012	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	487.490,49 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	6.745,17 €	- €	- €	6.745,17 €	11.254,83 €	-62	
133	2024RNHA0013	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA- C.CLIENTE	FOGNATURA	Rimini	Gestore	497.506,29 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	7.930,92 €	- €	- €	7.930,92 €	10.069,08 €	-55	
134	2024RNHA0014	PNRR - RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(5°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	532.611,29 €	96.117,00 €	150.300,00 €	- €	54.183,00 €	14.746,56 €	150.300,00 €	- €	135.553,44 €	81.370,44 €	-84	REDITARDO AVVIO CANTIERE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO 3, PROPEDEUTICO AL LOTTO 5
135	2024RNHA0015	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	1.249.975,16 €	257.916,00 €	374.700,00 €	- €	116.784,00 €	16.652,58 €	374.700,00 €	- €	358.047,42 €	241.263,42 €	-93	REDITARDO AVVIO CANTIERE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO 3, PROPEDEUTICO AL LOTTO 6
136	2024RNHA0016	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD (FINANZIAMENTO RASDF)	FOGNATURA	Rimini	Romagna Acque	10.900.000,00 €	1.177.000,00 €	- €	1.177.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.177.000,00 €	-100	LAVORI DELLO STRALCIO I REGOLARMENTE PARTITO MA CONTABILIZZATO SOLO SULLA QUOTA DI FINANZIAMENTO HERA IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ATTUATIVO CON RASDF
137	2024RNHA0017	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD (FINANZIAMENTO HERA)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	58.881.361,44 €	2.134.000,00 €	- €	- €	2.134.000,00 €	2.534.794,19 €	- €	- €	2.534.794,19 €	400.794,19 €	18	CANTIERE DELLO STRALCIO I AVVIATO CON ANTICIPO RISPETTO ALLE PREVISIONI
138	2024RNHA0018	PSB-CONDOTTE SOTTOMARINE COLONNELLA E RODELLA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	31.179.339,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
139	2024RNHA0021	ADEGUAMENTO PREMENTE E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI	FOGNATURA	Rimini	Gestore	3.000.239,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2022RNHA0032	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS)	FOGNATURA	San Clemente	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
141	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	FOGNATURA	San Giovanni in Marignano	Gestore	5.500.000,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	San Leo	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
143	2018RNHA0006	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC	ACQUEDOTTO	San Leo	Gestore	298.111,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
144	2017RNHA0025	ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	DEPURAZIONE	Sant'Agata Feltria	Gestore	400.701,28 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	13.868,23 €	- €	- €	13.868,23 €	86.131,77 €	-86	INTERVENTO NON PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO CRITICITA' COGENTI. AVVIO STUDIO DI PREFATTIBILITA' AL FINE DI ESEGUIRE UNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO IL 2025-2026
145	2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Romagna Acque	3.420.799,71 €	425.000,00 €	- €	425.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	425.000,00 €	-100	INTERVENTO IN ESECUZIONE NEL 2025 - SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INIZIO DEI LAVORI PER MODIFICHE PROGETTUALI CONDIVISE CON ENT
146	2014RNHA0076	ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	701.421,40 €	414.000,00 €	- €	- €	414.000,00 €	165.723,63 €	- €	- €	165.723,63 €	248.276,37 €	-59	SCOSTAMENTO 2024 PER RIDOTTA PRODUTTIVITA' DI CANTIERE A SEGUITO DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI. IL CANTIERE ATTUALMENTE E' FERMO.
147	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO.BRUXELLES	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.206.144,04 €	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	37.375,28 €	- €	- €	37.375,28 €	13.375,28 €	55	
149	2018RNHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	324.904,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	



							Programma Operativo degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 aprile 2024 - annuità 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				Scostamento		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
150	2018RNHA0010	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ POZZO BRANCONA - FSC	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	563.103,36 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	53.679,59 €	- €	- €	53.679,59 €	- 246.320,41 €	-82	INTERVENTO TERMINATO. IN ATTESA DI INCASSO CONTRIBUTO
151	2024RNHA0022	PNRR -POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	459.406,42 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	52.222,06 €	- €	- €	52.222,06 €	- 37.777,94 €	-41	RIPIANIFICAZIONE AVVIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (TITOLO ABILITATIVO RICEVUTO IN DATA 03/06/2025 CON PROT. HERA 45112)
152	2024RNHA0006	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	ACQUEDOTTO	Sassofeltrio	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	117.410,32 €	- €	- €	117.410,32 €	67.410,32 €	134	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
153	2024RNHA0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	ACQUEDOTTO	Sassofeltrio	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	288.015,40 €	- €	- €	288.015,40 €	188.015,40 €	188	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
154	2024RNHA0008	RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	FOGNATURA	Sassofeltrio	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	20.323,14 €	- €	- €	20.323,14 €	- 29.676,86 €	-59	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
155	2024RNHA0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	FOGNATURA	Sassofeltrio	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	14.418,99 €	- €	- €	14.418,99 €	- 85.581,01 €	-85	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
156	2018RNHA0001	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11	FOGNATURA	Verucchio	AMIR	234.709,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2018RNHA0007	RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA - MONTE UGONE - FSC	ACQUEDOTTO	Verucchio	Gestore	298.643,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
							Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							41.626.378,00 €	7.824.600,00 €	10.826.000,00 €	22.975.778,00 €	34.536.087,64 €	5.489.192,68 €	6.584.289,34 €	22.462.605,62 €	76%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							39.946.144,00 €	7.824.600,00 €	10.826.000,00 €	21.295.544,00 €	30.220.729,67 €	5.489.192,68 €	6.584.289,34 €	18.147.247,65 €			
