

Servizio Idrico Integrato
Gestore Iren Acqua Piacenza
PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029

**Relazione istruttoria revisione Programma Operativo degli
Interventi 2024-2029 per gli anni 2026-2029**

Dicembre 2025



1 Premessa

Con determinazione n. 66 del 22 marzo 2024 è stata aggiudicata a favore di Ireti Spa la Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Piacenza (CIG: 9142713571); con comunicazione a protocollo di Atersir n. 11899 del 14/11/2024 Ireti Spa ha trasmesso ad Atersir l'atto di scissione con Scorporo di Ireti Spa a favore di Iren Acqua Piacenza Srl nell'ambito del processo delle operazioni societarie funzionali alla costituzione della SOT prevista dall'assetto di gara quale Gestore del Servizio Idrico Integrato. In data 12 dicembre 2024 è stata sottoscritta da Atersir, Iren Acqua Piacenza Srl (gestore) e Ireti Spa (aggiudicatario) la Convenzione di concessione del SII, avente decorrenza dal 01/01/2024 e termine al 31/12/2040

Con Deliberazione n° 2 del 18 Aprile 2024 del Consiglio Locale di Piacenza è stato approvato il Piano operativo degli investimenti 2024-2029. Ai sensi delle Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato (CAMB/12/2025), la presente revisione straordinaria relativa agli anni 2026-2029, è stata avviata da Atersir in previsione dell'aggiornamento biennale dello schema regolatorio, previsto dall'Autorità Nazionale di Regolazione.

In particolare, con Prot. 30/01/2025.0000960.U è stato chiesto al gestore Iren Acqua Piacenza di produrre una proposta di revisione del POI 2024-2029, limitatamente agli anni 2026-2029. A tale richiesta il gestore ha dato riscontro con Prot. AP000231-2025-P del 05/03/2025 (acquisita con Prot. 06/03/2025.0002314.E). Atersir ha effettuato la necessaria istruttoria e l'ha inviata con nota Prot. 29/05/2025.0005393.U alle Amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento.

Al fine di illustrare e condividere i contenuti della proposta Atersir ha organizzato specifici incontri di vallata nei giorni 08-09-10/05/2025 e 08/06/2025. Un ulteriore incontro con i Comuni interessati è stato organizzato il 12/05/2025 in riferimento agli interventi di adeguamento depurativo con importi attualmente non pianificati nel POI 2024-2029; a seguito di tale incontro è stato fornito riscontro diretto ai singoli Comuni (note Prot. 5837-5844 del 13/06/2025, 5950-5953 e 5969-5970 del 17/06/2025).

Riguardo gli interventi finanziati da Piacenza Infrastrutture, si segnala che allo stato attuale non è stata ancora sottoscritta la convenzione fra Atersir, Gestore e Piacenza Infrastrutture, necessaria per dare avvio operativo al finanziamento degli interventi per un importo medio annuale di 1.295.431 € fino al 2040, coerentemente con quanto indicato nel PEF presente nell'offerta di gara. Le previsioni di investimento finanziato da Piacenza infrastrutture per il POI 2024-2029 ammontano a (i valori sono riproporzionati per mantenere invariato l'importo complessivo nella durata della Convenzione):

2026: 1.350.000 € 2027: 1.450.000 € 2028: 1.400.000 € 2029: 1.400.000 €

A seguito della sottoscrizione della convenzione si individueranno, a partire dalla annualità 2026, gli interventi finanziati da Piacenza infrastrutture che, ad invarianza degli investimenti complessivi del bacino, troveranno spazio economico primariamente dagli importi previsti per gli interventi 2018PCIE0027A (Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza – acquedotto), 2020PCIE0319 (Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche - Investimenti per criterio di gara T.1.1) e 2024PCIE0018 (Rifacimento reti acquedotto via Beverora).

2 Il POI 2024-2029

Il nuovo Programma Operativo degli Interventi per il sessennio 2024-2029 prevede investimenti per un totale di 179.295.107 € (circa 29.9 M€/anno), mentre nel precedente quadriennio 2020-2023

ammontavano a 96.295.716 € (circa 20.0 M€/anno), quindi con investimenti annui superiori di quasi il 50% a rispetto a quanto pianificato nel periodo precedente.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
INVESTIMENTI GESTORE	16.732.837	25.623.972	31.687.133	32.725.216	31.457.646	28.648.597	166.875.402
INVESTIMENTI SOGGETTI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI A F. PERDUTO	3.155.200	2.628.527	455.746	6.093.091	87.142	0	12.419.705
TOTALE	19.888.037	28.252.499	32.142.879	38.818.308	31.544.788	28.648.597	179.295.107

Tabella 1 - ammontare complessivo degli investimenti (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1).

2.1 La classificazione degli interventi

Gli interventi proposti sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura. Gli investimenti di struttura sono stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018.

	Investimenti Gestore	Investimenti patrimoniale	Contributi fondo perduto	TOTALE
ACQUEDOTTO	85.920.364	0	10.919.705	96.840.070
FOGNATURA	30.396.059	0	0	30.396.059
DEPURAZIONE	37.838.812	0	1.500.000	39.338.812
ACQUE BIANCHE	708.632	0	0	708.632
TUTTI	6.346.821	0	0	6.346.821
STRUTTURA	5.664.713	0	0	5.664.713
TOTALE	166.875.402	0	12.419.705	179.295.107

Tabella 2 – suddivisione investimenti per servizio (€)

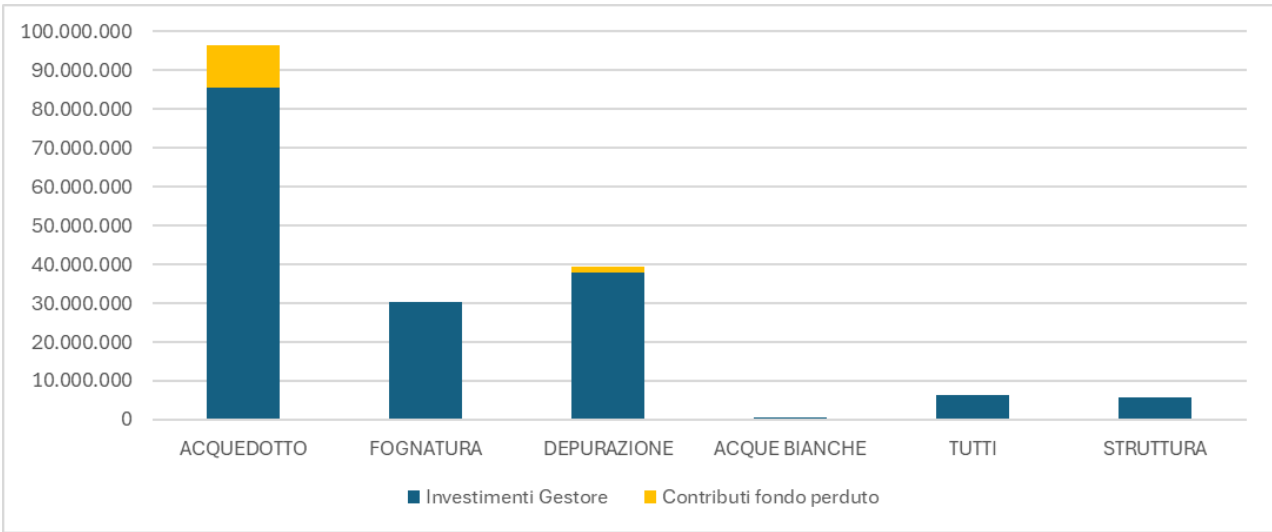


Figura 1 - Suddivisione investimenti proposti per servizio

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la delibera 917/17, rispetto ai quali è proposto il quadro al 2021 e 2023 (anno più recente con dati definitivi). È evidente l'impegno nel settore acquedottistico (macroindicatori M1 e M2 soprattutto) e depurativo (macroindicatore M6).



Servizio	Macroindicatore	Tipologia	Classe	
			2021	2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	(dal 2023)	B
	M1	Perdite Idriche	B	B
	M2	Interruzioni del servizio	A	A
	M3	Qualità dell'acqua erogata	E	D
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	E	A
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A	A
	M6	Qualità dell'acqua depurata	C	C

Tabella 3 - Classi dei macroindicatori al 2021 e 2023 (Classi da A ad E, A valore migliore, E valore peggiore)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Altro	1.256.677	1.556.654	2.703.639	2.522.206	1.665.994	1.362.326
M0	20.000	48.451	235.746	6.093.091	87.142	400.000
M1	5.192.088	6.677.739	6.818.983	7.401.540	6.659.786	6.943.405
M2	1.822.500	7.079.087	8.400.617	8.950.236	7.709.252	6.152.264
M3	2.883.172	2.428.448	1.478.448	1.368.448	1.248.448	848.448
M4	1.550.000	4.757.282	5.117.282	6.586.889	6.238.433	5.688.433
M5	110.000	598.199	1.248.199	294.392	1.482.591	294.392
M6	7.053.600	5.106.638	6.139.966	5.601.506	6.453.142	6.959.329
TOTALE	19.888.037	28.252.499	32.142.879	38.818.308	31.544.788	28.648.597

Tabella 4 – suddivisione degli investimenti per macroindicatori (€)

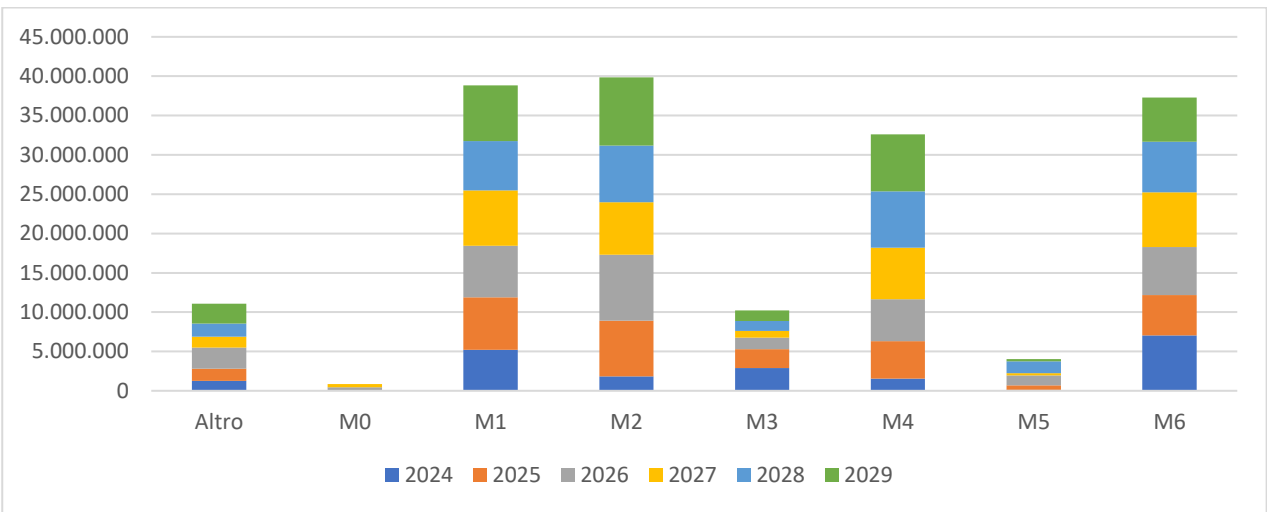


Figura 2 - Suddivisione investimenti per macroindicatore (€)

2.2 Aggiornamenti al POI 2024-2029 approvato in CL per N.O. e/o in sede di approvazione MTI4

Successivamente all'approvazione del POI del 18 Aprile 2024 Atersir ha rilasciato 5 Nulla Osta connessi a interventi realizzabili senza approvazione preventiva del Consiglio Locale e regolarizzabili ex post dall'Agenzia ai sensi della delibera CAMB 84/2022:

- Prot. 09/07/2024.0007501.U: anticipazione dell'intervento 2015PCIE0108 "Risoluzione di criticità fognarie territorio comunale di Castelvetro", in comune Castelvetro Piacentino;
- Prot. 09/07/2024.0007502.U: anticipazione dell'intervento 2018PCIE0268 "Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord di Caorso", in comune di Caorso;

- Prot. 13/03/2025.0002599.U: anticipazione dell'intervento 2024PCIE0019 "Rifacimento rete di distribuzione Mezzano Scotti", in comune di Bobbio;
 - Prot. 25/03/2025.0002985.U: inserimento a POI degli interventi 2025PCIE0001 "Rifacimento reti acquedotto centro storico Bobbio" e 2025PCIE0002 "Rifacimento reti fognatura centro storico Bobbio", in comune di Bobbio.
 - Prot. 03/04/2025.0003406.U: inserimento a POI degli interventi 2025PCIE0008 "Pulizia e ripristino alveo a protezione del pozzo Fontanamore" in comune di Rivergaro, 2025PCIE0005 "Ripristino opera di presa sorgente Molinari" in comune di Farini, 2025PCIE0007 "Ripristino copertura tubazioni e sistemazione strada di accesso serbatoio Battilana" in comune di Piozzano, 2025PCIE0003 "Realizzazione difesa a protezione della tubazione adduttrice località Rio Ribà" in comune di Farini, 2025PCIE0004 "Ripristino opera di presa, tubazioni e serbatoio Bolderoni" in comune di Farini, 2025PCIE0006 "Ripristino opera di presa e tubazioni sorgenti Lardana" in comune di Ferriere;
- si tratta di interventi finanziati in riferimento al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 51 del 20/03/2025 (secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna OCDPC 1070/2024 e 1120/2024).

Tali interventi si considerano consolidati nel POI vigente e non verranno esaminati nei paragrafi successivi relative alle variazioni introdotte dalla revisione.

2.3 Modifiche degli importi complessivi del POI vigente conseguenti alla revisione

La revisione comporta un incremento degli importi del POI (al netto di quelli di struttura) per gli anni 2026-2029, con un aumento medio annuo di oltre 4 mln di €, come mostrato nella tabella di seguito riportata e illustrato nel grafico successivo.

Servizio	POI Vigente				Revisione				Revisione vs Vigente
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Acquedotto	15.694.594	15.246.511	15.099.032	15.390.923	16.600.339	23.724.861	15.706.174	14.435.664	2.504.999
fognatura	3.928.341	4.488.185	4.638.089	4.938.185	5.743.341	6.666.640	6.588.184	6.238.184	9.253.550
depurazione	7.675.537	6.223.269	6.113.105	4.951.092	6.675.537	5.723.269	7.463.104	6.581.092	1.399.999
Tutti	600.000	450.000	390.000	300.000	1.992.626	1.766.240	1.303.779	754.176	4.076.821
Struttura	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.131.035	937.297	483.546	639.481	-1.755.349
Totale al netto struttura	27.898.472	26.407.965	26.240.226	25.580.200	31.011.844	37.881.010	31.061.242	28.009.116	17.235.369
Totale con struttura	29.135.149	27.644.642	27.476.903	26.816.877	32.142.879	38.818.308	31.544.788	28.648.597	15.480.020
Variazioni revisione vs POI vigente (totali con struttura):					3.007.730	11.173.666	4.067.885	1.831.720	

Tabella 5 Confronto fra gli importi previsti nel POI vigente e nella revisione, per servizio

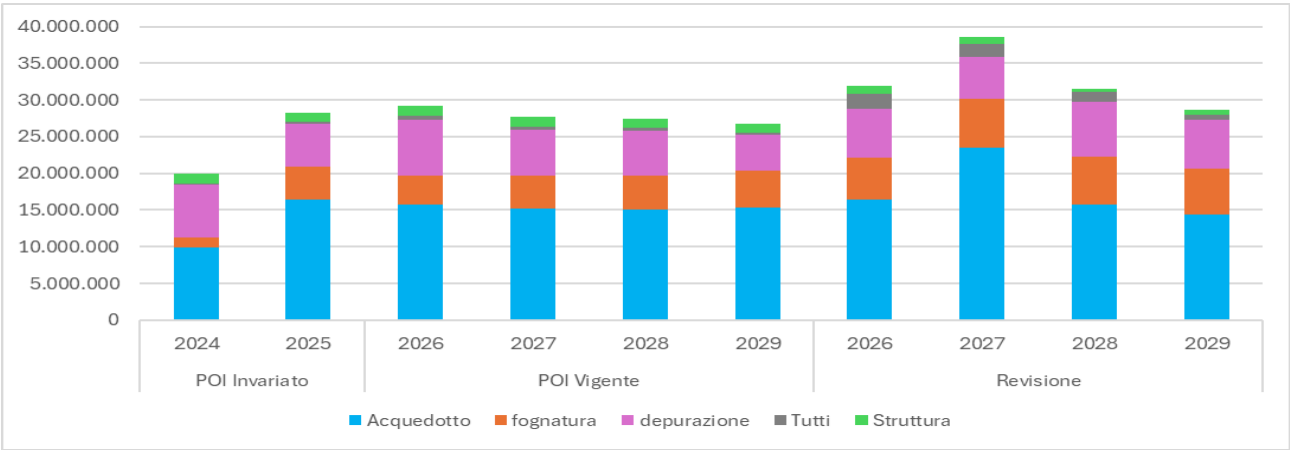


Figura 2 Confronto fra gli importi previsti nel POI vigente e nella revisione, per servizio

2.4 Gli interventi connessi agli estendimenti di rete alle case sparse (CAMB 122/2023) e alle richieste dei Comuni (CAMB 5/2025)

In riferimento agli estendimenti di rete alle case sparse, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CAMB n. 122 del 18/12/2023, come aggiornata dalla CAMB n. 3/2025, è fissato un budget annuale pari a 630.202 €/anno. In relazione alle effettive convenzioni sottoscritte, gli interventi verranno via via inseriti nel POI, fino a copertura del budget prefissato. Gli importi residui o eventualmente non impegnati a carico degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse potranno essere utilizzati, sulla medesima annualità, per interventi afferenti al capitolo delle manutenzioni straordinarie acquedotto.

In riferimento agli interventi inseribili a piano su richiesta dei Comuni, ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi" di cui alla CAMB n. 5/2025, con Determinazione 280 del 03/11/2025 sono stati individuati gli importi annuali massimi allocabili nei POI per finanziare interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali per gli anni 2026 e 2027, pari a 1 €/anno/residente e con Det. Det. 314 del 02/12/2025 è stata approvata la graduatoria per le annualità 2026-2027. Di seguito la graduatoria approvata:

Pos.	Codice	Titolo sintetico	Comune
1°	PCIREN2627_05	Risanamento adduzione località Casanova	Pianello Val Tidone
2°	PCIREN2627_02	Trattamento località Chiarone	Pianello Val Tidone
3°	PCIREN2627_03	Trattamento località Arcello	Pianello Val Tidone

L'effettivo inserimento a piano nelle annate 2026-2027 avverrà a seguito dell'effettuazione da parte del gestore dello studio di fattibilità tecnico economico e nei limiti del budget prefissato.

2.5 Sintesi degli interventi modificati

Nella tabella seguente sono messi a confronto gli importi pianificati relativi a tutti gli interventi oggetto di modifica. La programmazione relativa a tutti i restanti intervento rimane invariata.

Codice	Titolo	Comune	Servizio	Tipo aggiornamento	Imp. Prog. Vigente	Imp. Prog. Revisione
2014PCIE0033	Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	Cadeo	DEPURAZIONE	Slittamento temporale di un anno per bilanciare importi annui del POI	2.100.000	2.100.000
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio Val d'Arda + trattamento scarico potabilizzatore Mignano. A servizio dei comuni Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano, Vernasca, Carpaneto e Gropparello	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Gropparello	ACQUEDOTTO	Anticipato di due anni in previsione dei futuri interventi sull'acquedotto	5.600.000	5.600.000
2015PCIE0089	Potenziamento, riqualificazione e automazione impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	Piacenza	FOGNATURA	Anticipato di un anno per criticità emerse.	3.500.000	3.500.000
2018PCIE0027A	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza - acquedotto	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Scorporo interventi finanziati da Piacenza Infrastrutture		
2018PCIE0027B	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza - fognatura	Opere pluricomunali	FOGNATURA	Incremento per maggiori necessità intervento e incremento prezzi		
2018PCIE0027C	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza- depurazione	Opere pluricomunali	DEPURAZIONE	Incremento per maggiori necessità intervento e incremento prezzi		
2020PCIE0319	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche - Investimenti per criterio di gara T.1.1	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Scorporo interventi finanziati da Piacenza Infrastrutture		
2020PCIE0322	Investimenti di struttura	Opere pluricomunali	STRUTTURA	Scorporo degli investimenti in sistemi informativi		
2020PCIE0336	Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille	Ziano Piacentino	ACQUEDOTTO	Anticipato per criticità emergenti per frequenza rotture	600.000	600.000
2023PCIE0361	Adeguamento scarichi potabilizzatori provincia di Piacenza	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Esteso il programma agli anni 2028-29		
2023PCIE0362	Distrettualizzazione permanente e controllo pressioni provincia di Piacenza	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Esteso il programma agli anni 2028-29		
2023PCIE0338	Adeguamento reticolo fognario zona Via King	Sarmato	FOGNATURA	Eliminato dal POI per risoluzione criticità idraulica in intervento Consorzio Bonifica	200.000	
2023PCIE0355	Est.rete dist.case sparse	Carpaneto	ACQUEDOTTO	Eliminato dal POI per accorpamento studi fattibilità a 2020PCIE0326		
2023PCIE0016	Rifacimento rete acquedotto Boscone Cusani	Calendasco	ACQUEDOTTO	Anticipato di un anno per criticità emerse (rotture frequenti)	250.000	250.000

Codice	Titolo	Comune	Servizio	Tipo aggiornamento	Imp. Prog. Vigente	Imp. Prog. Revisione
2024PCIE0018	Rifacimento reti acquedotto e fognatura via Beverora (tra via Malta e via Palmerio)	Piacenza	ACQUEDOTTO	Anticipato per criticità emerse (rotture frequenti) e contingente programma asfaltature Comune. Rispetto a proposta di maggio 2025 è stato stralciato il rifacimento fognario per l'emergere di forti criticità autorizzative	180.000	170.000
2024PCIE0041	Cadeo Monterusso dismissione impianto con collettamento a Cadeo Colombaia	Cadeo	DEPURAZIONE	Posticipo intervento perché conseguente a termine lavori depuratore Cadeo Colombaia	500.000	500.000
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	Podenzano	FOGNATURA	Riprogrammazione delle attività	2.835.000	2.835.000
2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via San Rocco	Fiorenzuola	FOGNATURA	Riprogrammazione delle attività	2.300.000	2.300.000
2020PCIE0310	Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo	Pianello Val Tidone	ACQUEDOTTO	Anticipato per criticità zona collinare Rocca d'Olgisio	200.000	200.000
2023PCIE0366	Realizzazione campo pozzi Calendasco con serbatoio e collegamenti reti esistenti (PNISSI)	Calendasco	ACQUEDOTTO	Programmazione condizionata da tempistiche finanziamento PNISII	6.000.000	6.717.852
2026PCIE0001	Razionalizzazione acquedottistica loc. Assè e Cà di Là	Farini	ACQUEDOTTO	Inserito per criticità emerse	NA	200.000
2026PCIE0002	Nuovo pozzo San Protaso	Fiorenzuola d'Arda	ACQUEDOTTO	Inserito per criticità emerse	NA	400.000
2026PCIE0003	Acquedotto Pianello - Adduttrice Azzano Case Gazzoli	Pianello Val Tidone	ACQUEDOTTO	Inserito per criticità emerse (vetustà rete e frequenti rotture)	NA	500.000
2026PCIE0004	Razionalizzazione sistema depurativo Niviano	Rivergaro	DEPURAZIONE	Inserito per criticità emerse	NA	1.500.000
2026PCIE0005	Rifacimento reti acquedotto e fognatura Corso Matteotti Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	ACQUEDOTTO	Inserito per criticità emerse (vetustà rete e frequenti rotture) e previsione lavori programmati da Comune	NA	385.000
2026PCIE0006	Investimenti per Sistemi Informativi	Opere pluricomunali	TUTTI	Scorporati da investimenti di struttura	NA	
2026PCIE0008	Manutenzione depuratore Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	FOGNATURA	Inserito per criticità emerse	NA	1.500.000
2026PCIE0009	Serbatoi Casoni Bobbio	Bobbio	ACQUEDOTTO	Inserito per criticità emerse e completare riqualificazione acquedotto Bobbio	NA	350.000
2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	Besenzone	ACQUEDOTTO	Aggiornato importo progettuale	250.000	300.000
2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Camprotrino	Lugagnano Val d'Arda, Vemasca	ACQUEDOTTO	Aggiornato importo progettuale	260.000	280.000
2023PCIE0367	Razionalizzazione sistema fognario loc. Martella	Castell'Arquato	FOGNATURA	Aggiornato importo progettuale	220.000	260.000
2020PCIE0311	Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici	Rivergaro	ACQUEDOTTO	Aggiornato importo progettuale	850.000	1.100.000

Tabella 6 Interventi nuovi o modificati previsti nella revisione

Codice	Titolo	POI vigente						Revisione 26-29			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2014PCIE0033	Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	0	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio Val d'Arda + trattamento scarico potabilizzatore Mignano. A servizio dei comuni Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano, Vemasca, Carpaneto e Gropparello	0	0	0	0	0	1.320.259	0	1.320.259	0	0
2015PCIE0089	Potenziamento, riqualificazione e automazione impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	0	0	0	300.000	449.904	750.000	50.000	600.000	800.000	750.000
2018PCIE0027A	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza - acquedotto	2.375.000	1.978.875	2.004.398	2.017.160	2.010.779	2.010.779	1.079.398	1.492.160	1.460.779	2.060.779
2018PCIE0027B	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza - fognatura	950.000	716.903	716.903	716.903	716.903	716.903	716.903	716.903	1.016.903	1.316.903
2018PCIE0027C	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza - depurazione	950.000	710.062	710.062	710.062	710.062	710.062	710.062	710.062	1.010.062	1.310.062
2020PCIE0319	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche - Investimenti per criterio di gara T.1.1	1.271.750	1.157.725	1.223.707	1.281.958	1.296.735	1.349.418	1.298.707	1.306.958	1.346.735	1.399.418
2020PCIE0322	Investimenti di struttura	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.131.035	937.297	483.546	639.481
2020PCIE0336	Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
2023PCIE0361	Adeguamento scarichi potabilizzatori provincia di Piacenza	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2023PCIE0362	Distrettualizzazione permanente e controllo pressioni provincia di Piacenza	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2020PCIE0338	Adeguamento reticolo fognario zona Via King	0	0	0	0	0	0	Eliminato			
2023PCIE0355	Est.rete dist.case sparse	0	0	0	0	0	0	Eliminato			
2024PCIE0016	Rifacimento rete acquedotto Boscone Cusani	0	0	0	0	0	55.000	0	200.000	50.000	0
2024PCIE0018	Rifacimento reti acquedotto via Beverora (tra via Malta e via Palmerio)	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0
2024PCIE0041	Cadeo Monterusso dismissione impianto con collettamento a Cadeo Colombaia	0	0	0	500.000	0	0	0	0	50.000	450.000
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	0	2.498.455	336.547	0	0	0	1.336.547	1.498.455	0	0

2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità ac- quedotto via San Rocco	0	0	0	0	0	0	500.000	150.000	800.000	0
2020PCIE0310	Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
2023PCIE0366	Realizzazione campo pozzi Calendasco con serbatoio e collegamenti reti esistenti (PNISSI)	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	235.746	6.093.091	87.142	0
2026PCIE0001	Razionalizzazione acquedottistica loc. Assè e Cà di Là	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200.000	0	0	0
2026PCIE0002	Nuovo pozzo San Protaso	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	400.000
2026PCIE0003	Acquedotto Pianello - Adduttrice Azzano Case Gazzoli	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	500.000	0
2026PCIE0004	Razionalizzazione sistema depurativo Niviano	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	500.000
2026PCIE0005	Rifacimento reti acquedotto e fognatura Corso Matteotti Castel San Giovanni	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	85.000	300.000	0
2026PCIE0006	Investimenti per Sistemi Informativi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.392.626	1.316.240	913.779	454.176
2026PCIE0007	Interventi finanziati da Piacenza Infrastrutture	NA	NA	NA	NA	NA	NA	850.000	950.000	900.000	900.000
2026PCIE0008	Manutenzione depuratore Castel San Giovanni	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.000	200.000	500.000	700.000
2026PCIE0009	Serbatoi Casoni Bobbio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	350.000
2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	0	0	0	250.000	0	0	0	300.000	0	
2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Camprotrino	0	0	260.000	0	0	0	280.000	0	0	
2023PCIE0367	Razionalizzazione sistema fognario loc. Martella	0	0	220.000	0	0	0	260.000	0	0	
2020PCIE0311	Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici	0	0	450.000	400.000	0	0	450.000	650.000	0	0

Tabella 7 Importi pianificati per gli interventi nuovi o modificati previsti nella revisione (in arancione le annua-
lità modificate)

2.6 Interventi oggetto di finanziamento pubblico

Nel POI 2024-2029 è presente l'intervento 2023PCIE0366 (Realizzazione campo pozzi Calendasco con serbatoio e collegamenti reti esistenti) con un importo progettuale complessivo di 6.717.852 €, ammesso a finanziamento nell'ambito del programma PNISSI (Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2025). Per tale intervento è stata prevista la seguente programmazione temporale (tutta attribuita a finanziamenti pubblici a fondo perduto):

2025: 48.451 € 2026: 235.746 € 2027: 6.093.091 € 2028: 87.142 € 2029: 0 €

Allo stato attuale è stata sottoscritta la Convenzione di accettazione del finanziamento, nell'ambito della quale il Gestore ha richiesto un aggiornamento del quadro economico (che porterà a prevedere anche importi a carico della tariffa) e una rimodulazione temporale degli investimenti. I dati di investimento programmati nel POI, sia a carico della tariffa che a contributo, verranno pertanto allineati in riferimento al riscontro di tale richiesta da parte del Ministero.

Nel POI Sono inseriti anche 6 interventi oggetto di finanziamento FSC, da terminare entro l'anno 2025, 4 riferiti al bando della riduzione dei valori del cromo esavalente e 2 per la riduzione delle perdite. A conferma delle previsioni di programmazione del POI vigente per tali interventi non sono previsti importi per gli anni 2027-2029. In riferimento agli interventi 2018PCIE0248 "Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO", 2020PCIE0317 "Collegamento Roncaglia - Caorso - SOSTITUTO FSC" e 2015PCIE0085 "Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento Calendasco-Sarmato-Castel San Giovanni-Borgonovo-collegamento Rottofreno-Cattagnina", il Gestore ha richiesto, con nota Prot. RT002412-2025-P (agli atti con Prot. 06/03/2025.0002345.E) un aggiornamento dei cronoprogrammi, prevedendo il termine dei lavori nel 2026.

3 La verifica della coerenza della revisione del POI con l'offerta di gara

La verifica viene condotta in riferimento alle variazioni introdotte dalla revisione in riferimento alle risultanze dell'istruttoria condotta nell'ambito dell'approvazione del POI 2024-2029 con CLPC/2024/02, rimandando a tale documento (3.3 Riscontro offerta di gara nel POI 2024-2029) per maggiori approfondimenti. Si segnala che la revisione introduce incrementi negli investimenti per



tutte le categorie di opere presenti nell'offerta di gara e risulta quindi coerente con l'offerta stessa, come mostrato nella tabella seguente.

Da Offerta	2026	2027	2028	2029	Totale 2026-2029
Opere acquedotto	15.070.095	14.936.072	14.859.138	14.649.105	59.514.410
Opere fognatura	4.428.099	4.187.966	4.187.966	4.187.966	16.991.997
Opere depurazione	7.175.211	6.522.973	6.562.710	5.700.833	25.961.727
Cartografia	600.000	450.000	390.000	300.000	1.740.000
Investimenti di struttura	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	4.946.708
TOTALE INVESTIMENTI	28.510.082	27.333.688	27.236.491	26.074.581	109.154.842
POI 24-29 vigente	2026	2027	2028	2029	Totale 2026-2029
Opere acquedotto	15.694.594	15.246.511	15.099.032	15.390.923	61.431.060
Opere fognatura	3.928.341	4.488.185	4.638.089	4.938.185	17.992.799
Opere depurazione	7.675.537	6.223.269	6.113.105	4.951.092	24.963.004
Cartografia	600.000	450.000	390.000	300.000	1.740.000
Investimenti di struttura	1.236.677	1.236.677	1.236.677	1.236.677	4.946.708
TOTALE INVESTIMENTI	29.135.149	27.644.642	27.476.903	26.816.877	111.073.571
Revisione anni 2026-2029	2026	2027	2028	2029	Totale 2026-2029
Opere acquedotto	16.600.339	23.724.861	15.706.174	14.435.664	70.467.038
Opere fognatura	5.743.341	6.666.640	6.588.184	6.238.184	25.236.350
Opere depurazione	6.675.537	5.723.269	7.463.104	6.581.092	26.443.003
Cartografia	600.000	450.000	390.000	300.000	1.740.000
Sistemi informativi	1.392.626	1.316.240	913.779	454.176	4.076.821
Investimenti di struttura	1.131.035	937.297	483.546	639.481	3.191.359
TOTALE INVESTIMENTI	32.142.879	38.818.307	31.544.788	28.648.597	131.154.571

Tabella 8 Confronto fra gli importi previsti nell'offerta di gara, nel POI vigente e nella revisione

4 Osservazioni pervenute dai Comuni

Atersir ha proceduto ad inviare la documentazione tecnica alle Amministrazioni comunali con nota Prot. 29/05/2025.0005393.U chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento utilizzando la modulistica messa a disposizione. Sono prevenute due osservazioni, alle quale il Gestore ha dato riscontro con la nota Prot. AP000785-2025-P di proposta di analisi e controdeduzioni, acquisita con Prot. Prot. 16/09/2025.0008794.E. Nel seguito si sintetizzano i contenuti delle osservazioni ricevute, la proposta di controdeduzione del Gestore e la valutazione di Atersir.

Comune di Cadeo

Osservazione. "Con la presente, il Comune di Cadeo prende atto della proposta di revisione del POI vigente 2024- 2029 relativa agli anni 2026-2029, in particolare dello spostamento di un anno dell'intervento Cadeo Colombaia, come indicato nella documentazione pervenuta, tra cui il file "Proposta revisione POI24- 29 22-05-25.xlsx" e la relazione esplicativa prodotta dal gestore "250303_RELAZIONE_AGGIORNAMENTO_POI_2026-2029_IAP.pdf". Si osserva che questa modifica comporta un ulteriore ritardo rispetto alle tempistiche previste, e, considerato che da tempo attendiamo l'avvio di questo importante intervento, chiediamo cortesemente che non venga ulteriormente procrastinato. La realizzazione di questa opera rappresenta un obiettivo prioritario per il nostro territorio e per la comunità, e confidiamo in un rapido avanzamento delle procedure per poter finalmente procedere con i lavori. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e collaborazioni utili a favorire la celere attuazione dell'intervento."



Controdeduzione del Gestore. Per l'intervento 2014PCIE0033 "Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia" se ne conferma la pianificazione attuale prevista nelle annualità 2027 e 2028.

Atersir. Si ritiene che la risposta del Gestore sia conforme alle richieste manifestate dal Comune.

Comune di Pianello

Osservazione "Intervento ID 2018PCIE0283 - Anticipare il più possibile e comunque non oltre il primo semestre 2026"

Controdeduzione del Gestore. Per quanto riguarda l'intervento con codice 2018PCIE0283 "Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente", al momento si ritiene di poter confermare la programmazione attuale che ne prevede la realizzazione nell'annualità 2026.

Atersir. Anche a seguito di contatti informali, il Gestore si impegna ad avviare l'intervento entro la fine del primo semestre 2026.

Osservazione "Intervento ID 2026PCIE003 - Anticipare il più possibile e comunque non oltre il primo semestre 2026. La situazione è molto critica per la vetustà della tubazione, come confermato anche dal Gestore."

Controdeduzione del Gestore. Premesso che l'intervento con codice 2026PCIE003 "Acquedotto Pianello - Adduttrice Azzano Case Gazzoli" necessita di adeguati tempi di progettazione, non è possibile considerarne la realizzazione nel 2026 in quanto tale annualità prevede la realizzazione di interventi presenti da più tempo nel POI che non possono essere ulteriormente posticipati. Allo stesso modo anche la programmazione prevista nel 2027 risulta attualmente incompatibile con l'inserimento di questo intervento. Si può pertanto valutarne l'anticipazione al 2028.

Atersir. Si ritiene di anticipare al 2028 l'intervento, attualmente pianificato nel 2029.

Riguardo ad ulteriori richieste pervenute dai Comuni successivamente ai termini previsti dalla comunicazione Prot. 29/05/2025.0005393.U, si rileva quanto segue.

Con Prot. 21/10/2025.0010188.E è stata acquisita la nota del Comune di Castel San Giovanni che in riferimento al programmato rifacimento della pavimentazione in pietra di un tratto di Corso Matteotti, segnala la necessità di coordinare le tempistiche dell'intervento 2026PCIE005 "Rifacimento reti acquedotto e fognatura Corso Matteotti Castel San Giovanni".

In seguito ad interlocuzioni informali con Il Gestore, Atersir con nota Prot. 25/11/2025.0011512.U ha comunicato che si è ritenuto di anticipare all'annualità 2027 l'avvio dell'intervento, chiedendo al gestore di definire un cronoprogramma condiviso delle attività.

Con Prot. 18/11/2025.0011220.E è stata acquisita la nota del Comune di Vernasca che segnala alcune criticità presenti sul territorio, in particolare:

- A) anticipazione all'annualità 2026 dell'intervento 2015PCIE0138 "Rifacimento Serbatoi Loc. Vezzolacca";
- B) programmazione, nelle annualità 2026-2027, dell'attuazione dell'intervento 2020PCIE0313 "Dorsale Sinistra Ongina 1° Stralcio";
- C) approfondimento della situazione relativa ad acquedotti privati in località Azzali, Rosi e Comini-Ferretti.

Con nota Prot. 21/11/2025.0011408.U, Atersir ha chiesto riscontro al Gestore riguardo le criticità segnalate dal Comune. Il Gestore con nota acquisita con Prot. 27/11/2025.0011556.E, rileva, in riferimento ai rispettivi punti posti dal Comune:

A) conferma la pianificazione dell'intervento nelle annualità previste dal POI (dal 2026 al 2028), evidenziando che nel corso del 2025 è stato acquisito il terreno per la costruzione di un nuovo serbatoio

B) in relazione al numero di riparazioni effettuate sull'adduzione nell'ultimo triennio, al momento non sembrerebbero sussistere i presupposti per anticipare l'intervento nelle annualità richieste, tenendo conto delle priorità già inserite nell'attuale POI; la programmazione di questo intervento sarà quindi inserita nei Piani Operativi successivi al 2029. In ogni caso si monitorerà in futuro lo stato delle tubazioni in modo da comunicare al Comune di Vernasca e ad Atersir possibili deterioramenti delle condotte, al momento non ipotizzabili;

C) conferma che è stato già programmato un sopralluogo congiunto tra operatori aziendali, Amministrazione comunale e utenze private in data 2/12/2025 per valutare la situazione.

Atersir ritiene che in riferimento ai punti A) e B) le risposte del Gestore confermino il mantenimento della programmazione prevista dalla revisione e, relativamente al punto C), si attendono gli esiti dei sopralluoghi.

5 Interventi presenti nel POI relativi ad adeguamenti depurativi con importi attualmente non pianificati

In riferimento alla tematica Atersir ha provveduto ad un confronto con la Regione Emilia-Romagna e, anche a seguito di un incontro tenutosi il 12/05/2025, Atersir ha proceduto a inviare ai singoli Comuni interessati le risultanze delle valutazioni tecniche condotte in accordo con il Gestore, anche alla luce degli indirizzi strategici delineati dalla rifusione della Direttiva acque reflue (Dir. UE 2024_3019). Nel seguito sono sintetizzati i contenuti delle comunicazioni inviate.

Comune Nota riscontro	Codice ARSI Titolo intervento	Sintesi riscontro Atersir
Carpaneto Piacentino Prot. 17/06/2025.0005970.U	2020PCIE0327 Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio	Non si rileva la necessità di un adeguamento motivato da carenza di potenzialità, inadeguatezza del trattamento o cattivo stato di conservazione dell'impianto. <u>Atersir ritiene pertanto di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto</u> , riservandosi di rivalutare l'intervento in relazione ad approfondimenti sulla effettiva entità del carico connesso a utenze non residenti o non domestiche.
Bobbio Prot. 17/06/2025.0005969.U	2014PCIE0021 Impianto di depurazione di Mezzano Scotti e collettamenti fognari	Non si rileva la necessità di un adeguamento impiantistico motivato da carenza di potenzialità, inadeguatezza del trattamento o cattivo stato di conservazione degli impianti. <u>Atersir ritiene pertanto di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto</u> . La necessità di un potenziamento e/o adeguamento depurativo e la possibilità di inserimento dell'intervento nel POI attuale potrà essere rivalutata nei prossimi anni a seguito dell'avvio formale di un procedimento urbanistico da parte del Comune che definisca le caratteristiche delle utenze aggiuntive. Nell'ambito di tale procedimento formale, il Gestore formulerà un proprio parere tecnico, individuando le eventuali necessità di potenziamento/adeguamento infrastrutturale e Atersir valuterà quali opere potranno risultare a carico del SII e quali dovranno essere finanziate dal proponente l'espansione.
Vernasca Prot. 17/06/2025.0005953.U	2014PCIE0001 Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 (Bacedasco Basso) APC0541 e relativi collegamenti fognari	A seguito di un confronto informale con il Gestore è emerso che gli agglomerati in oggetto non dispongono di trattamento, ma attualmente si non rilevano criticità ambientali o igienico sanitarie. <u>Atersir ritiene pertanto di ripianificare nella successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto</u> . Ai sensi del Regolamento CAMB/05/2025 l'intervento in oggetto potrà essere candidato su istanza del Comune e reinserito nella pianificazione 2026-2029 in seguito alla valutazione degli interventi proposti.

Comune Nota riscontro	Codice ARSI Titolo intervento	Sintesi riscontro Atersir
Travo Prot. 17/06/2025.0005952.U	2014PCIE0059 Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo	Non si rileva la necessità di un immediato adeguamento impiantistico motivato da carenza di potenzialità, inadeguatezza del trattamento o cattivo stato di conservazione degli impianti. Anche in considerazione della necessità di contenere gli importi complessivi degli investimenti, e i relativi impatti degli ammortamenti sulla Tariffa del SII, <u>Atersir ritiene di ripianificare nella successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto.</u>
San Giorgio Piacentino Prot. 17/06/2025.0005951.U	2014PCIE0030 Potenziamento depuratore capoluogo San Giorgio. 1° stralcio) 2015PCIE0132 Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio	In considerazione del limitato "franco" disponibile per un ampliamento del bacino di utenza (pari a 115 AE, ovvero meno del 3% della potenzialità dell'impianto) <u>si propone di inserire nella programmazione 2024-2029 un importo di 80'000 € per l'anno 2029, finalizzato all'aggiornamento e finalizzazione del PFTE, demandando alla successiva programmazione 2030-2035 le fasi realizzative.</u>
Rivergaro Prot. 17/06/2025.0005950.U	2018PCIE0284 Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio	Atersir, considerando anche che la potenzialità nominale dell'impianto (6'600 AE) è in grado di coprire il carico generato dal bacino di utenza dell'agglomerato (5'746 AE secondo la DGR 2201/23), <u>ritiene di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto; si prevede per il biennio 2026- 2027 la realizzazione di indagini conoscitive finalizzate a valutare gli ingressi di eventuali acque parassite e le possibilità di contenimento con interventi sul reticolo fognario.</u>
Ponte dell'Olio Prot. 13/06/2025.0005844.U	2015PCIE0128 Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio	Atersir, considerando anche che la potenzialità nominale dell'impianto (12'000 AE) è ampiamente in grado di coprire il carico generato dal bacino di utenza dell'agglomerato (4'362 AE secondo la DGR 2201/23), <u>ritiene di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto; si prevede per il biennio 2026-2027 la realizzazione di indagini conoscitive finalizzate a valutare gli ingressi di eventuali acque parassite e le possibilità di contenimento con interventi sul reticolo fognario.</u>
Gossolengo Prot. 13/06/2025.0005843.U	2014PCIE0063 Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo	allo stato attuale non si evidenziano criticità ambientali o igienico sanitarie evidenti, non risultando note al Gestore e alla scrivente Agenzia segnalazioni da parte di enti quali Arpa e Ausl e la capacità residua dell'impianto (quasi 400 AE) risulta adeguata per significative future espansioni urbanistiche connesse all'agglomerato. In relazione a quanto detto, Atersir, anche in considerazione della necessità di contenere gli importi complessivi degli investimenti, e i relativi impatti degli ammortamenti sulla Tariffa del SII, <u>propone di ripianificare nella successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto.</u>
Gazzola Prot. 13/06/2025.0005842.U	2015PCIE0117 Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Caneto di Gazzola	Non si evidenziano criticità ambientali o igienico sanitarie evidenti, non risultando note al Gestore e alla scrivente Agenzia segnalazioni da parte di enti quali Arpa e Ausl, e le condizioni di funzionalità e conservazione dell'impianto presente non segnalano necessità di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Atersir <u>propone di rivalutare l'inserimento dell'intervento nelle future programmazioni nel caso in cui fosse accertato l'incremento del bacino di utenza portandolo a carichi in ingresso a livelli prossimi alla potenzialità dell'impianto.</u>
Cortemaggiore Prot. 13/06/2025.0005841.U	2015PCIE0112 Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	Non si evidenziano criticità ambientali o igienico sanitarie evidenti, non risultando note al Gestore e alla scrivente Agenzia segnalazioni da parte di enti quali Arpa e Ausl. Il Gestore comunica che è in fase di studio una razionalizzazione del sistema fognario depurativo di 3 agglomerati (Chiavenna Landi – Saliceto – Saliceto chiusa) limitrofi, che porterebbe ad un unico agglomerato di circa 450 AE di bacino di utenza e, conseguentemente, alla realizzazione di un impianto di II livello maggiormente efficiente. <u>Atersir ritiene di ripianificare nella successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto, prevedendo per il biennio 2026-2027 la realizzazione di uno studio di prefattibilità dell'intervento di razionalizzazione prospettato che verrà trasmesso ai Comuni interessati.</u>
Borgonovo Val Tidone Prot. 13/06/2025.0005838.U	2014PCIE0002 Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al depuratore del capoluogo	Allo stato attuale risulta che l'utenza industriale che aveva chiesto l'allacciamento alla rete fognaria di Cà Verde abbia provveduto a realizzare un trattamento autonomo dei reflui e abbia ottenuto la relativa autorizzazione allo scarico in acque superficiali; sembrerebbe, tuttavia, che l'azienda risulti tuttora interessata ad un futuro allacciamento alla pubblica fognatura. Considerando che la potenzialità nominale dell'impianto (20'000 AE) è ampiamente in grado di coprire il carico generato dal bacino di utenza dell'agglomerato (5'943 AE secondo la DGR 2201/23), <u>Atersir ritiene di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto, prevedendo di rivalutare la necessità di potenziamento o revamping della sezione di sedimentazione dell'impianto di Borgonovo anche in relazione al possibile collettamento dell'agglomerato Cà Verde.</u>
Alta Val Tidone Prot. 13/06/2025.0005837.U	2014PCIE0042 Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	L'adeguamento è elencato negli interventi di "Priorità 3" (relativo a 3 diversi agglomerati contigui: APC0634, APC0635 e APC0465), per i quali originariamente la DGR prevedeva la realizzazione entro il 2030. Anche in considerazione della necessità di contenere gli importi complessivi degli investimenti, e i relativi impatti degli ammortamenti sulla Tariffa del SII, <u>Atersir ritiene di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto, riservandosi di rivalutare</u>



Comune Nota riscontro	Codice ARSI Titolo intervento	Sintesi riscontro Atersir
		l'intervento anche in relazioni a valutazioni approfondite sulla effettiva entità del carico connesso a utenze non residenti o non domestiche
	2014PCIE0017 Adeguamento agglomerato Strà (Nibbiano Alta Val Tidone)	Non sono note al Gestore e alla scrivente Agenzia segnalazioni da enti quali Arpae o Ausl in riferimento a criticità ambientali o igienico sanitarie. <u>Atersir ritiene di ripianificare alla successiva programmazione 2030-2035 l'intervento in oggetto.</u> Ai sensi del Regolamento CAMB/05/2025 gli interventi in oggetto potranno essere candidati su istanza del Comune e reinseriti nella pianificazione 2026-2029 in seguito alla valutazione degli interventi proposti.
