

Servizio Idrico Integrato
Gestore HERA S.p.A. - Bacino Ravenna

**PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029
REVISIONE BIENNALE 2026-2029
Relazione istruttoria**

Allegato 1 alla Deliberazione di Consiglio Locale CLRA/2025/3 del 17 dicembre 2025



SOMMARIO

1.	PREMESSA	1
2.	IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029	4
3.	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
3.1	Suddivisione per Soggetto finanziatore.....	7
3.2	Suddivisione per Servizio	8
3.3	Suddivisione per Macro-indicatore ARERA.....	10
3.4	Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO)	12
4.	NUOVI INTERVENTI	13
5.	AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE.....	14
6.	INTERVENTI CONCLUSI	15
7.	INTERVENTI DA STRALCIARE	16
8.	RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.....	17
8.1	Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel programma operativo degli interventi.....	17
8.2	Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi	17
8.3	Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029	18
9.	ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	18



1. PREMESSA

Con nota prot. n. 30/01/2025.0000952.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Ravenna, la trasmissione della proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, entro il 03/03/2025.

Con nota prot. n. 10/02/2025.0001318.U, ATERSIR ha richiesto a tutti Gestori di trasmettere, contestualmente alla proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029, per le annualità 2026-2029, anche la relativa relazione di accompagnamento.

Con nota prot. n. 0015843/25 del 21/02/2025 (prot. ATERSIR n. 21/02/2025.0001782.E), HERA S.p.A. ha comunicato la necessità di protrarre le proprie valutazioni rispetto alle tempistiche indicate da ATERSIR.

Con nota prot. n. 0029168/25 del 03/04/2025 (prot. ATERSIR n. 04/04/2025.0003425.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR la proposta di aggiornamento del POI per le annualità 2026-2029, corredata dalla rispettiva relazione esplicativa.

Con nota prot. n. 30/04/2025.0004408.U, ATERSIR ha condiviso con i Comuni della Provincia di Ravenna la proposta di revisione della programmazione, convocando altresì in data 14/05/2025 degli incontri con le Amministrazioni comunali per la presentazione della revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

Con nota prot. n. 05/05/2025.0004492.U, veniva rettificato il luogo di svolgimento degli incontri con le Amministrazioni comunali.

Con nota prot. n. 19/05/2025.0004964.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. di reinviare la documentazione, revisionando la proposta di aggiornamento del POI in ordine alla quantificazione delle così dette "spese tecniche".

Con nota prot. n. 29/05/2025.0005389.U, ATERSIR ha trasmesso nuovamente a tutti i Comuni del bacino gestionale del SII di Ravenna, e per conoscenza al Gestore HERA S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni e di richiesta di inserimento di interventi a piano ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi" approvato con deliberazione CAMB n.5 del 27/01/2025.

Con nota prot. n. 30/05/2025.0005459.U, ATERSIR, avendo riscontrato alcune difficoltà nell'apertura dei link estesi, ha comunicato nuovamente ai Comuni del bacino gestionale del SII di Ravenna i link per la trasmissione di eventuali osservazioni e richieste.

Con nota prot. n. 0046880/25 del 03/06/2025 (prot. ATERSIR n. 04/06/2025.0005515.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR la revisione richiesta in ordine alla quantificazione delle spese tecniche.

Con nota prot. n. 27/06/2025.0006382.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. alcuni dati integrativi relativi agli interventi che prevedono contributi, al fine di proseguire con le attività di verifica e controllo, anche in considerazione della sussistenza di numerose misure di



sostegno nazionali o comunitarie, oltre ad altri contributi di vari Soggetti sia pubblici che privati, previsti nella programmazione degli interventi.

Con nota prot. n. 18/07/2025.0007075.U, ATERSIR ha trasmesso a HERA S.p.A. le proposte di inserimento e osservazioni presentate dai Comuni del bacino di Ravenna al fine delle valutazioni da parte del Gestore.

Con nota prot. n. 0061750/25 del 21/07/2025 (prot. ATERSIR n. 22/07/2025.0007150.E), HERA S.p.A. ha trasmesso ad ATERSIR le informazioni aggiuntive in merito agli interventi che prevedono contributi presenti nella revisione biennale del POI 2024-2029 per gli anni 2026-2029.

Con nota prot. n. 0076403/25 del 16/09/2025 (prot. ATERSIR n.16/09/2025.0008762.E), HERA ha trasmesso riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni da parte del Comuni.

Con nota prot. n. 06/10/2025.0009650.U, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A. ulteriori chiarimenti in merito all'invio dell'aggiornamento dei Programmi Operativi degli Interventi 2024-2029 per gli anni 2026-2029, e al riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni dei Comuni.

Con nota prot. n. 0089212/25 del 28/10/2025 (prot. ATERSIR n.28/10/2025.0010469.E), HERA S.p.A. ha trasmesso l'ulteriore aggiornamento.

Con nota prot. n. 0094680/25 del 14/11/2025 (prot. ATERSIR n.14/11/2025.0011117.E), HERA S.p.A. ha trasmesso la proposta finale dell'aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi (POI) 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

È scaturita quindi la versione definitiva della revisione biennale del POI 2024-2029, per le annualità 2026-2029, che viene posta all'approvazione del Consiglio Locale di Ravenna per poi essere inserita all'interno della manovra tariffaria 2026-2029 che sarà successivamente approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR.

Infine, ai sensi del Regolamento per l'individuazione e la disciplina degli interventi del servizio idrico integrato finanziati dalle Società patrimoniali e realizzati dal Gestore del S.I.I.", approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n.114 del 28 novembre 2022:

- con nota prot. n. 17/11/2025.0011183.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Con.ami;
- con nota prot. n. 17/11/2025.0011185.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Ravenna Holding S.p.A.;
- con nota prot. n. 17/11/2025.0011187.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Te.am s.r.l.;
- con nota prot. n. 17/11/2025.0011189.U, ATERSIR ha condiviso la proposta di revisione del POI con il Soggetto Finanziatore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- con nota prot. n. 0011752/2025 del 01/12/2025 (prot. ATERSIR n. 01/12/2025.0011672.E), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso nota di assenso alla richiesta di finanziamento di nuovi interventi previsti nel POI 24/29 ed aumenti di spesa di Accordi Attuativi già sottoscritti per i territori di Forlì-

Cesena e Rimini, e l'assenso, condizionato alla positiva conclusione dell'iter autorizzativo, al finanziamento di nuovi interventi previsti nel POI 24/29 ed aumenti di spesa di Accordi Attuativi già sottoscritti per il territorio di Ravenna.



2. IL POI 2024-2029 – REVISIONE BIENNALE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2026-2029

Con deliberazione n. CLRA/2024/2 del 09/04/2024 il Consiglio Locale di Ravenna ha approvato il Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029 del gestore HERA S.p.A.

In occasione della predisposizione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per il quarto periodo regolatorio (2024-2029), approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 103 del 25 ottobre 2024, in applicazione della deliberazione ARERA n. 639/2023/r/idr del 28 dicembre 2023, sono state inseriti nel Programma degli Interventi del PEF anche gli interventi relativi alla misura PNRR-M2C4-I4.2. "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" in quanto l'ammissione al contributo dell'intervento complessivo CUP H98B22000020006 codice M2C4-I4.2_106 "INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE FISICHE E APPARENTI IN ATO7" è avvenuto con Decreto Direttoriale del MIT n.617 del 11/10/2024.

Sono stati pertanto inseriti nel POI 2024-2029 i seguenti interventi:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	di cui CONTRIBUTO
2024RAHA0071	PNRR Rinnovi Rete Acquedotto ATO 7	Opere Pluricomunali	3.164.328,43	3.164.328,43
2024RAHA0072	PNRR Distrettualizzazione ATO 7	Opere Pluricomunali	453.994,29	453.994,29
2024RAHA0073	PNRR Ricerca perdite ATO 7	Opere Pluricomunali	220.000	220.000
2024RAHA0074	PNRR Sensoristica Qualità ATO 7	Opere Pluricomunali	196.290,29	196.290,29
2024RAHA0075	PNRR Smart Meter ATO 7	Opere Pluricomunali	6.442.070	3.252.070
2024RAHA0076	PNRR - Completamento condotta Ravenna nord-Casalborsetti II str	Ravenna	2.053.088 (dei quali CUP PNRR 1.973.8170)	1.973.817
TOTALE CUP PNRR			12.529.771 (12.450.500 CUP PNRR)	9.260.500

Tabella 1 – Nuovi interventi inseriti nel POI in occasione della manovra tariffaria - "PNRR perdite"(€)

Successivamente, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato alcuni nulla osta per interventi realizzabili senza approvazione preventiva del Consiglio Locale e regolarizzabili ex post dall'Agenzia ai sensi della delibera CAMB 84/2022.

Nello specifico:

- con nota prot. n. 23/12/2024.0013148 e con nota prot. n. 10/02/2025.0001310.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, il nulla osta riferito agli interventi previsti nell'ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n.35/2024, così detti interventi "PNRR alluvione", di cui alla misura PNRR M2C4-I2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;

- con nota prot. n. 23/05/2025.0005169.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, il nulla osta riferito all'aggiornamento di importo di alcuni interventi contenuti nel terzo accordo attuativo sottoscritto tra Con.ami, HERA e ATERSIR in data 22 ottobre 2020;
- con nota prot. n. 04/12/2025.0011900.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha rilasciato, il nulla osta riferito all'aggiornamento di importo di alcuni interventi contenuti nel terzo accordo attuativo sottoscritto tra Romagna Acque società delle Fonti S.p.A., HERA e ATERSIR in data 14 ottobre 2022.

Sono stati pertanto inseriti nel POI 2024-2029 i seguenti interventi PNRR alluvione:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	di cui CONTRIBUTO
2024RAHA0078	PNRR All. Manutenzione straordinaria scarichi Lamone	Faenza	500.000	500.000
2025RAHA0001	PNRR All. Estensione rete acquedotto Alfonsine	Alfonsine	820.000	820.000
2025RAHA0002	PNRR All. Revamping impianto di sollevamento Porto Corsini	Ravenna	300.000	300.000
2025RAHA0003	PNRR All. Sostituzione generatori di emergenza Ravenna	Ravenna	1.200.000	1.200.000
2025RAHA0004	PNRR All. Sostituzione generatori di potenza Ravenna	Ravenna	300.000	300.000
2025RAHA0005	PNRR All. Sostituzione generatori di emergenza per sottopassi Ravenna	Ravenna	200.000	200.000
2025RAHA0006	PNRR All. Sostituzione gruppi di pompaggio Marina di Ravenna	Ravenna	400.000	400.000
2025RAHA0007	PNRR All. Adeguamento impianto di sollevamento SAPIR	Ravenna	300.000	300.000
2025RAHA0008	PNRR All. Adeguamento impianto di sollevamento Nord Città	Ravenna	500.000	500.000
2025RAHA0009	PNRR All. ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO CERVIA	Cervia	500.000	500.000
2025RAHA0010	PNRR All. ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO CONSELICE II LOTTO	Conselice	700.000	700.000
2025RAHA0011	PNRR All. IDROVORE MOBILI FAENZA	Faenza	2.000.000	2.000.000
2025RAHA0012	PNRR All. Sistemazione potabilizzatore di Conselice	Conselice	700.0000	700.0000
2025RAHA0013	PNRR All. RIPRISTINO DELLA CAP LAGHI CESTINA	Casola Valsenio	1.000.0000	1.000.0000
2025RAHA0014	PNRR All. Rilev e modellaz drenaggio urbano RA	Opere Pluricomunali	749.594	749.594
TOTALE			10.169.594	10.169.594

Tabella 2 – Nuovi interventi inseriti nel POI con Nulla osta della struttura tecnica - "PNRR alluvione" (€)

Si specifica che nelle note rinvenibili nella tabella della revisione biennale del POI (Allegato 1A) sono riportati anche gli importi aggiornati relativi agli interventi PNRR alluvione; non sono stati inseriti come importi progettuali in quanto non ancora autorizzati dal Commissario Straordinario.

A seguito dei nulla osta sopra elencati, sono state inoltre aggiornate le previsioni dei seguenti ID contenuti nel terzo accordo attuativo tra HERA, Con.ami e ATERSIR:

CODICE	TITOLO	COMUNE	IMPORTO	FINANZIATORE
2019RAHA0032	Adeguamento del depuratore di Massa Lombarda ai limiti azoto	Massa Lombarda	2.173.230,01	Con.ami
2019RAHA0010	Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano	Brisighella	855.070,02	Con.ami
2019RAHA0047	Darsena Città 2° str. Premente via Romea	Ravenna	655.000,00	RASDF
2015RAHA0014	Realizzazione vasca di prima pioggia presso il depuratore di Lugo	Lugo	5.200.224,00	RASDF

2014RAHA0120	Completamento condotta idrica Ravenna Nord-Casalborsetti	Ravenna	2.658.092,00	RASDF
2019RAHA0060	Coll.za "Monaldina Nord" – II° Stralcio – fognatura	Russi	477.505,72	RASDF

Tabella 3- Ulteriori nuovi interventi inseriti nel POI con Nulla osta della struttura tecnica

Per quanto riguarda la presente revisione biennale relativa alle annualità 2026-2029, il programma degli interventi, riferito al quadriennio 2026-2029, prevede investimenti per un importo totale di euro 168.435.020, quindi mediamente circa 42,1 milioni di euro all'anno, inferiore rispetto alla programmazione attualmente vigente (48,7 milioni di euro annui) che è comprensiva anche degli interventi inseriti successivamente all'approvazione in Consiglio Locale.

Il confronto delle annualità 2026-2029 fra la programmazione vigente e la proposta di aggiornamento è sintetizzata nelle seguenti tabelle.

VIGENTE CLRA/2024/2 e modifiche successive, per le annualità 2026-2029					
FINANZIATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
GESTORE	19.225.809	23.112.219	28.178.750	33.896.162	104.412.940
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	21.518.202	11.723.009	7.652.890	8.452.360	49.346.461
SOCIETÀ ASSET	17.874.369	13.993.643	7.111.889	2.242.108	41.222.008
SOGGETTO FINANZIATORE DA DEFINIRE					
TOTALE	58.618.380	48.828.871	42.943.528	44.590.630	194.981.410

Tabella 4 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione vigente (€)

AGGIORNAMENTO 2026-2029					
FINANZIATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
GESTORE	16.673.303	19.775.265	23.994.959	28.911.573	89.355.100
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	18.475.364	5.692.229	4.421.000	4.050.227	32.638.819
SOCIETÀ ASSET	13.707.315	10.991.696	11.603.880	9.532.483	45.835.374
SOGGETTO FINANZIATORE DA DEFINIRE	0	0	58.020	547.707	605.727
TOTALE	48.855.981	36.459.190	40.077.859	43.041.989	168.435.020

Tabella 5 - Ammontare complessivo degli investimenti della programmazione aggiornata (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 aggiornamento 2026-2029 (Allegato 1A) e alla Relazione di accompagnamento predisposta dal Gestore (Allegato 1B).

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici che sintetizzano l'istruttoria tecnica che l'Agenzia ha effettuato sulla proposta di aggiornamento del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici e per le categorie tematiche più significative, i contenuti della revisione del POI.

3.1 Suddivisione per Soggetto finanziatore

Per quanto riguarda la suddivisione degli investimenti per Soggetto finanziatore, si evidenzia che, oltre al Gestore del SII (con investimenti propri o per tramite di contributi a fondo perduto), nel territorio della Provincia di Ravenna sono presenti anche Società degli Assets finanziatrici di interventi del servizio idrico integrato, attualmente: Con.ami, Ravenna Holding S.p.A., Te.am S.r.l. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (i relativi importi sono raggruppati nella tipologia "Società Asset").

Si evidenzia inoltre che alcuni interventi permangono con "Soggetto finanziatore da definire".

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, nella revisione del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, sono previsti contributi a fondo perduto (pubblici o privati) che riguardano:

- sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie: PNRR- Misura M2C4 - I4.4 (Fognatura e Depurazione); PNRR- Misura M2C4 - I4.2 (Riduzione perdite e digitalizzazione); PNRR ALLUVIONE ORDINANZA 35/2024; altre ordinanze correlate all'emergenza alluvione 2023;
- nuovi allacci/estensioni reti/impianti di utenza c/to cliente acquedotto (privati)
- nuovi allacci/estensioni reti c/to cliente fognatura (privati)
- Interferenze variante SS 9 Castelbolognese - acquedotto c/to cliente (ANAS)
- Interferenze variante SS 9 Castelbolognese - fognatura c/to cliente (ANAS)
- regolamento ATERSIR per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel programma operativo degli interventi (aggiornato in ultimo con deliberazione CAMB n. 3/2025 del 27/01/2025), quali: Estensione rete acqua in via Bevanella Località Castiglione di Ravenna, in Comune di Ravenna.

Si specifica, inoltre, che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all'esito delle candidature avanzate nell'ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI) per il quale è in corso l'aggiornamento delle candidature.

La suddivisione degli investimenti per Soggetto Finanziatore nelle annualità oggetto di revisione è rappresentata nel grafico seguente.

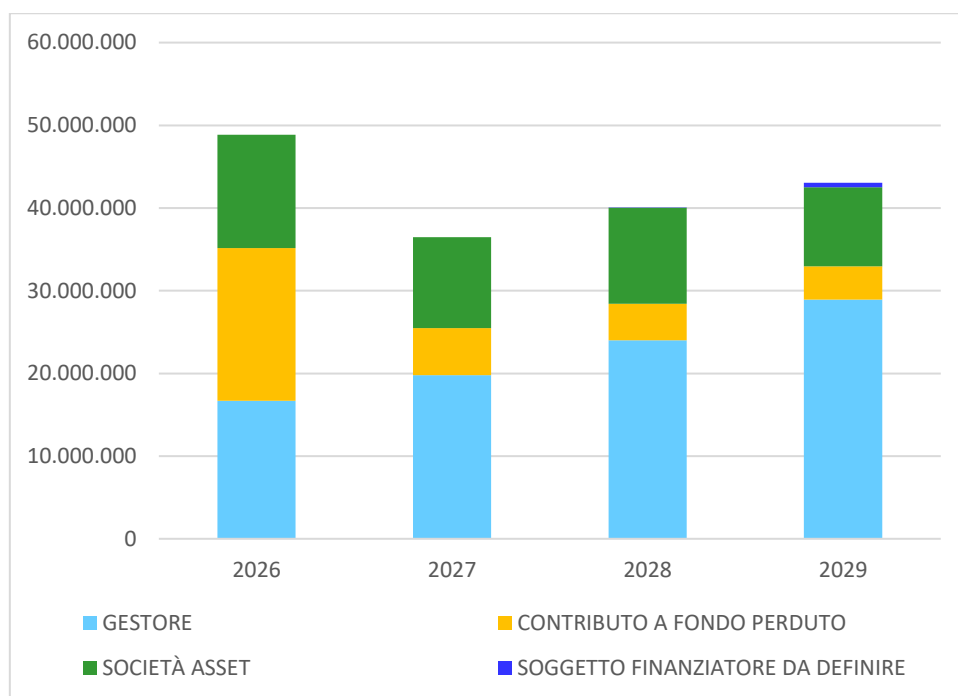


Figura 1 - Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore nelle annualità 2026-2029(€)

3.2 Suddivisione per Servizio

Gli interventi presenti nel POI sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche e struttura.

Si specifica che l'importo annuale degli investimenti di struttura è fissato dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018, e successivi aggiornamenti (in particolare la recente deliberazione CAMB n.51/2025 del 17/11/2025).

Gli investimenti di struttura sono investimenti che di norma non riguardano i beni e/o le infrastrutture strettamente "strumentali" al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e necessario al gestore per una efficiente conduzione del servizio idrico integrato. Sono inoltre investimenti di struttura gli investimenti funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII. Rientrano negli investimenti di struttura anche i costi connessi all'installazione di sistemi software e hardware funzionali alla rendicontazione degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale nonché di quelli deputati alla rendicontazione degli investimenti.

La suddivisione degli investimenti per servizio nelle annualità oggetto di revisione è rappresentata nella tabella e nel grafico seguenti.

SERVIZIO	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	25.515.868	16.245.362	13.710.280	13.100.987	68.572.497
FOGNATURA	10.310.779	8.347.175	8.383.594	10.614.930	37.656.479
DEPURAZIONE	10.877.701	9.715.020	15.821.352	17.163.439	53.577.512
ACQUE BIANCHE	480.000	480.000	491.000	491.000	1.942.000
STRUTTURA	1.671.633	1.671.633	1.671.633	1.671.633	6.686.532
TOTALE	48.855.981	36.459.190	40.077.859	43.041.989	168.435.020

Tabella 6 - Suddivisione degli importi per servizio (€)

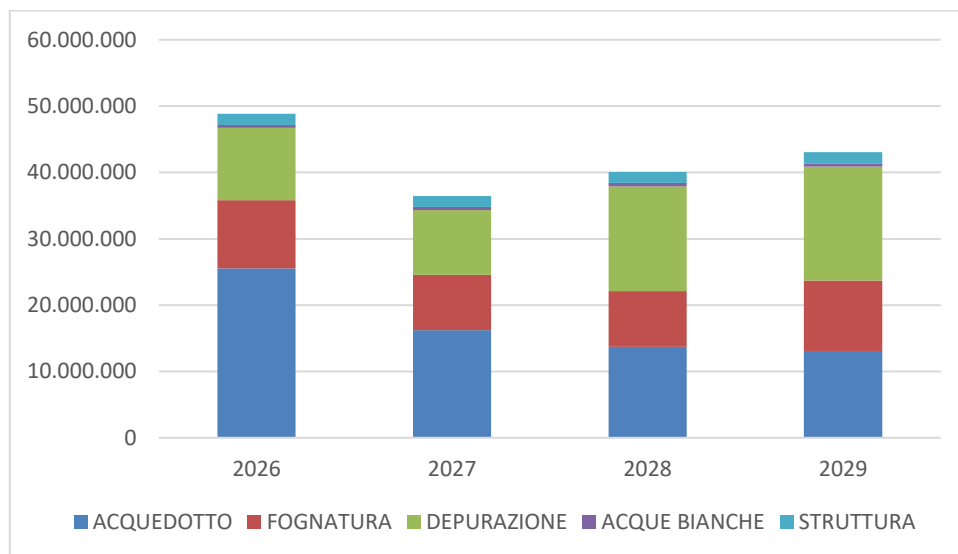


Figura 2 - Suddivisione degli importi per servizio nelle annualità 2026-2029 (€)

Si riporta di seguito un grafico che evidenzia il peso di ciascun servizio rispetto all'importo complessivo del quadriennio 2026-2029 (168.435.020 euro totali).

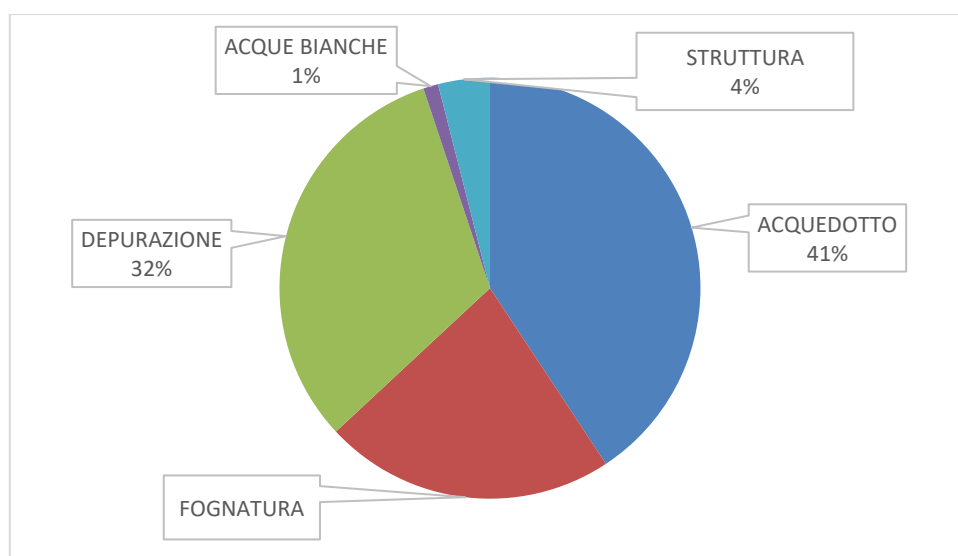


Figura 3 - Ripartizione degli importi per servizio in arco piano

Per completare l'analisi, si riporta nella tabella e nel grafico seguenti la suddivisione degli investimenti per servizio ripartita, per Soggetto finanziatore, nelle annualità oggetto di revisione.



	GESTORE	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	SOCIETÀ ASSET	SOGGETTO FINANZIATORE DA DEFINIRE	TOTALE
ACQUEDOTTO	40.548.531	13.058.094	14.623.329	342.543	68.572.497
FOGNATURA	21.993.809	12.369.290	3.243.330	50.050	37.656.479
DEPURAZIONE	18.184.228	7.211.435	27.968.716	213.133	53.577.512
ACQUE BIANCHE	1.942.000	0	0	0	1.942.000
STRUTTURA	6.686.532	0	0	0	6.686.532
TOTALE	89.355.100	32.638.819	45.835.374	605.727	168.435.020

Tabella 7 - Suddivisione degli importi per servizio e per Soggetto finanziatore (€)

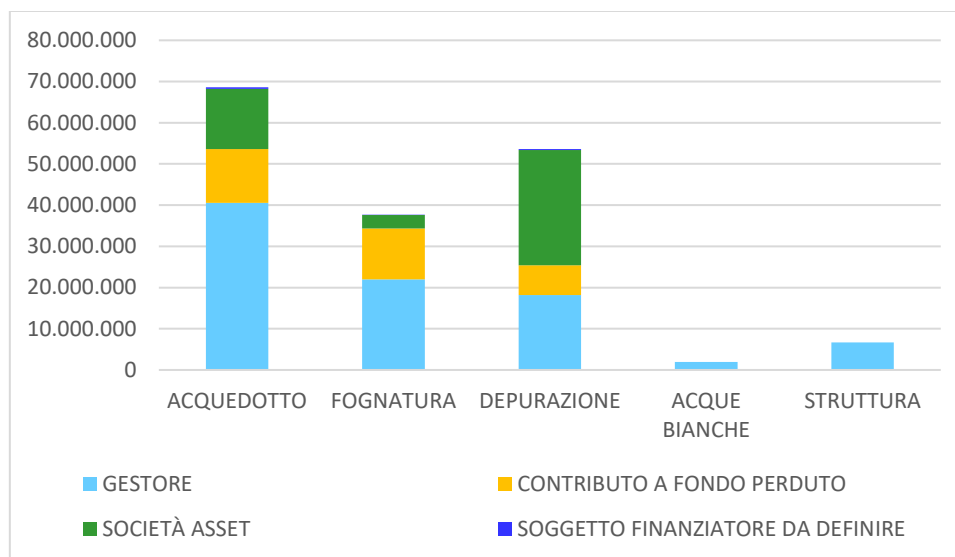


Figura 4 - Suddivisione degli importi per servizio e per Soggetto finanziatore (€)

3.3 Suddivisione per Macro-indicatore ARERA

Con la deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 (e successivi aggiornamenti), l'ARERA ha previsto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato definendo livelli minimi ed obiettivi di qualità tecnica del servizio, mediante l'introduzione di: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio (monitorati mediante indicatori e macro-indicatori), iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Per il bacino di Ravenna, il posizionamento del gestore HERA S.p.A. nelle classi di qualità tecnica dell'anno base (2023) per la definizione degli obiettivi della prossima valutazione è quello rappresentato nella tabella seguente. Si specifica che le classi sono ricomprese tra A ed E, con A migliore posizione.

Si specifica altresì che la classe di appartenenza del macro-indicatore M0 (Resilienza) è determinata, secondo la metodologia ARERA, mediante indicatori che considerano la resilienza idrica a livello di gestione e a livello sovraordinato, considerando anche la presenza sul territorio di un Gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso. Con riferimento al livello sovraordinato, è stata avviata da ARERA una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

SERVIZIO	MACRO - INDICATORE	TIPOLOGIA	OBIETTIVO	CLASSE BASE 2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	Monitorare il grado di copertura della domanda atteso con il sistema degli approvvigionamenti del territorio gestito	C
	M1	Perdite Idriche	Conservazione della risorsa idrica (attraverso gli indicatori delle perdite idriche lineari e percentuali)	B
	M2	Interruzioni del servizio	Mantenimento della continuità del servizio	B
	M3	Qualità dell'acqua erogata	Adeguatezza qualità dell'acqua destinata al consumo umano (attraverso gli indicatori relativi all'incidenza delle ordinanze di non potabilità, al tasso di controlli interni; non conformi e al tasso di parametri da controlli interni non conformi)	C
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	Minimizzare l'impatto ambientale delle acque reflue (attraverso gli indicatori: M4a relativo alla frequenza di allagamenti e/o sversamenti, e M4b e M4c relativi all'adeguatezza normativa e al controllo degli scaricatori di piena)	B
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	Minimizzare l'incidenza dei fanghi avviati a discarica	B
	M6	Qualità dell'acqua depurata	Minimizzare l'impatto ambientale della linea acqua	E

Tabella 8 - Classe di qualità tecnica anno base 2023

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli investimenti in base alla loro classificazione tramite i macro-indicatori ARERA della qualità tecnica.

MACRO-INDICATORE	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ALTRO	9.783.795	7.950.078	11.418.258	11.612.140	40.764.271
M0	5.319.196	3.067.914	-	-	8.387.110
M1	13.610.784	9.329.764	10.053.144	8.870.000	41.863.692
M2	1.574.437	937.963	562.790	994.343	4.069.533
M3	1.146.378	508.000	508.000	508.000	2.670.378
M4a	8.125.233	6.057.174	7.093.658	9.047.555	30.323.619
M4b	37.200	65.400	55.400	337.708	495.708
M5	304.700	995.101	1.582.968	1.740.000	4.622.769
M6	8.954.259	7.547.796	8.803.641	9.932.243	35.237.940
TOTALE	48.855.981	36.459.190	40.077.859	43.041.989	168.435.020

Tabella 9 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)

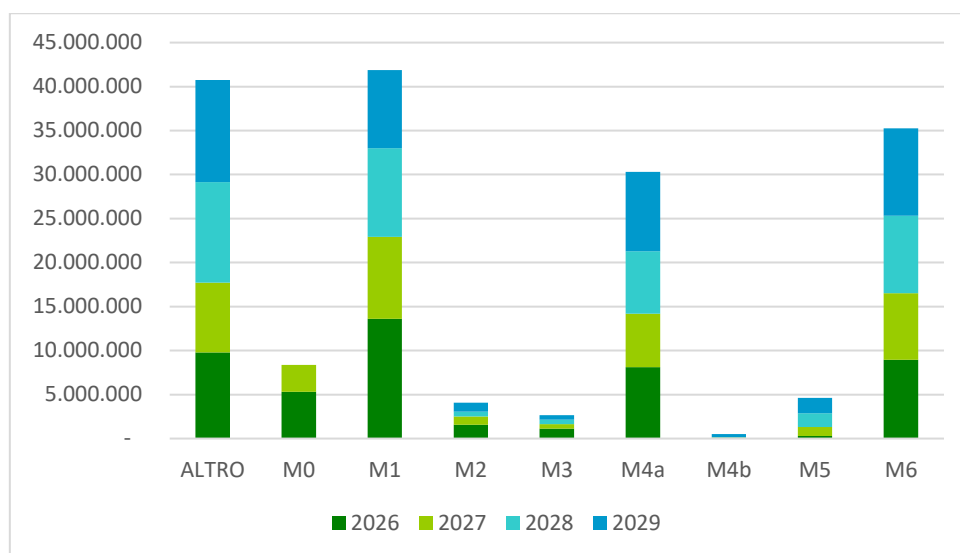


Figura 5 - Suddivisione degli investimenti per macro-indicatore ARERA (€)

Per quanto riguarda la revisione del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, si rileva che i maggiori investimenti sono associati ai macro-indicatori ARERA M1, M4a e M6 e sono riferibili principalmente: agli interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche (M1), all'intervento sul sistema di approvvigionamento idrico Caste Bolognese (M0), al rifacimento delle reti fognarie/agli interventi sulla sicurezza idraulica post alluvione 2023 (M4a), e all'adeguamento/potenziamento degli impianti di depurazione, in particolare i depuratori di Faenza, Cervia e Ravenna (M6).

Si specifica infine che sono stati associati all'indicatore "Altro" gli interventi di risanamento e adeguamento fognario, oltre ad altri interventi di efficientamento economico e funzionale della gestione di infrastrutture di fognatura e depurazione (come, ad esempio, il secondo lotto del secondo stralcio dell'intervento di potenziamento del depuratore di Ravenna).

3.4 Suddivisione per Tipologia di ID (SPECIFICO/CUMULATIVO)

Si riporta infine un focus sugli investimenti rappresentati dai titoli cumulativi, che contengono i "microinterventi" di manutenzione straordinaria, oltre ad altre tipologie di intervento.

Si denota come l'incidenza dei titoli cumulativi sia complessivamente rilevante; infatti, l'importo complessivo pianificato degli interventi cumulativi nell'arco piano 2026-2029 è pari a 72.803.048 euro, che equivale a circa il 43% dell'importo complessivo del POI 2026-2029 (168.435.020 euro).

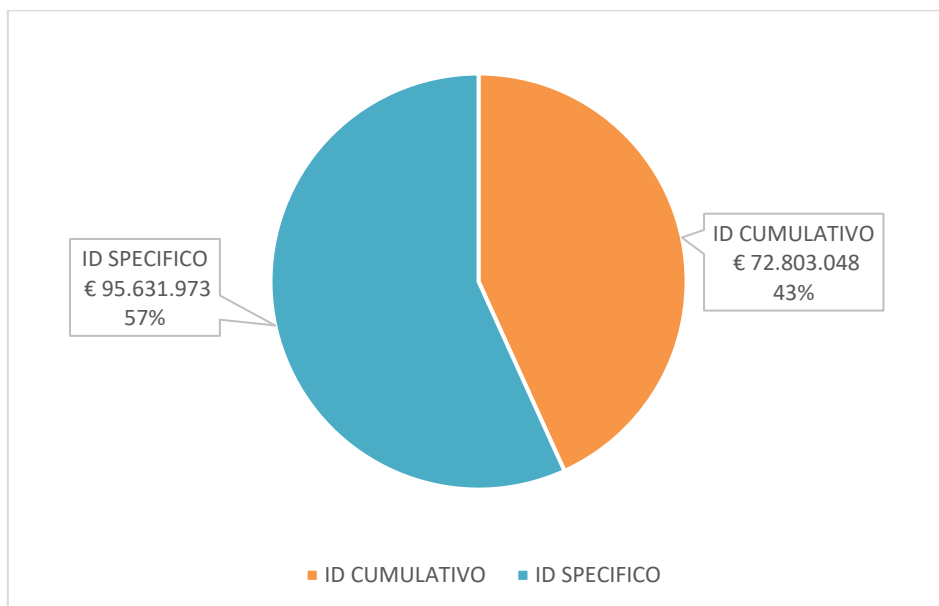


Figura 6 - Incidenza dei titoli cumulativi

Il Gestore HERA S.p.A. ha indicato che la proposta di POI mira al mantenimento in efficienza degli asset esistenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il valore degli investimenti contenuti nei titoli cumulativi è stato definito in continuità con quanto già previsto nel POI 2024-2029, il quale a sua volta evidenziava importi più elevati rispetto a quelli registrati nelle annualità precedenti.

In particolare, si confermano importanti investimenti relativi agli ID cumulativi di acquedotto, riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da pronto intervento. L'insieme di tali interventi mira al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica sull'indicatore M1 legato alle perdite di rete. All'interno del macro-capitolo di acquedotto rientra altresì la prosecuzione del piano pluriennale di recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi.

Di seguito si riporta la tabella con che riporta gli investimenti previsti per i titoli cumulativi suddivisi per servizio nelle annualità oggetto di revisione.

TITOLI CUMULATIVI	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	15.209.141	11.219.044	12.457.490	11.716.644	50.602.318
FOGNATURA	3.079.000	3.079.000	3.079.000	3.079.000	12.316.000
DEPURAZIONE	2.790.674	2.188.671	1.578.384	1.385.000	7.942.729
ACQUE BIANCHE	480.000	480.000	491.000	491.000	1.942.000
TOTALE	21.558.815	16.966.715	17.605.874	16.671.644	72.803.048

Tabella 10 - Titoli cumulativi suddivisi per servizio (€)

4. NUOVI INTERVENTI

Nella proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, sono riportati 3 nuovi interventi, ai quali si assegna il codice identificativo ID ATERSIR.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1B).

	NUOVO CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE	NOTA
1	2026RAHA0001	NUOVO ID SPECIFICO RA 100	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL DEPURATORE DI BRISIGHELLA	Brisighella	HERA S.P.A.	
	2026RAHA0002	NUOVO SPECIFICO RA 3	MASTERPLAN DRENAGGIO URBANO RAVENNA	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	COLLEGATO A "PROTOCOLLO D'INTESA PER LO STUDIO VOLTO A COMPLETARE IL RILIEVO E LA MODELLAZIONE DIGITALE DEI SISTEMI FOGNARI DI DRENAGGIO URBANO FINALIZZATI AD INDIVIDUARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E GESTIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA"
	2026RAHA0003	NUOVO SPECIFICO RA 4	ESTENSIONE RETE ACQUA IN VIA BEVANELLA LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA	Ravenna	HERA S.P.A.	NUOVO INSERIMENTO RELATIVO AL REGOLAMENTO "CASE SPARSE" A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Tabella 11 - Nuovi interventi revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

5. AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO PROGETTUALE O DELLA PIANIFICAZIONE ANNUALE

In occasione della revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029, il Gestore ha aggiornato alcune previsioni di importo e/o pianificazione annuale degli investimenti.

Le motivazioni principali dell'aggiornamento di importo progettuale sono le seguenti:

- incremento prezzi dei materiali e delle lavorazioni dovuti all'andamento di mercato;
- importo precedentemente stimato parametricamente e affinamento progettazione;
- necessità "sito specifiche" che hanno determinato approfondimenti e/o nuove lavorazioni.

Alcuni interventi, pur non avendo subito modifiche nell'importo complessivo del progetto, riportano una rimodulazione delle previsioni di spesa negli anni oggetto del piano, o una ripianificazione in anni successivi, in particolare a causa di:

- avanzamento della progettazione e/o dell'iter di approvazione;
- allungamento delle tempistiche di esecuzione lavori, anche a causa di interferenze;
- valutazione delle priorità degli interventi.

Per le informazioni dettagliate si rimanda alla Tabella del POI 2026-2029 (Allegato 1A), e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1B).

6. INTERVENTI CONCLUSI

Si riporta l'elenco degli 10 interventi conclusi, che non si ripropongono nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2014RAHA0009	POTENZIAMENTO RETE BONCELLINO - II STRALCIO	Bagnacavallo	ROMAGNA ACQUE SDF
2	2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	Bagnacavallo	HERA S.P.A.
3	2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	Conselice	CON.AMI
4	2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	Lugo	HERA S.P.A.
5	2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V. MAMELI, V. MARZABOTTO, V. MONTEFIORINO E V. MARCHETTI/SAFFI	Massa Lombarda	HERA S.P.A.
6	2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	Ravenna	HERA S.P.A.
7	2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
8	2022RAHA0009	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPIR 3-SAPIR 1	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
9	2024RAHA0036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE DI RIOLO TERME (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	Riolo Terme	HERA S.P.A.
10	2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBALDI	Sant'Agata sul Santerno	HERA S.P.A.

Tabella 12 - Interventi conclusi, da non riproporre nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

Si specifica altresì che nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029 sono proposti alcuni interventi tecnicamente conclusi, per i quali l'ID è lasciato "aperto" al fine di consentire la chiusura delle attività contabili, compresa la contabilizzazione dell'eventuale contributo a fondo perduto.

Si specifica che tali 21 interventi non hanno importi pianificati nelle annualità 2026-2029. Sono elencati nella tabella seguente.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITÀ IDRAULICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	Bagnara di Romagna	HERA S.P.A.
2	2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	Casola Valsenio	HERA S.P.A.
3	2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	Conselice	HERA S.P.A.
4	2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	Cotignola	HERA S.P.A.
5	2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	Lugo	HERA S.P.A.
6	2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	Lugo	TEAM



	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
7	2024RAHA0012	STUDIO SISTEMA FOGNARIO LUGO	Lugo	HERA S.P.A.
8	2022RAHA0014	STUDIO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PERIMETRO CONAMI	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.
9	2024RAHA0072	PNRR Distrettualizzazione ATO 7	Opere pluricomunali	HERA S.P.A.
10	2024RAHA0073	PNRR Ricerca perdite ATO 7	Opere pluricomunali	HERA S.P.A.
11	2024RAHA0074	PNRR Sensoristica Qualità ATO 7	Opere pluricomunali	HERA S.P.A.
12	2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	Ravenna	ROMAGNA ACQUE SDF
13	2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	Ravenna	HERA S.P.A.
14	2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° stralcio	Ravenna	HERA S.P.A.
15	2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	Ravenna	RAVENNA HOLDING
16	2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	Ravenna	RAVENNA HOLDING
17	2024RAHA0048	STUDIO PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE DEL DEPURATORE DI RAVENNA	Ravenna	HERA S.P.A.
18	2024RAHA0067	SPOSTAMENTO RETE ACQUA V. BONIFICA	Ravenna	RAVENNA HOLDING
19	2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	Russi	ROMAGNA ACQUE SDF
20	2019RAHA0059	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.-ACQ	Russi	HERA S.P.A.
21	2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR.-FOG	Russi	ROMAGNA ACQUE SDF

Tabella 13 - Interventi tecnicamente conclusi ma riproposti nella revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

7. INTERVENTI DA STRALCIARE

In questa sezione sono riportati gli interventi che saranno stralciati POI 2024-2029 in occasione della revisione biennale per le annualità 2026-2029. Le motivazioni sono:

- cambio Soggetto Finanziatore, per ID 2024RAHA0047 che è pianificato all'interno dell'ID 2019RAHA0043 "POTENZIAMENTO DEP. RAVENNA II STRALCIO – II LOTTO" che è passato in capo a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- problematiche superate, già risolte o da risolvere all'interno di altri interventi a piano, come per ID 2024RAHA0064 che è ricompreso nell'ID 2025RAHA0012 "PNRR ALL. SISTEMAZIONE POTABILIZZATORE DI CONSELICE", o da risolvere fuori piano, come per gli interventi ID 2019RAHA0049 o 2024RAHA0062 che saranno eseguiti dai Soggetti attuatori delle urbanizzazioni.

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
1	2024RAHA0064	STUDIO SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO DI CONSELICE	Conselice	HERA S.P.A.
2	2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREA PORTUALE- POLOLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	Ravenna	SOC. ASSET DA DEFINIRE
3	2024RAHA0047	POTENZIAMENTO DEP.RAVENNA 2°STR - 2° LOTTO	Ravenna	SOC. ASSET DA DEFINIRE

	CODICE ATERSIR	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
4	2024RAHA0062	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	Solarolo	SOC. ASSET DA DEFINIRE

Tabella 14 - Interventi da stralciare dalla revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

8. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

8.1 Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel programma operativo degli interventi

Con riferimento agli estendimenti di rete alle case sparse, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CAMB n. 122 del 18/12/2023, come aggiornata dalla CAMB n. 3/2025 del 27/01/2025, e dalla deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n. 11 del 23/11/2022, è fissato un budget annuale pari al 4% della media annuale degli interventi preventivati nel periodo regolatorio precedente.

Per il periodo regolatorio 2024-2029, per il bacino di Ravenna, tale budget è fissato a 1.128.449,00 euro/anno.

Gli interventi sono inseriti nel POI sulla base della graduatoria stilata dalla struttura tecnica di ATERSIR, previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi della quota parte dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.

In occasione della presente revisione biennale del POI 2024-2029, per le annualità 2026-2029, è inserito a piano il seguente nuovo intervento di estendimento.

NUOVO CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	COMUNE	FINANZIATORE
2026RAHA0003	NUOVO SPECIFICO RA 4	ESTENSIONE RETE ACQUA IN VIA BEVANELLA LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA	Ravenna	HERA S.p.A.

8.2 Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi

Con riferimento agli interventi inseribili a piano su richiesta dei Comuni, ai sensi del “Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi” di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5/2025 del 27/01/2025, con Determinazione 280 del 03/11/2025 sono stati individuati gli importi annuali massimi allocabili nei POI per finanziare interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali per gli anni 2026 e 2026, pari a 1 €/anno/residente.

Per il bacino di Ravenna in gestione a HERA S.p.A., l'importo a disposizione per ogni annualità è pari a 388.702,00 euro, per un totale di 777.404,00 euro nel biennio 2026-2027.

Con Determinazione n. 311 del 01/12/2025 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili per le annualità 2026-2027 ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione CAMB n. 5/2025 del 27/01/2025.

Sulla base della graduatoria approvata, fra quelli ritenuti ammissibili, non risulta finanziabile nessun intervento.

8.3 Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

Con nota prot. n. 29/05/2025.0005389.U, ATERSIR ha trasmesso nuovamente a tutti i Comuni del bacino gestionale del SII di Ravenna, e per conoscenza al Gestore HERA S.p.A., la bozza di proposta di revisione biennale relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni e di richiesta di inserimento di interventi a piano ai sensi del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi" approvato con deliberazione CAMB n.5 del 27/01/2025.

Con nota prot. n. 30/05/2025.0005459.U, ATERSIR, avendo riscontrato alcune difficoltà nell'apertura dei link estesi, ha comunicato nuovamente ai Comuni del bacino gestionale del SII di Ravenna i link per la trasmissione di eventuali osservazioni e richieste.

Conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di revisione biennale del Programma degli interventi 2024-2027, per le annualità 2026-2029, hanno formulato osservazioni i Comuni di: Lugo e Bagnacavallo.

Con nota prot. n. 18/07/2025.0007075.U, ATERSIR ha trasmesso a HERA S.p.A. le proposte di inserimento e osservazioni presentate dai Comuni del bacino di Ravenna al fine delle valutazioni da parte del Gestore.

Con nota prot. n. 0076403/25 del 16/09/2025 (prot. ATERSIR n.16/09/2025.0008762.E), HERA ha trasmesso riscontro sulle proposte di inserimento dei nuovi interventi e sulle osservazioni da parte del Comuni.

Le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni proposte da HERA S.p.A. sono rinvenibili nella tabella in coda alla presente relazione.

9. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Allegato 1A: Tabella della revisione biennale del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029 per le annualità 2026-2029
- Allegato 1B: Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. prot. ATERSIR n. 04/04/2025.0003425.E.

Tabella delle Osservazioni dei Comuni alla proposta di revisione biennale del POI 2024-2029 per le annualità 2026-2029

N°	INFORMAZIONI CRONOLOGICHE	COMUNE	OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	ID RIFERIMENTO	RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE (HERA S.P.A.)	NOTA ATERSIR
1	06/06/2025	Lugo	Completamento sistemazione ara Via Goldoni, Lugo	2022RAHA0015	L'intervento è attualmente programmato nel 2025 e per questo motivo non è presente nella proposta POI 2026_29	
2	30/06/2025	Bagnacavallo	Come concordato nella riunione del 25/06/2025 con Hera ed Atersir si richiede l'inserimento a piano dei seguenti interventi necessari a mettere in sicurezza parti del Comune che frequentemente risultano oggetto di intervento (elenco in ordine di priorità di intervento): - via Fossa - rifacimento della fognatura mista con relativo potenziamento (vedi analisi preliminare effettuata da HERA); - comparto di via delle Regioni: rifacimento della fognatura mista con relativo potenziamento nelle vie Regioni, Toscanini ed Emilia (vedi analisi preliminare effettuata da HERA); - via Berti - rifacimento della fognatura mista con relativo potenziamento (vedi analisi preliminare effettuata da HERA);		L'osservazione fa riferimento alla richiesta di n.3 nuovi inserimenti a POI. Si veda risposta per ciascuna richiesta nel file riepilogativo degli inserimenti.	La graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili nell'ambito del Regolamento ex CAMB n. 5/2025 del 27/01/2025 è stata approvata con Determinazione Dirigenziale ATERSIR n. 311 del 01/12/2025
